




**GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS**




gorelосlаgos.cl
@ f t


ESTADO DE SITUACION FEBRERO 2022

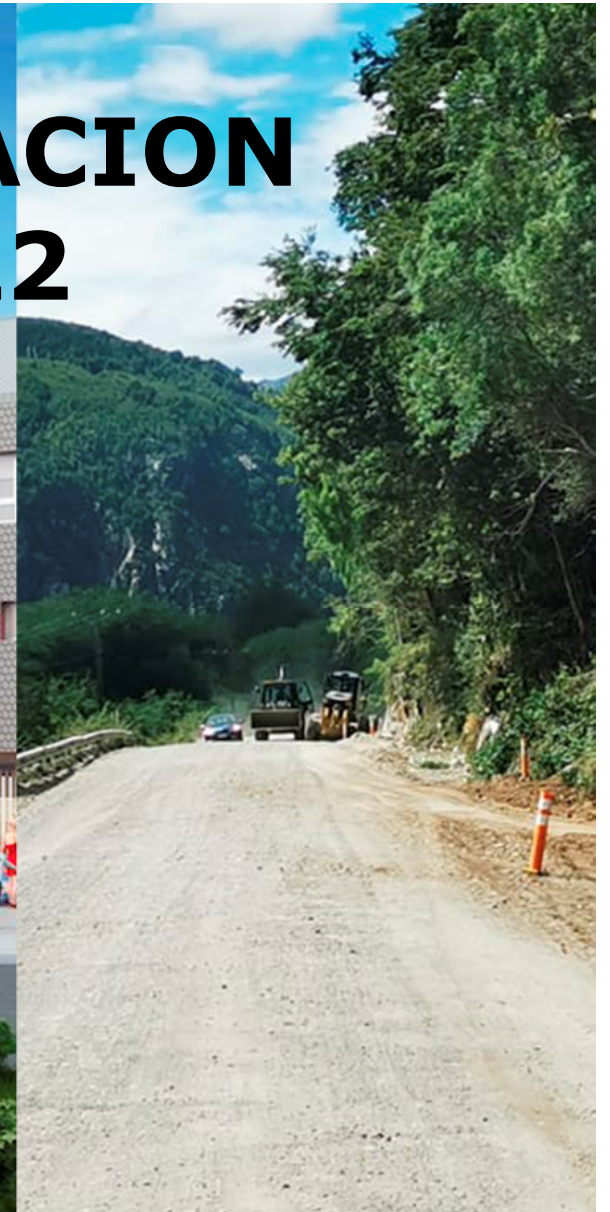

Marco FNDR - 02 al 28 Febrero 2022

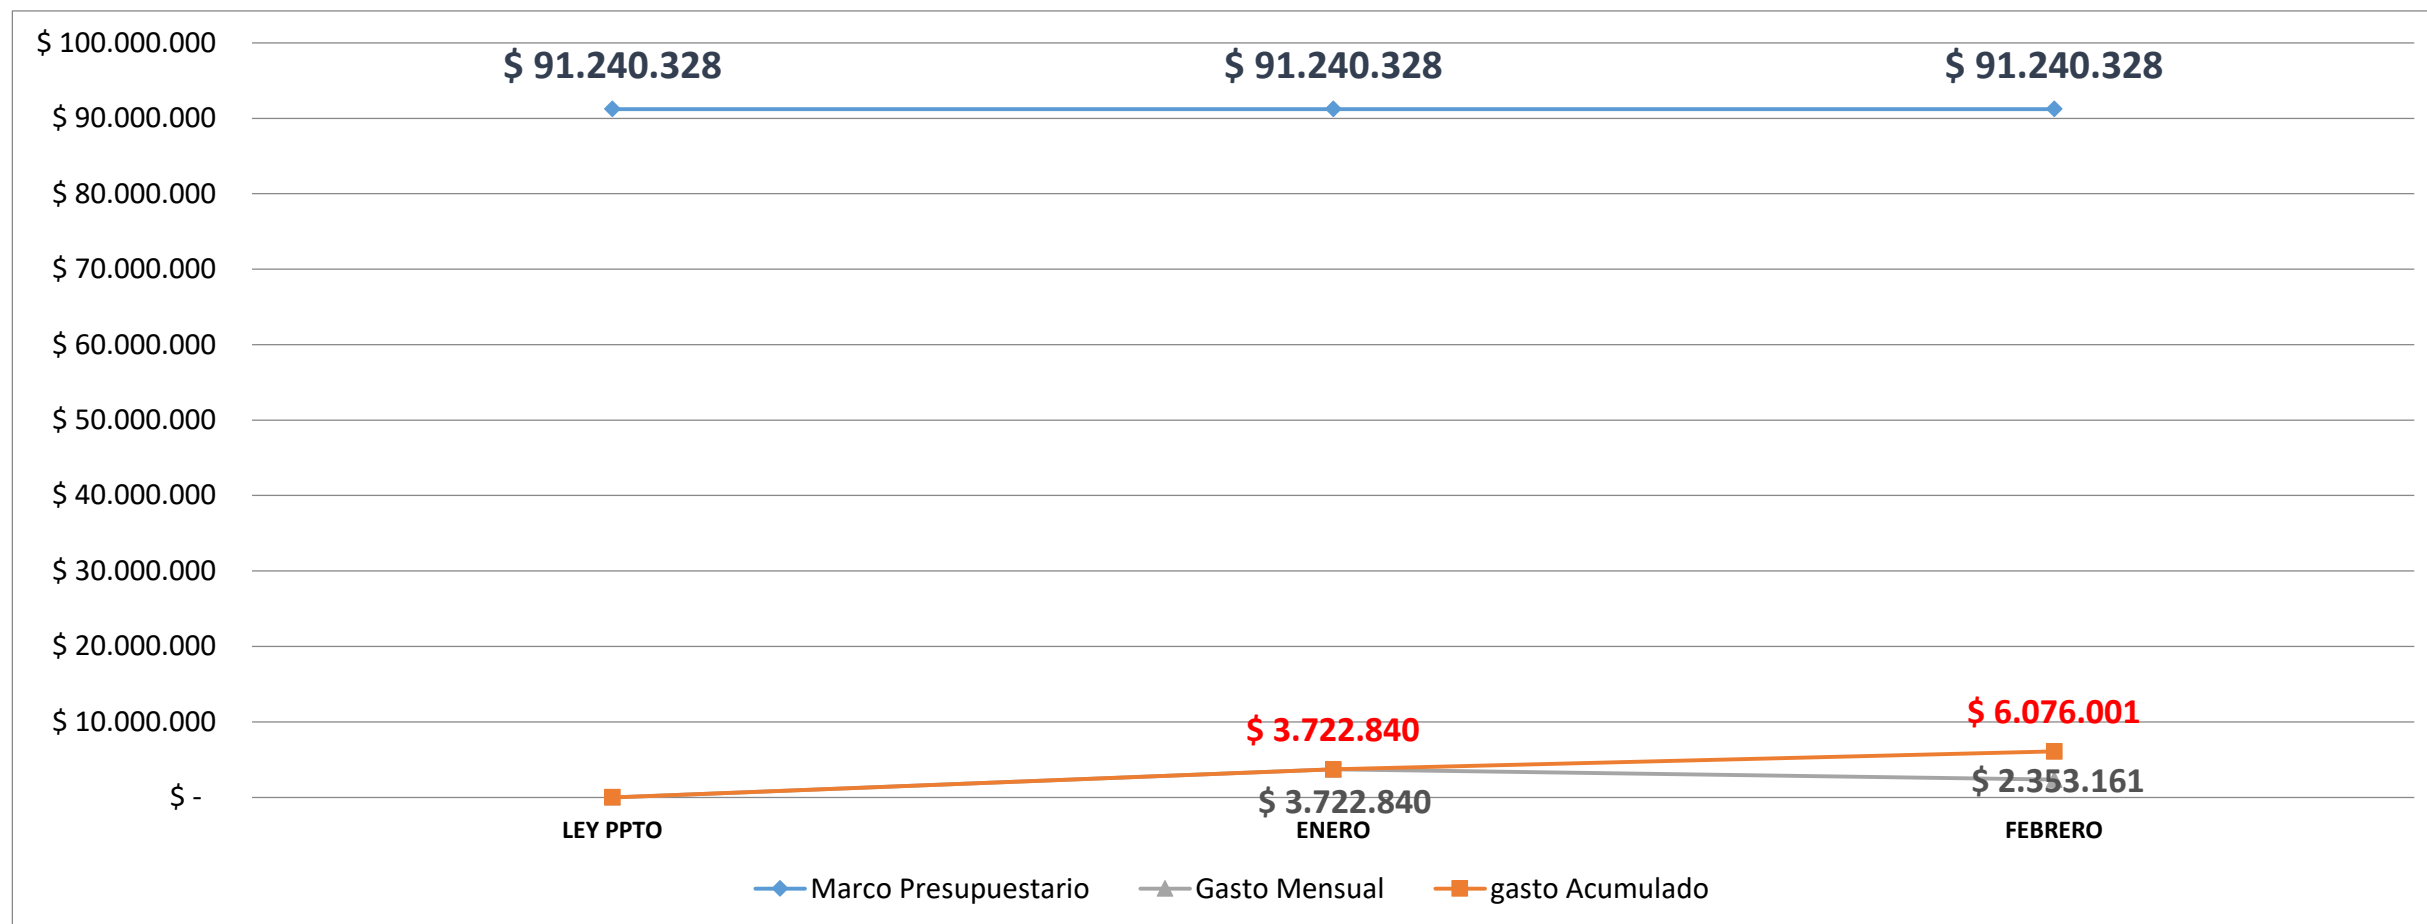

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 - %

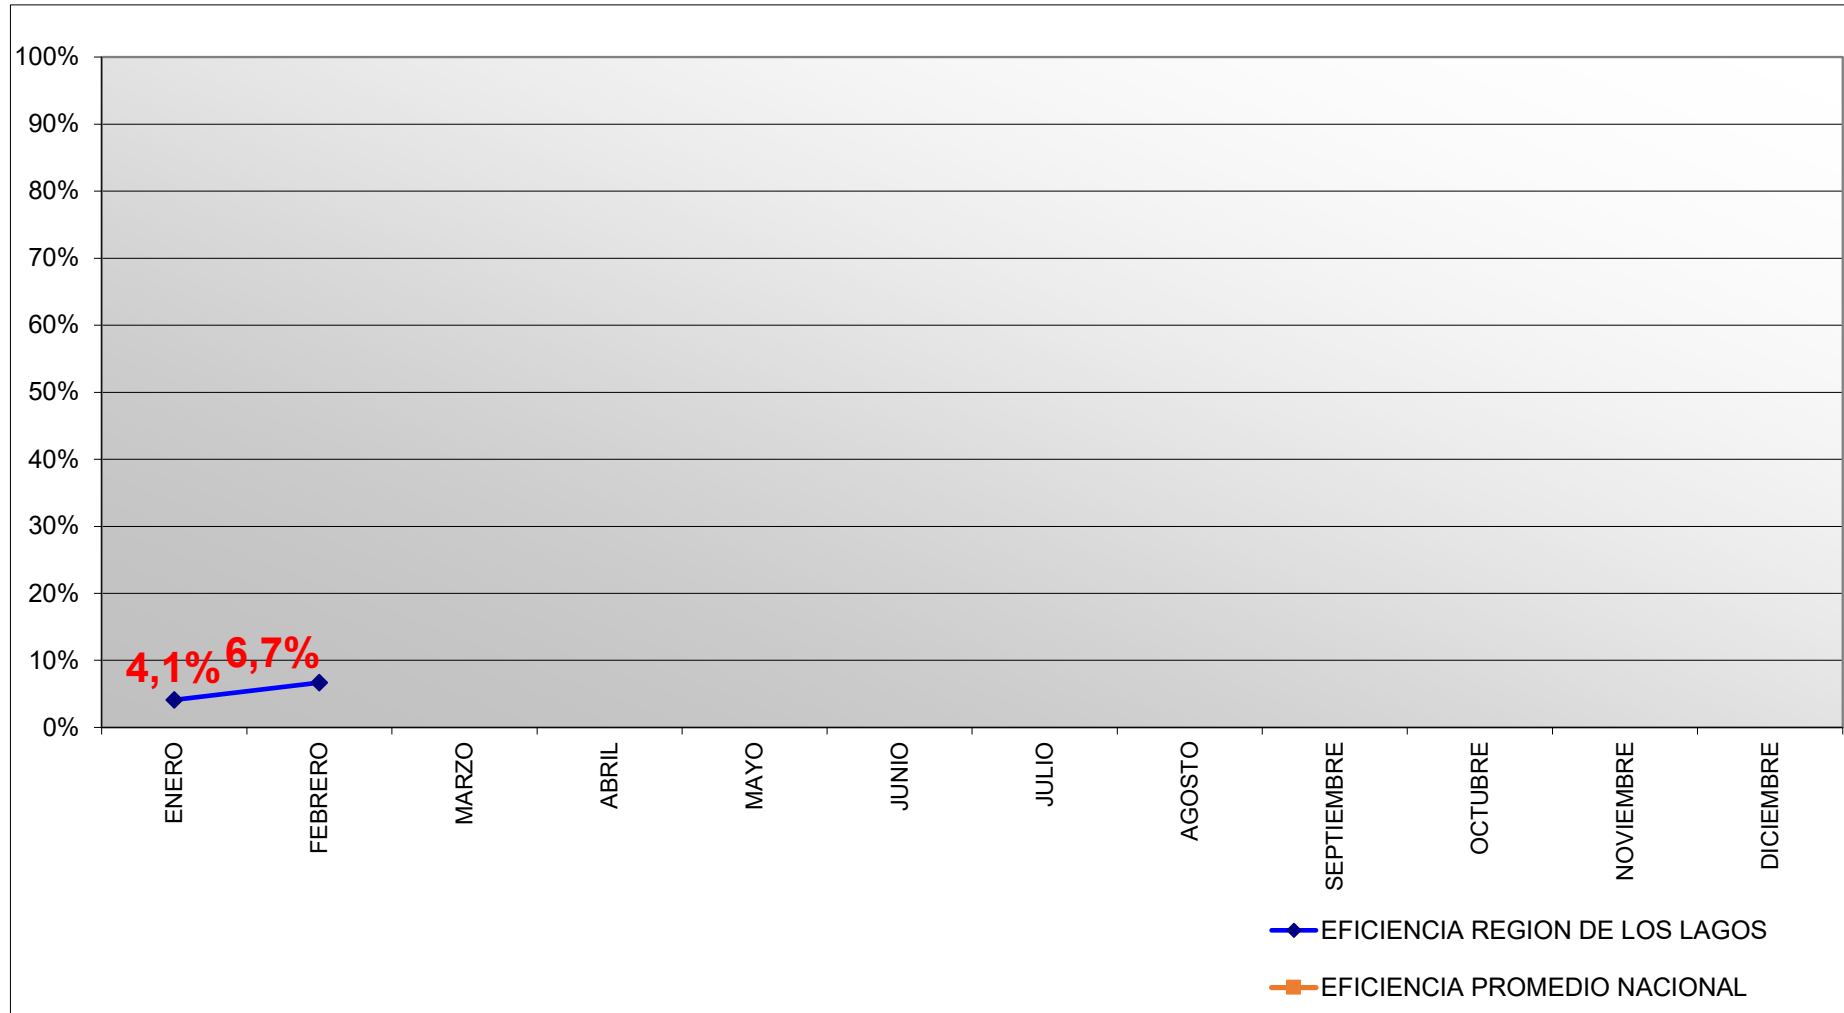


Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02

al 28 Febrero 2022 – %

	COSTO TOTAL		FNDR 2022						
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO	73.579.158.516	18%	34.807.609.718	17.701.873.043	23%	857.428.782	16.844.444.261	4,84%	20.259.309.126
LLANQUIHUE	98.699.721.245	24%	36.797.674.667	17.924.577.898	23%	1.937.398.403	15.987.179.495	10,81%	42.977.812.430
CHIOLE	71.469.744.607	17%	23.309.839.520	16.344.732.468	21%	1.546.547.284	14.798.185.184	9,46%	31.320.394.781
PALENA	82.518.817.579	20%	23.429.861.024	15.278.156.235	20%	1.731.726.942	13.546.429.293	11,33%	43.618.256.446
REGIONAL	23.847.815.538	6%	3.557.743.799	9.350.004.779	12%	2.900.000	9.347.104.779	0,03%	10.888.611.970
TOTAL PRESUPUESTO TERRITORIAL AÑO 2022				76.599.344.423					
FOMENTO	59.945.223.799	15%	18.681.728.269	14.598.452.480		0	14.598.452.480	0,00%	26.296.248.976
TOTAL	410.060.481.283	100%	140.584.456.997	91.197.796.903	100%	6.076.001.411	85.121.795.492	6,66%	175.360.633.729


PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2022	AREA	Total
FOMENTO	SOCIAL	5.410.291.529
	PRODUCTIVO	9.188.160.951

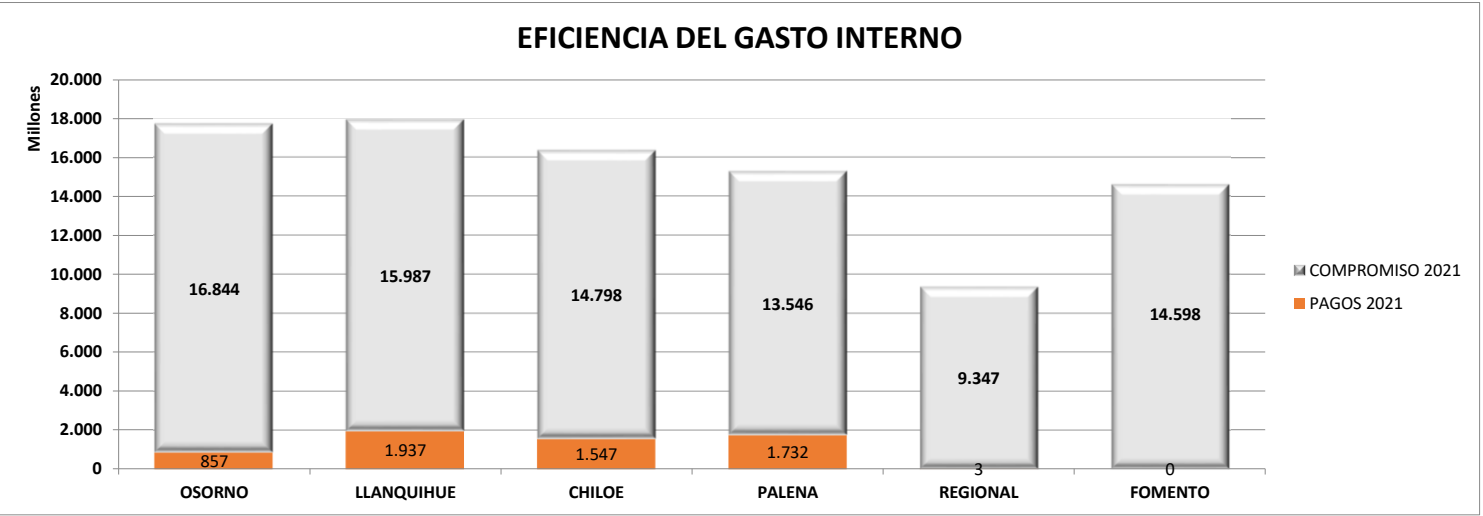

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 - %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022					
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO	6	15.276.509.328	21%	9.534.516.058	1.767.794.390	10%	0	1.767.794.390	0,00%	3.847.783.221
OSORNO	19	31.892.373.015	43%	17.051.890.349	7.573.221.870	43%	193.359.111	7.379.862.759	2,55%	7.267.260.796
PTO. OCTAY	4	483.872.666	1%	7.512.000	476.360.666	3%	37.579.881	438.780.785	7,89%	0
PURRANQUE	14	8.973.096.874	12%	1.087.572.125	2.595.943.927	15%	3.570.000	2.592.373.927	0,14%	4.582.000.317
PUYEHUE	7	1.232.770.850	2%	386.421.302	498.524.700	3%	0	498.524.700	0,00%	366.839.348
RIO NEGRO	8	2.716.673.893	4%	607.760.039	1.097.314.889	6%	80.372.278	1.016.942.611	7,32%	1.016.214.000
SAN JUAN DE LA COSTA	8	7.955.490.666	11%	3.315.397.805	1.460.881.417	8%	48.895.058	1.411.986.359	3,35%	3.179.211.444
SAN PABLO	5	5.048.371.224	7%	2.816.540.040	2.231.831.184	13%	493.652.454	1.738.178.730	22,12%	0
TOTAL	71	73.579.158.516	100%	34.807.609.718	17.701.873.043	100%	857.428.782	16.844.444.261	4,84%	20.259.309.126

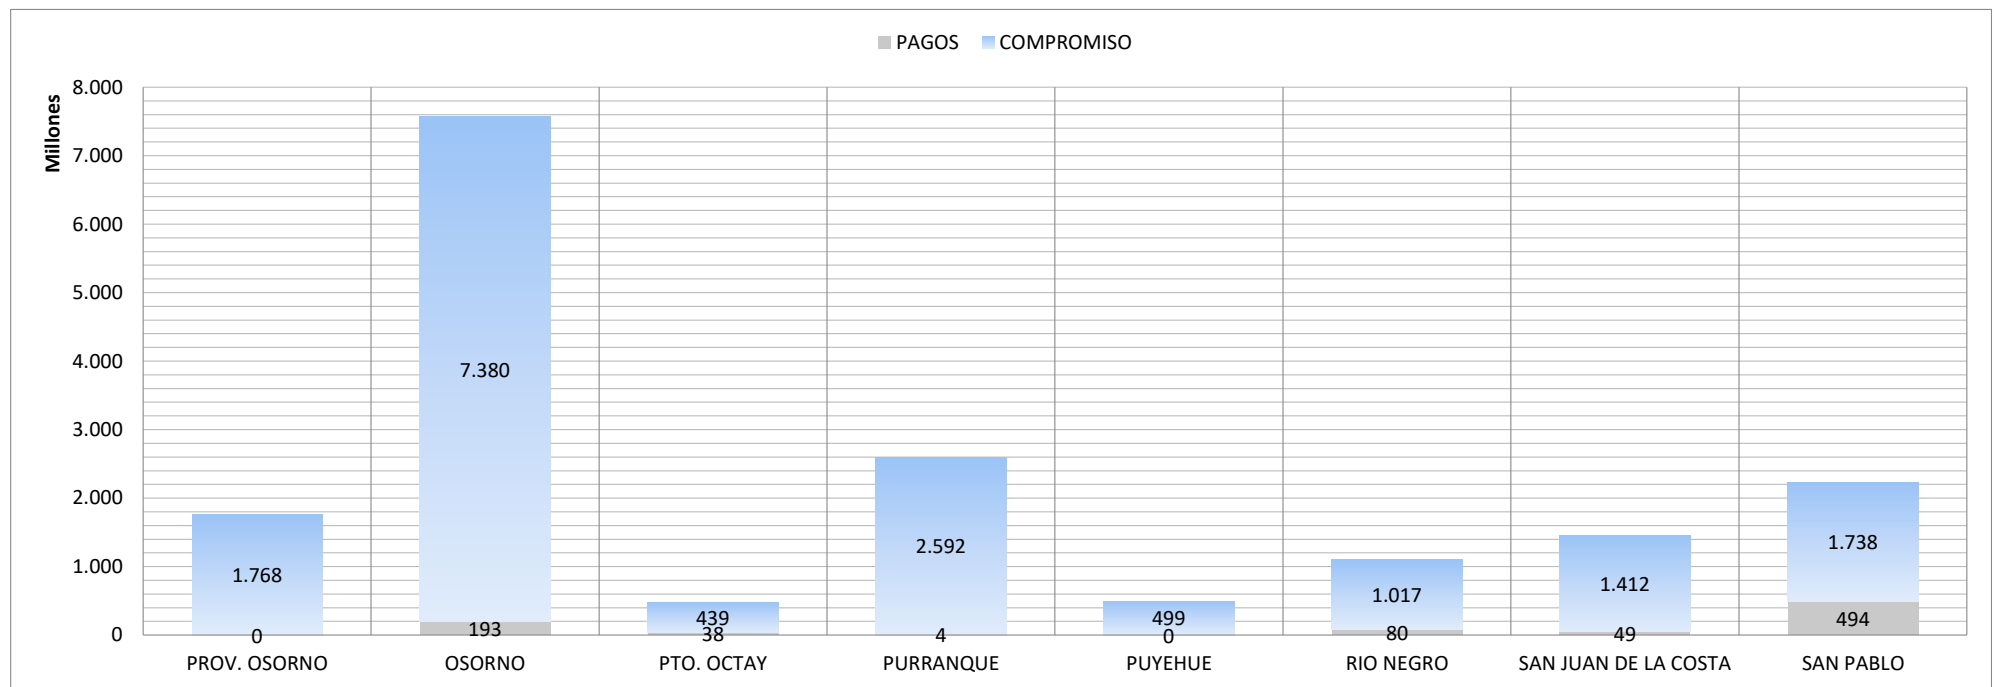

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue


Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE	13	23.533.337.695	24%	10.345.648.058	3.848.901.015	21%	96.619.623	3.752.281.392	2,51%	9.338.788.622
CALBUCO	10	15.802.445.405	16%	4.490.970.404	2.479.813.680	14%	675.714.476	1.804.099.204	27,25%	8.831.661.321
COCHAMO	10	3.768.377.570	4%	1.835.606.051	1.363.414.965	8%	128.836.336	1.234.578.629	9,45%	569.356.554
FRESIA	11	6.705.638.161	7%	3.772.609.434	1.231.302.360	7%	153.257.296	1.078.045.064	12,45%	1.518.561.658
FRUTILLAR	8	8.494.039.664	9%	6.631.000.907	1.001.051.456	6%	133.288.103	867.763.353	13,31%	801.849.364
LLANQUIHUE	6	5.077.179.330	5%	3.428.937.467	1.421.375.266	8%	45.930.228	1.375.445.038	3,23%	226.866.597
LOS MUERMOS	10	4.754.424.676	5%	1.631.048.642	996.248.375	6%	79.074.754	917.173.621	7,94%	2.075.071.068
MAULLIN	8	2.334.502.324	2%	0	1.022.193.890	6%	12.435.034	1.009.758.856	1,22%	1.312.308.434
P. MONTT	15	22.059.526.754	22%	2.896.610.517	3.600.586.457	20%	602.239.506	2.998.346.951	16,73%	14.899.674.766
P.VARAS	9	6.170.249.666	6%	1.765.243.187	959.690.434	5%	10.003.047	949.687.387	1,04%	3.403.674.046
TOTAL	100	98.699.721.245	100%	36.797.674.667	17.924.577.898	100%	1.937.398.403	15.987.179.495	10,81%	42.977.812.430

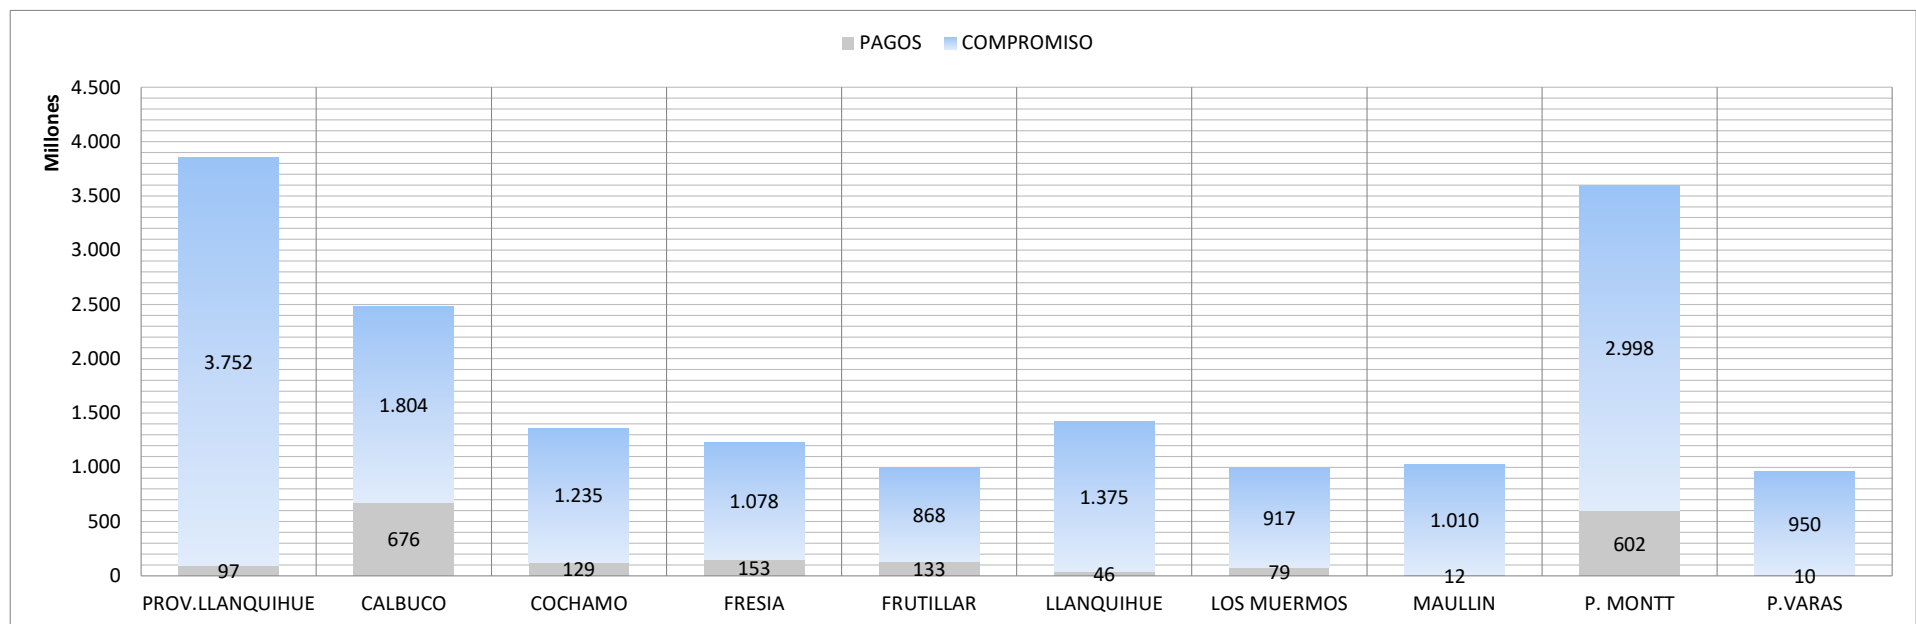

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe **Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 – %**


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					SALDO AÑOS FUTURO
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	
PROV. CHILOE	7	23.120.707.281	32%	2.219.652.340	4.701.042.553	29%	553.681.711	4.147.360.842	11,78%	16.200.012.389
ANCUD	11	5.670.269.706	8%	3.461.907.365	907.204.254	6%	7.736.042	899.468.212	0,85%	1.289.257.171
CASTRO	8	5.638.341.666	8%	3.912.802.595	1.540.618.644	9%	9.963.845	1.530.654.799	0,65%	184.920.427
CHONCHI	12	8.510.795.042	12%	1.096.786.302	1.634.647.078	10%	100.579.078	1.534.068.000	6,15%	5.742.315.344
CURACO DE VÉLEZ	5	2.594.614.666	4%	529.888.315	764.017.851	5%	19.999.438	744.018.413	2,62%	1.215.641.815
DALCAHUE	12	5.158.189.186	7%	1.966.843.257	1.612.952.049	10%	106.738.862	1.506.213.187	6,62%	1.540.820.014
PUQUELDON	4	4.587.912.003	6%	2.897.097.000	809.177.704	5%	0	809.177.704	0,00%	881.637.299
QUEILEN	6	2.664.927.266	4%	953.609.865	1.047.394.831	6%	364.560.398	682.834.433	34,81%	663.922.570
QUELLON	12	7.150.324.342	10%	3.117.487.475	1.384.149.500	8%	258.678.393	1.125.471.107	18,69%	2.492.845.315
QUEMCHI	10	4.782.740.087	7%	3.005.643.623	1.229.748.464	8%	11.522.822	1.218.225.642	0,94%	380.000.000
QUINCHAO	5	1.590.923.361	2%	148.121.383	713.779.540	4%	113.086.695	600.692.845	15,84%	729.022.438
TOTAL	92	71.469.744.607	100%	23.309.839.520	16.344.732.468	100%	1.546.547.284	14.798.185.184	9,46%	31.320.394.781

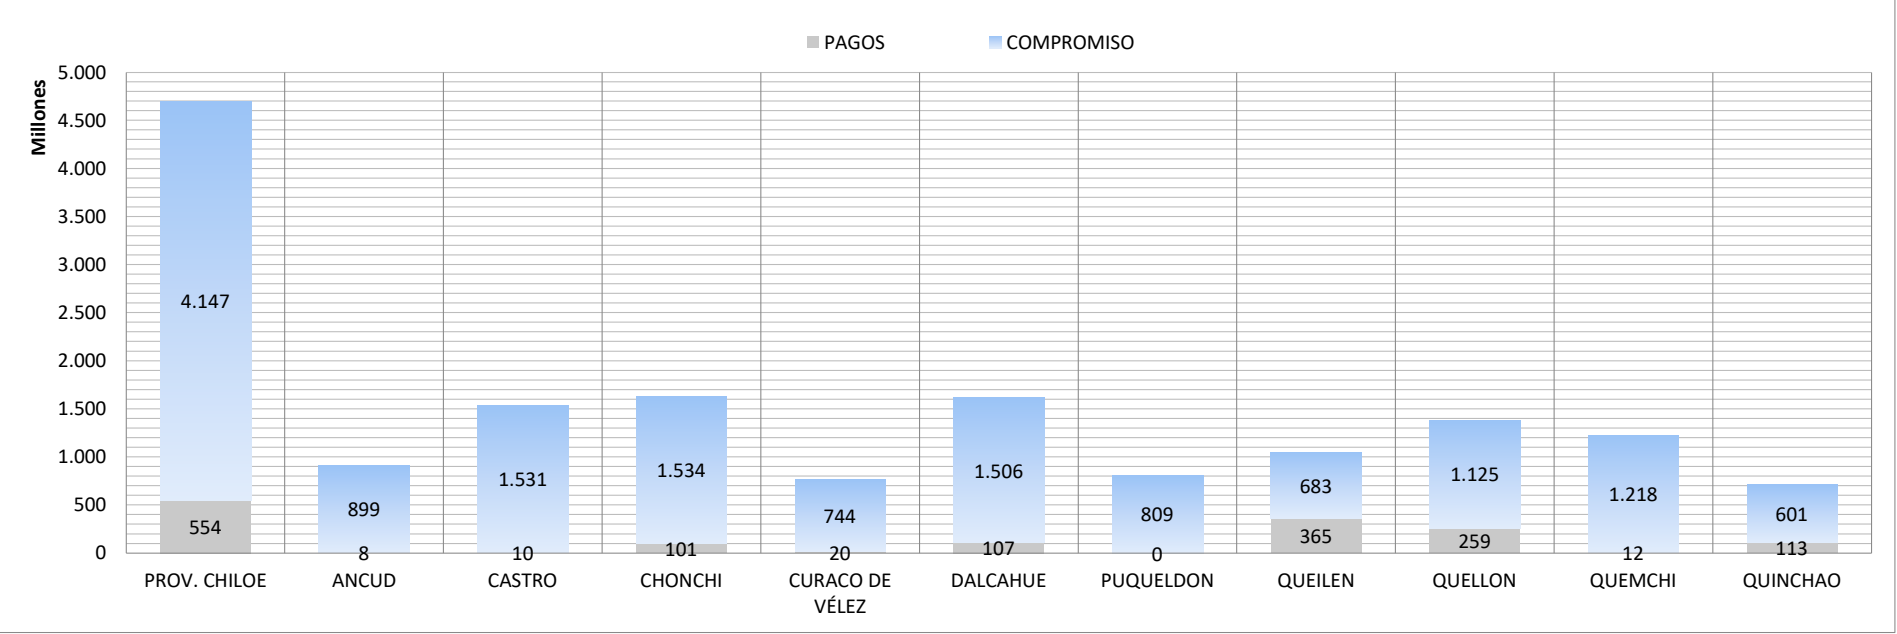

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR -02 al 28 Febrero 2022 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022					
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. PALENA	8	63.931.591.530	77%	10.277.167.330	10.754.129.372	70%	1.438.748.463	9.315.380.909	13,38%	42.763.786.759
CHAITEN	6	1.791.254.666	2%	775.279.241	1.107.296.667	7%	53.829.479	1.053.467.188	4,86%	0
FUTALEUFU	10	9.291.897.144	11%	8.084.818.448	713.918.344	5%	33.007.444	680.910.900	4,62%	374.892.024
HUALAIHUE	10	2.445.503.573	3%	1.327.451.208	701.721.202	5%	0	701.721.202	0,00%	393.902.663
PALENA	8	5.058.570.666	6%	2.965.144.797	2.001.090.650	13%	206.141.556	1.794.949.094	10,30%	85.675.000
TOTAL	42	82.518.817.579	100%	23.429.861.024	15.278.156.235	100%	1.731.726.942	13.546.429.293	11,33%	43.618.256.446

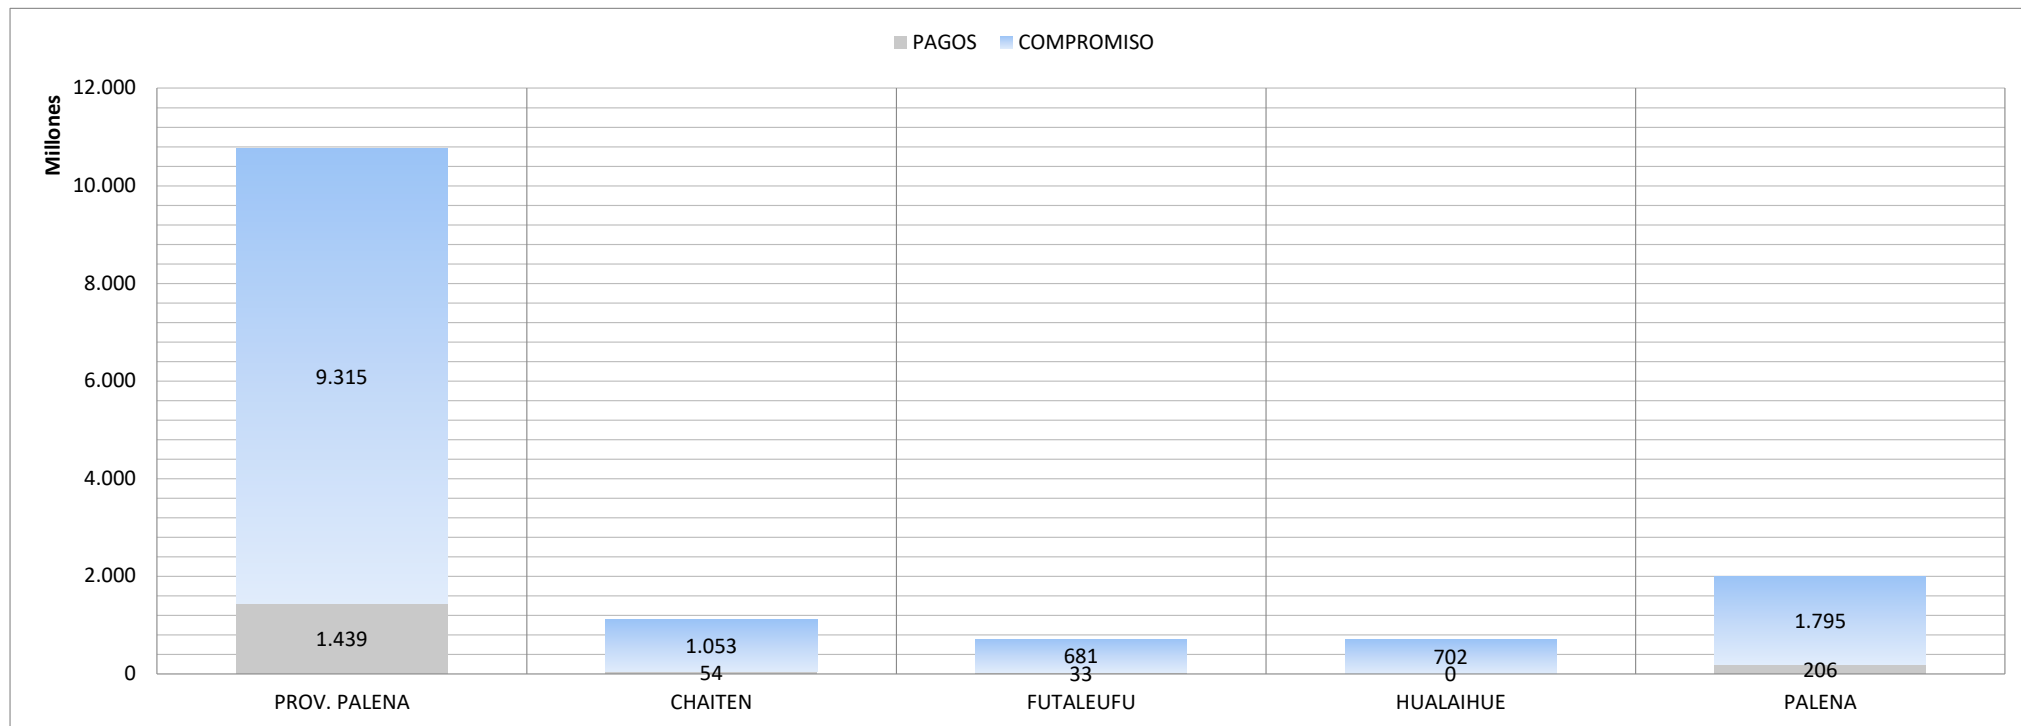

Eficiencia Presupuestaria Por Provisión


Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 - %

PROVISIÓN	PROVISIÓN
LIBRE	LIBRE
PV	PATAGONIA VERDE
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FIE	FONDO DE INFRAESTURA EDUCACIONAL
RSD	RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SS	SERVICIO SANITARIO
FDL	FONDO DESARROLLO LOCAL
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL	TOTAL


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2022			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
64.887.361.481	64.797.026.943	71,05%	90.334.538
11.861.941.078	11.893.324.423	13,04%	-31.383.345
8.008.329.785	8.000.000.000	8,77%	8.329.785
710.643.446	710.643.446	0,78%	0
258.142.656	258.142.656	0,28%	0
90.743.334	115.493.215	0,13%	-24.749.881
1.646.681.000	1.646.681.000	1,81%	0
228.718.057	228.718.057	0,25%	0
84.309.967	84.309.967	0,09%	0
110.486.692	110.486.692	0,12%	0
2.606.915.000	2.606.915.000	2,86%	0
746.055.504	746.055.504	0,82%	0
91.240.328.000	91.197.796.903	100%	42.531.097

COMPROMISO V/S PAGOS 2022		
COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO A DICIEMBRE
64.797.026.943	3.175.835.752	61.621.191.191
11.893.324.423	1.439.661.558	10.453.662.865
8.000.000.000	1.234.460.734	6.765.539.266
710.643.446	0	710.643.446
258.142.656	0	258.142.656
115.493.215	0	115.493.215
1.646.681.000	0	1.646.681.000
228.718.057	86.910.036	141.808.021
84.309.967	69.345.789	14.964.178
110.486.692	0	110.486.692
2.606.915.000	0	2.606.915.000
746.055.504	69.787.542	676.267.962
91.197.796.903	6.076.001.411	85.121.795.492

Marco Decretado Versus Compromiso

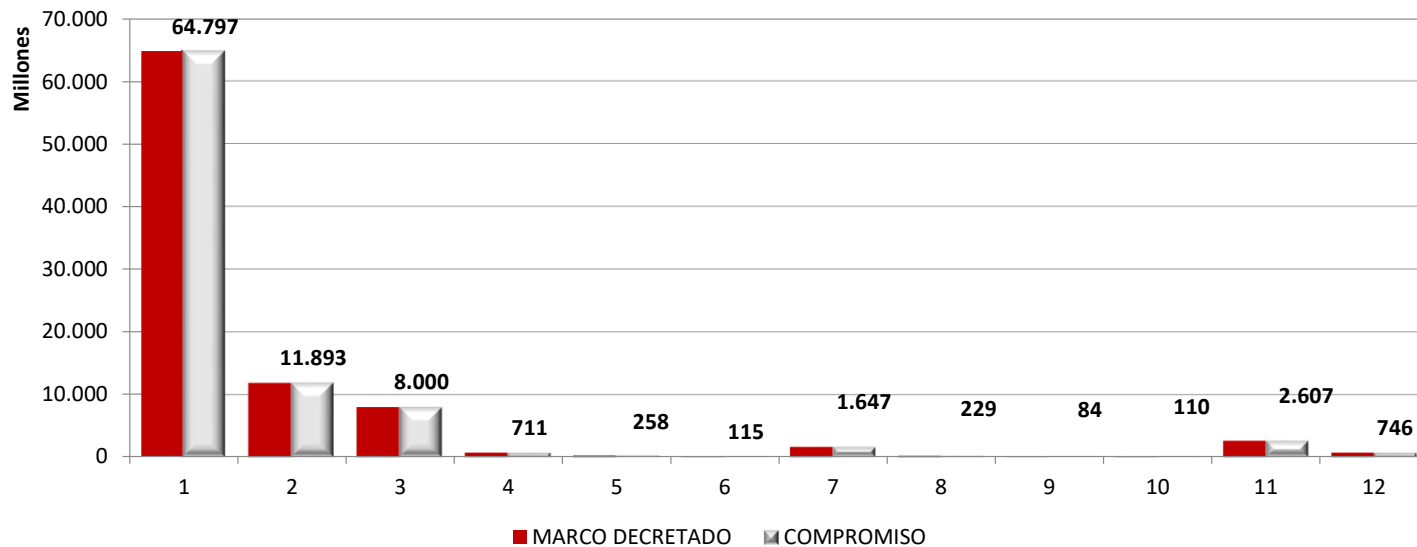


Compromiso Versus Pagos 2022

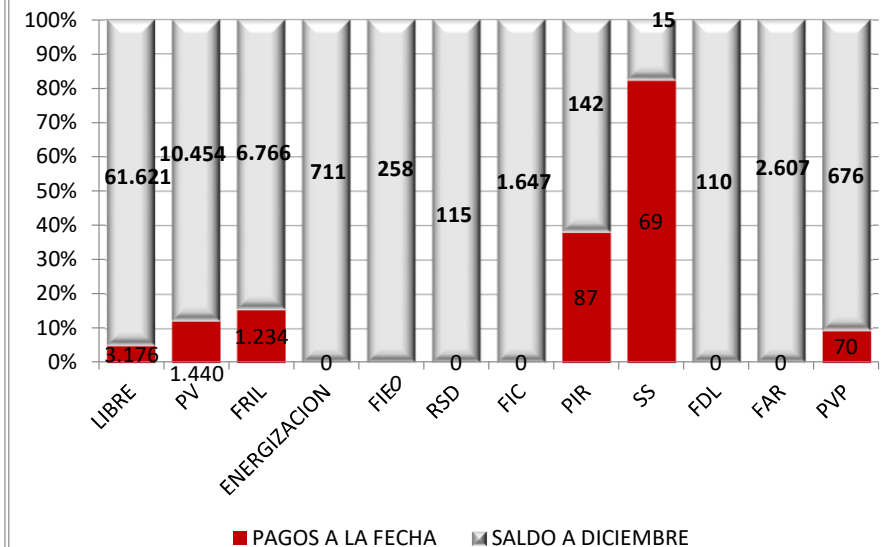


Eficiencia Presupuestaria Por Sector
Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 - %

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022					SALDO AÑOS FUTUROS
	COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18.460.270.234	4,50%	9.041.368.070	3.214.267.540	4%	192.488.507	3.021.779.033	5,99%	5.449.555.585
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.542.319.349	6,47%	10.278.915.854	12.456.564.559	14%	142.984.788	12.313.579.771	1,15%	3.790.295.916
DEPORTE	20.988.697.901	5,12%	10.026.876.102	1.785.816.260	2%	81.833.292	1.703.982.968	4,58%	9.149.910.386
EDUCACION Y CULTURA	61.840.907.250	15,08%	26.475.139.295	7.120.595.967	8%	749.897.887	6.370.698.080	10,53%	27.913.070.362
ENERGIA	1.234.773.000	0,30%	76.987.449	794.033.127	1%	0	794.033.127	0,00%	363.752.424
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	15.599.079.889	3,80%	7.299.241.190	2.710.844.071	3%	0	2.710.844.071	0,00%	5.585.837.209
JUSTICIA	49.980.000	0,01%	29.988.000	19.992.000	0%	0	19.992.000	0,00%	0
MULTISECTORIAL	53.111.056.872	12,95%	10.073.637.331	24.884.515.968	27%	1.511.620.827	23.372.895.141	6,07%	18.124.779.463
PESCA	1.227.800.000	0,30%	998.617.621	229.182.000	0%	0	229.182.000	0,00%	436
SALUD	50.117.659.703	12,22%	11.145.619.507	9.602.768.983	11%	1.959.161.105	7.643.607.878	20,40%	28.233.590.668
SEGURIDAD	390.938.000	0,10%	0	390.938.000	0%	0	390.938.000	0,00%	0
SILVOAGROPECUARIO	15.642.943.922	3,81%	8.480.908.736	3.031.611.809	3%	0	3.031.611.809	0,00%	3.764.811.297
TRANSPORTE	99.668.633.401	24,31%	32.238.735.797	14.690.934.519	16%	605.203.142	14.085.731.377	4,12%	52.532.064.584
VIVIENDA	45.185.421.762	11,02%	14.418.422.045	10.265.732.100	11%	832.811.863	9.432.920.237	8,11%	20.452.965.399
TOTAL	410.060.481.283	100%	140.584.456.997	91.197.796.903	100%	6.076.001.411	85.121.795.492	6,66%	175.360.633.729

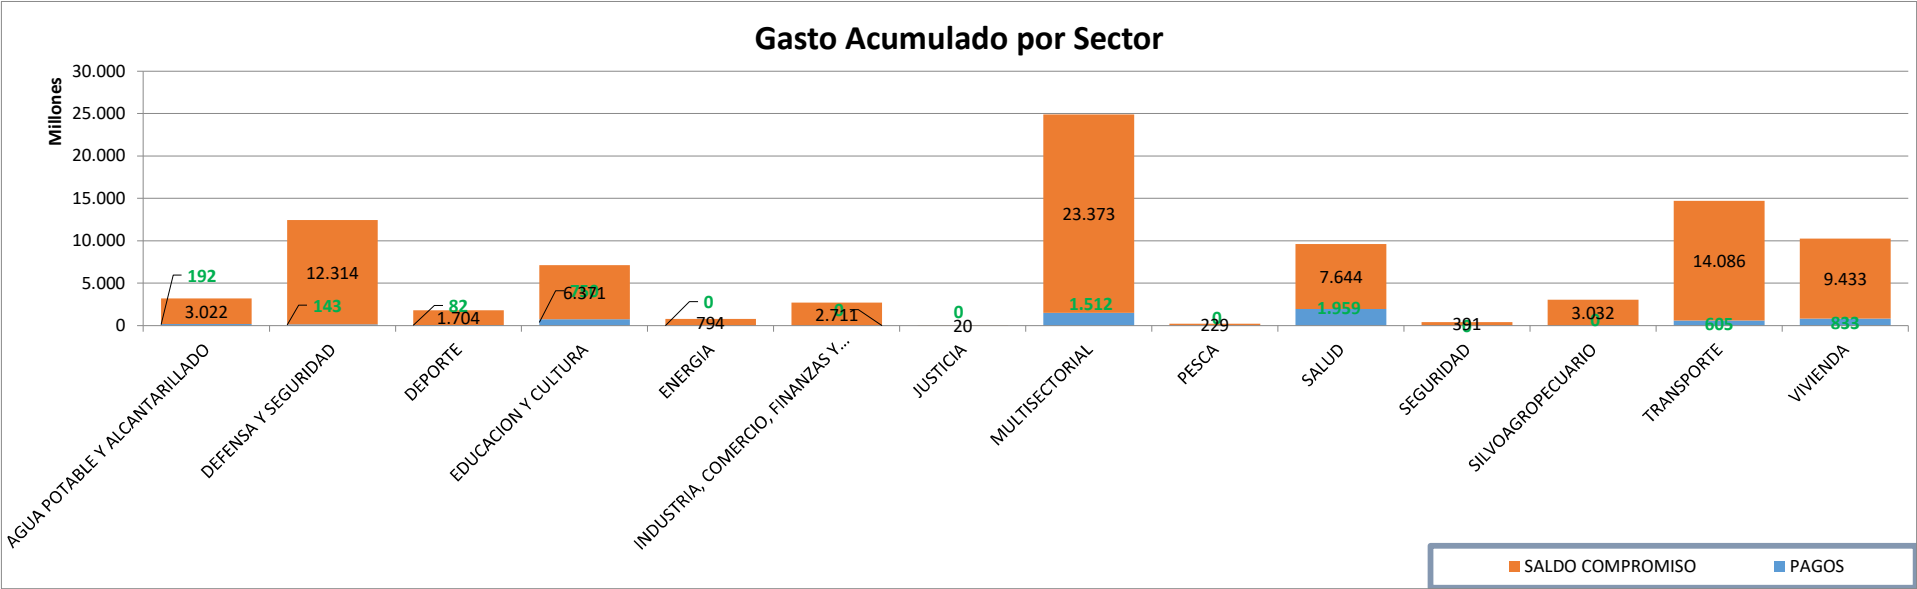

Distribución por Sub Título Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 - %

COSTO TOTAL			FNDR 2022							
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE	SALDO PROXIMOS AÑOS
22	1.130.002.000	0%	383.545.250	245.837.750	241.777.000	0,27%	0	0,00%	241.777.000	504.679.750
24	10.453.494.960	3%	0	10.453.494.960	10.453.494.960	11,46%	99.282.686	0,95%	10.354.212.274	0
29	12.486.432.409	3%	3.702.779.014	8.624.125.084	8.050.727.516	8,83%	164.747.641	2,05%	7.885.979.875	867.788.779
30	4.245.099.000	1%	2.044.900.799	1.067.439.283	1.067.438.951	1,17%	0	0,00%	1.067.438.951	1.132.759.250
31	318.022.241.618	78%	117.816.404.464	49.310.087.941	49.853.344.947	54,67%	4.577.510.350	9,18%	45.275.834.597	147.661.856.570
33	63.723.211.296	16%	16.636.827.470	21.539.342.982	21.531.013.529	23,61%	1.234.460.734	5,73%	20.296.552.795	25.193.549.380
	410.060.481.283		140.584.456.997	91.240.328.000	91.197.796.903	100,00%	6.076.001.411	17,91%	85.121.795.492	175.360.633.729

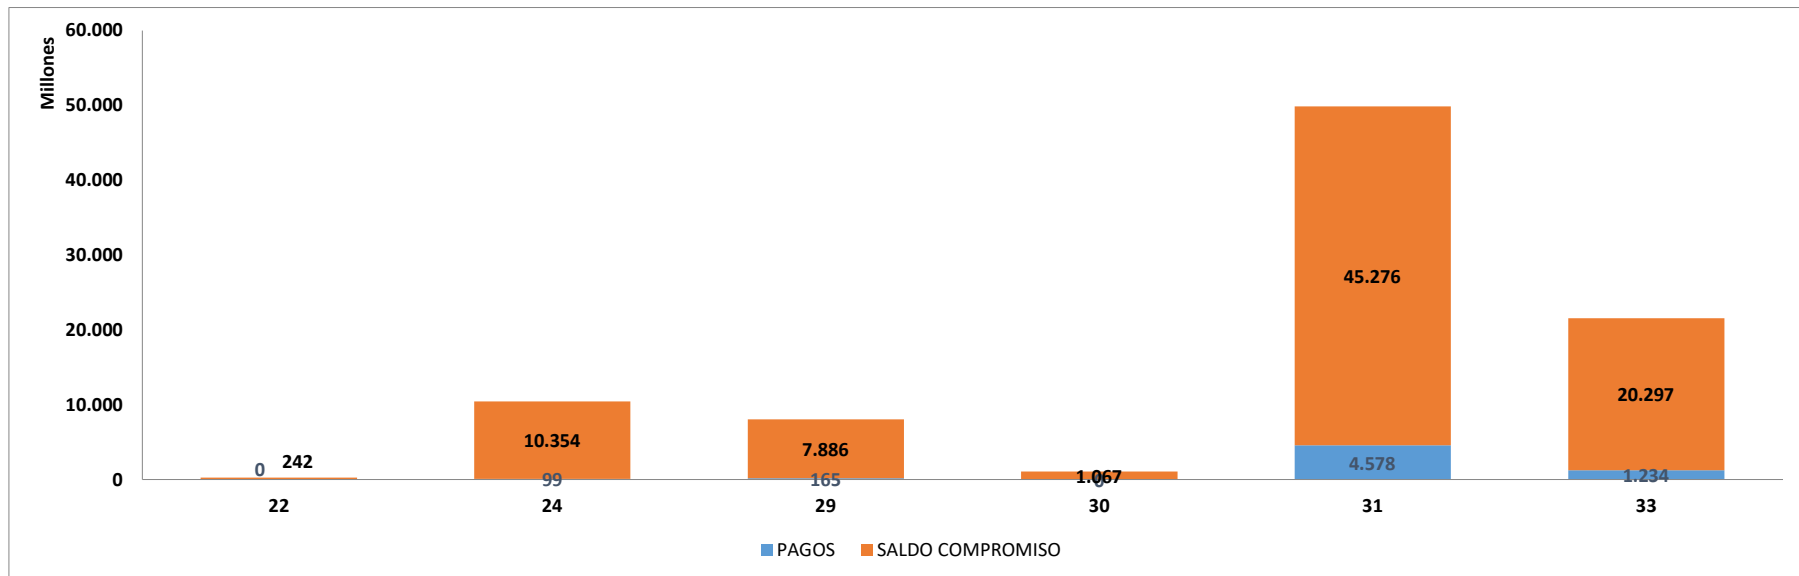



Distribución Fondo 7% Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2022 – %

CERTIFICADO CORE 44 DEL 04/02/2022

DISTRIBUCION DE FONDOS	%	
DISPONIBLE	100%	6.138.154.771
CONCURSABLES	75%	4.616.654.771
NO CONCURSABLES	25%	1.521.500.000

PRIVADOS
PUBLICOS

DISTRIBUCION PROVINCIAL FONDOS CONCURSABLES PRIVADOS		4.616.654.771
OSORNO	30%	1.384.996.431
LLANQUIHUE	33%	1.523.496.074
CHILOÉ	28%	1.292.663.336
PALENA	9%	415.498.929
	100%	4.616.654.770

Fondo Municipal
Cada Municipio de la Región recibirá el monto de \$ 10.143.333.- con un maximo de 2 proyectos de 50% cada uno ó podrá realizar un proyecto al 100%

PROPUESTA 2022		
TOTAL FONDOS NO CONCURSABLES		1.521.500.000
FONDO	%	\$
DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	20%	304.300.000
CULTURA REGIONAL	20%	304.300.000
GOBIERNO REGIONAL	16%	243.440.000
PROYECTOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL	24%	365.160.000
MUNICIPIOS	20%	304.300.000
TOTAL	100%	1.521.500.000

Distribución FRIL

Gasto FNDR - 02

al 28 Febrero 2022 - %

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022

Valores			
PROVINCIA	COMUNA	COMPROMISO 2022	TOTAL PAGADO 2022
CHIOE	ANCUD	199.909.443	1.423.538
CHIOE	CASTRO	445.839.203	4.853.415
CHIOE	CHONCHI	271.401.324	40.900.271
CHIOE	CURACO	199.999.421	19.999.438
CHIOE	DALCAHUE	238.822.226	100.813.862
CHIOE	PUQUELDON	194.518.590	0
CHIOE	QUEILEN	249.343.062	108.552.762
CHIOE	QUELLON	27.899.348	20.256.823
CHIOE	QUEMCHI	157.182.923	5.816.180
CHIOE	QUINCHAO	208.260.138	113.086.695
Total CHIOE		2.193.175.678	415.702.984
LLANQUIHUE	CALBUCO	382.081.705	75.234.713
LLANQUIHUE	COCHAMO	126.062.519	41.926.300
LLANQUIHUE	FRESIA	98.379.125	7.744.563
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	290.430.541	102.077.925
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	192.486.270	45.930.228
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	252.526.995	43.010.312
LLANQUIHUE	MAULLIN	12.435.034	12.435.034
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	175.810.405	51.464.399
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	101.884.564	10.003.047
Total LLANQUIHUE		1.632.097.158	389.826.521
OSORNO	PUERTO OCTAY	98.951.259	37.579.881
OSORNO	PURRANQUE	209.897.413	3.570.000
OSORNO	PUYEHUE	94.047.876	0
OSORNO	RIO NEGRO	393.432.365	80.372.278
OSORNO	S.J. COSTA	241.079.051	48.895.058
OSORNO	SAN PABLO	224.305.106	112.291.304
Total OSORNO		1.261.713.070	282.708.521
PALENA	CHAITEN	192.972.752	53.829.479
PALENA	FUTALEUFU	231.121.803	33.007.444
PALENA	HUALAIHUE	56.937.056	0
PALENA	PALENA	240.625.967	59.382.785
Total PALENA		721.657.578	146.219.708
Total general		5.808.643.484	1.234.457.734

RESUMEN CARTERA DE PROYECTOS FRIL NUEVOS

Costo Postulado		
PROVINCIA	COMUNA	Total
CHIOE	CURACO	71.425.775
CHIOE	QUELLON	145.000.000
CHIOE	QUEMCHI	112.697.486
CHIOE	QUINCHAO	100.000.000
Total CHIOE		429.123.261
LLANQUIHUE	FRESIA	314.846.721
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	199.346.000
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	200.000.000
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	26.075.000
LLANQUIHUE	MAULLIN	279.902.210
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	99.346.000
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	150.000.000
Total LLANQUIHUE		1.269.515.931
OSORNO	OSORNO	295.489.394
OSORNO	PUERTO OCTAY	100.000.000
OSORNO	PUYEHUE	99.346.000
Total OSORNO		494.835.394
PALENA	HUALAIHUE	398.224.900
Total PALENA		398.224.900
Total general		2.591.699.486



Distribución Subsidios
Eléctricos
Gasto FNDR - 02
al 28 Febrero
2022 – %

Total		
Comuna	Item	Total
Calbuco	01	702.976.989
Castro	01	160.000.000
Chaitén	01	240.000.000
Cochamó	03	35.000.000
Queilen	01	0
Quellón	01	480.000.000
Quemchi	01	160.000.000
	03	360.000.000
Quinchao	01	1.120.000.000
Total general		3.257.976.989

- 01 Privado
- 03 Público

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE OSORNO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.775.586.346	6.707.839.365	1.054.874.784	0	1.054.874.784	12.872.197	RE	TERMINO (PENDIENTE PAGO VALOR
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	820.000.000	763.016.245	56.983.755	46.565.381	10.418.374	0	RS*	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQU
31	2	A	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.274.081.000	4.041.424.075	2.200.624.684	1.300.000	2.199.324.684	1.032.032.241	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.195.526.000	2.981.694.999	141.653.730	141.653.730	0	72.177.271	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	303.198.575	0	303.198.575	150.000.000	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	49.980.000	29.988.000	19.992.000	0	19.992.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	1.292.101.175	1.698.429.923	3.840.000	1.694.589.923	1.153.654.902	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	988.704.000	0	307.204.000	0	307.204.000	681.500.000	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	241.100.243	0	241.100.243	273.820.000	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	514.504.308	711.016.692	0	711.016.692	590.000.000	RS	EN EJECUCION
33	3-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
31	2	L	UCACION Y CULTU	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	77.505.615	0	77.505.615	116.298.385	RS	EN EJECUCION
31	2	L	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	350.792.000	0	350.792.000	300.000.000	RS	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	28.597.621.346	17.051.890.349	7.163.376.001	193.359.111	6.970.016.890	4.382.354.996		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSC	167.403.000	0	33.480.600	0	33.480.600	133.922.400	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSC	511.250.000	0	50.000.000	0	50.000.000	461.250.000	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	678.653.000	0	83.480.600	0	83.480.600	595.172.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	750.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	675.000.000	RS	ARI 2022
31	2	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	124.979.600	0	124.979.600	124.816.400	RS	ARI 2022
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.564.917.000	0	75.000.000	0	75.000.000	1.489.917.000	RS	ARI 2022
33	3-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.669	0	51.385.669	0	51.385.669	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.616.098.669	0	326.365.269	0	326.365.269	2.289.733.400		
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	31.892.373.015	17.051.890.349	7.573.221.870	193.359.111	7.379.862.759	7.267.260.796		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUERTO OCTAY								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	19.780.000	7.512.000	12.268.000	0	12.268.000	0	RS	EN LIQUIDACION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	37.579.881	0	37.579.881	37.579.881	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	57.359.881	7.512.000	49.847.881	37.579.881	12.268.000	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	3	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	88.805.785	0	88.805.785	0	88.805.785	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	88.805.785	0	88.805.785	0	88.805.785	0		
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	483.872.666	7.512.000	476.360.666	37.579.881	438.780.785	0		
							COMUNA DE PURRANQUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	0	1.685.970	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	20.530.000	0	20.530.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	520.317.495	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR COLONIA PONCE Y OTROS	401.567.776	351.367.098	50.200.678	0	50.200.678	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR	694.291.000	80.867.465	613.423.535	0	613.423.535	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE	625.991.000	114.190.337	511.800.663	0	511.800.663	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	0	0	0	0	RS	EN LICITACIÓN
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	248.045.000	0	248.045.000	3.570.000	244.475.000	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.240.838.476	1.087.572.125	1.445.685.846	3.570.000	1.442.115.846	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	516.681.732	0	516.681.732	0	RS*	REVALUACION
31	2	L	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	299.862.683	0	299.862.683	3.817.927.317	RS	EN LICITACIÓN
29	3	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RSD	172.431.000	0	172.431.000	0	172.431.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.806.902.732	0	988.975.415	0	988.975.415	3.817.927.317		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	365.951.000	0	36.595.100	0	36.595.100	329.355.900	RS*	ARI 2022
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR DESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	0	48.301.900	0	48.301.900	434.717.100	RS*	ARI 2022
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	925.355.666	0	161.282.666	0	161.282.666	764.073.000		
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.973.096.874	1.087.572.125	2.595.943.927	3.570.000	2.592.373.927	4.582.000.317		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUYEHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	378.086.000	289.806.943	28.861.850	0	28.861.850	59.417.207	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	365.923.000	0	304.423.000	0	304.423.000	61.500.000	RE	EN REVALUACION
33	03-12*	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS	65.985.500	65.985.500	19.014.500	0	19.014.500	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	809.994.500	355.792.443	352.299.350	0	352.299.350	120.917.207		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS, PUYEHUE	19.839.684	0	19.839.684	0	19.839.684	0	RS*	EN EJECUCION
29	4	L	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS, PUYEHUE	276.551.000	30.628.859	0	0	0	245.922.141	RS*	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	296.390.684	30.628.859	19.839.684	0	19.839.684	245.922.141		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-12*	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	1.232.770.850	386.421.302	498.524.700	0	498.524.700	366.839.348		
							COMUNA DE RIO NEGRO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO	397.780.901	368.161.371	29.619.530	0	29.619.530	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CUL	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO	175.662.361	171.440.703	4.221.658	0	4.221.658	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	593.858.000	5.062.200	288.786.000	0	288.786.000	300.009.800	RS	EN LICITACIÓN
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	4.642.800	264.363.000	0	264.363.000	300.074.200	RS	EN EJECUCION
33	03-12*	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	244.324.000	0	244.324.000	80.372.278	163.951.722	0	RS**	EN EJECUCION
29	5	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	34.582.965	4.615.035	0	4.615.035	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.015.288.227	583.890.039	835.929.223	80.372.278	755.556.945	600.084.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	600.000.000	23.870.000	160.000.000	0	160.000.000	416.130.000	RS	ARI 2022
33	03-12*	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	701.385.666	23.870.000	261.385.666	0	261.385.666	416.130.000		
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.716.673.893	607.760.039	1.097.314.889	80.372.278	1.016.942.611	1.016.214.000		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA	3.749.709.000	3.288.753.021	82.744.535	0	82.744.535	378.211.444	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAM
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	260.583.216	0	260.583.216	2.300.000.000	RE	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	151.431.000	0	151.431.000	48.895.058	102.535.942	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.488.368.000	3.315.397.805	494.758.751	48.895.058	445.863.693	2.678.211.444		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	100.714.000	0	100.714.000	501.000.000	RS	EN REVALUACION
29	3	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COS	297.375.000	0	297.375.000	0	297.375.000	0	RS*	EN LICITACION
29	4	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COS	384.833.000	0	384.833.000	0	384.833.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.283.922.000	0	782.922.000	0	782.922.000	501.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	3	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40026656	REPOSICION VEHICULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN	56.815.000	0	56.815.000	0	56.815.000	0	RS*	ARI 2022
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	183.200.666	0	183.200.666	0	183.200.666	0		
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	7.955.490.666	3.315.397.805	1.460.881.417	48.895.058	1.411.986.359	3.179.211.444		
							COMUNA DE SAN PABLO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.511.032.409	2.804.810.540	1.706.221.869	381.361.150	1.324.860.719	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	268.481.000	0	268.481.000	112.291.304	156.189.696	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.804.413.409	2.816.540.040	1.987.873.369	493.652.454	1.494.220.915	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATI	117.572.149	0	117.572.149	0	117.572.149	0	RS*	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	117.572.149	0	117.572.149	0	117.572.149	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	5.048.371.224	2.816.540.040	2.231.831.184	493.652.454	1.738.178.730	0		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.141.835.000	44.744.000	424.794.800	0	424.794.800	1.672.296.200	RS	EN LICITACIÓN
31	1	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	229.982.084	133.780.916	0	133.780.916	160.000	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.532.020.591	2.224.665.535	1.133.142.291	0	1.133.142.291	2.174.212.765	RS	EN EJECUCION
29	3	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	300.469.824	75.396.020	0	75.396.020	1.114.256	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	6.682.518.978	0	0	0	0	RS	TERMINO
29	3	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	52.135.637	680.363	0	680.363	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.276.509.328	9.534.516.058	1.767.794.390	0	1.767.794.390	3.847.783.221		
							TOTAL PROVINCIALES	15.276.509.328	9.534.516.058	1.767.794.390	0	1.767.794.390	3.847.783.221		
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	73.579.158.516	34.807.609.718	17.701.873.043	857.428.782	16.844.444.261	20.259.309.126		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000	27.624.986	0	0	0	0	RS	NO SE EJECUTARA PASARA A EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	337.736.308	110.486.692	0	110.486.692	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA, ENTRE CALLE QUEPE Y AVENIDA JUAN SOLER MANFREDINI, PUERTO MONTT	325.598.000	290.137.970	35.460.030	30.460.605	4.999.425	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.406.628.940	1.325.968.126	2.256.411.601	448.723.960	1.807.687.641	4.824.249.213	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	1.005.892.540	900.259.186	105.633.354	1.800.000	103.833.354	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	16.495.000	0	16.495.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.709.481.608	8.733.941	406.556.514	69.787.542	336.768.972	2.294.191.153	RS	EN EJECUCION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	205.328.000	0	205.328.000	51.467.399	153.860.601	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.173.259.088	2.896.610.517	3.136.371.191	602.239.506	2.534.131.685	7.118.440.366		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	50.000.000	0	50.000.000	879.015.000	RE	EN LICITACIÓN
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	0	89.090.400	0	89.090.400	356.471.600	RS*	EN ADJUDICACION
31	2	L	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	5.496.302.000	0	156.302.000	0	156.302.000	5.340.000.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.593.000	0	58.718.800	0	58.718.800	602.874.200	RS	EN CONVENIO
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	58.718.400	0	58.718.400	602.873.600	RS	EN CONVENIO
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	8.834.882.000	0	412.829.600	0	412.829.600	7.781.234.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	22.059.526.754	2.896.610.517	3.600.586.457	602.239.506	2.998.346.951	14.899.674.766		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CALBUCO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	9.889.982.000	2.025.590.387	1.030.164.144	304.917.526	725.246.618	6.834.227.469	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	853.587.515	442.213.444	164.764.926	277.448.518	318.825.587	RS	EN EJECUCION
22	ESTUDIOS	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	33.000.000	25.939.250	0	25.939.250	51.060.750	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, COMUNA DE CALBUCO	955.306.999	875.961.210	79.345.789	69.345.789	10.000.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40015774	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES VILLA SAN ANDRÉS Y LOS TULIPANES, CALBUCO	365.318.000	333.136.407	32.181.593	28.730.974	3.450.619	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40015770	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS CALLES CARLOS CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES, CALBUCO	437.544.000	369.694.885	67.849.115	32.720.548	35.128.567	0	RS	EN EJECUCION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	500.306.279	0	500.306.279	75.234.713	425.071.566	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.873.083.824	4.490.970.404	2.177.999.614	675.714.476	1.502.285.138	7.204.113.806		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	778.142.845	0	68.341.400	0	68.341.400	709.801.445	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.070	0	157.087.000	0	157.087.000	917.746.070	RS	EN ADJUDICACION (ESPERA PPTO AP
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.852.975.915	0	225.428.400	0	225.428.400	1.627.547.515		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	15.802.445.405	4.490.970.404	2.479.813.680	675.714.476	1.804.099.204	8.831.661.321		
							COMUNA DE COCHAMO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.330.176.000	1.315.794.204	14.381.796	0	14.381.796	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	106.672.600	0	106.672.600	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LLAGUEPE, COCHAMO	606.455.904	487.324.447	119.131.457	86.910.036	32.221.421	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE	122.370.000	5.900.000	116.470.000	0	116.470.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO	42.500.000	3.830.000	38.670.000	0	38.670.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINCHOS	760.000.000	0	710.643.446	0	710.643.446	49.356.554	RS	EN EJECUCION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.060.000	0	126.060.000	41.926.300	84.133.700	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.116.991.904	1.835.606.051	1.232.029.299	128.836.336	1.103.192.963	49.356.554		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	20.000.000	RS	EL LICITACION
31	2	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40035814	TRANSFERENCIA CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO DE COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	525.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	520.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	3.768.377.570	1.835.606.051	1.363.414.965	128.836.336	1.234.578.629	569.356.554		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE FRESIA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.709.065	405.464.679	133.244.386	1.330.000	131.914.386	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.233.642.760	84.074.240	0	84.074.240	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA	590.808.430	407.643.721	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	66.023.294	0	66.023.294	0	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	423.440.000	350.760.000	128.833.144	221.926.856	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE FRESIA (EL RINCON-RIO LLICO-TEODORO SCHAFER)	239.183.000	208.661.832	30.521.168	12.149.589	18.371.579	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	668.989.736	197.639.264	3.200.000	194.439.264	0	RS*	EN EJECUCION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.744.563	0	7.744.563	7.744.563	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.825.781.058	3.772.609.434	870.006.915	153.257.296	716.749.619	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	138.444.342	0	138.444.342	780.671.658	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	919.116.000	0	138.444.342	0	138.444.342	780.671.658		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	0	104.210.000	0	104.210.000	737.890.000	RS*	ARI 2022
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	118.641.103	0	118.641.103	0	118.641.103	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	960.741.103	0	222.851.103	0	222.851.103	737.890.000		
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.705.638.161	3.772.609.434	1.231.302.360	153.257.296	1.078.045.064	1.518.561.658		
							COMUNA DE FRUTILLAR								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	168.865.063	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	6.460.935.844	184.607.229	1.290.000	183.317.229	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	0	188.550.161	0	188.550.161	261.021.839	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	322.319.000	1.200.000	321.119.000	29.920.178	291.198.822	0	RS	EN EJECUCION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	112.311.850	0	102.077.925	102.077.925	0	10.233.925	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.758.748.923	6.631.000.907	796.354.315	133.288.103	663.066.212	271.255.764		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	218.397.000	0	58.397.000	0	58.397.000	160.000.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMaceda-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	55.148.400	0	55.148.400	370.593.600	RS	EN LIQUIDACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	644.139.000	0	113.545.400	0	113.545.400	530.593.600		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	91.151.741	0	91.151.741	0	91.151.741	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	91.151.741	0	91.151.741	0	91.151.741	0		
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	8.494.039.664	6.631.000.907	1.001.051.456	133.288.103	867.763.353	801.849.364		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE LLANQUIHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	43.800.000	26.570.650	0	26.570.650	12.029.350	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.385.137.467	12.029.350	0	12.029.350	13.810.847	RS	EN EJECUCION
33	03-124	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	145.369.000	0	145.369.000	45.930.228	99.438.772	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.638.746.664	3.428.937.467	183.969.000	45.930.228	138.038.772	25.840.197		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	1	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	37.756.600	0	37.756.600	201.026.400	RS	CONVENIO RECILIADO
29	5	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	1.098.264.000	0	1.098.264.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.337.047.000	0	1.136.020.600	0	1.136.020.600	201.026.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-124	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.077.179.330	3.428.937.467	1.421.375.266	45.930.228	1.375.445.038	226.866.597		
							COMUNA DE LOS MUERMOS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS	1.114.527.000	1.082.926.319	0	0	0	0	IN	TERMINO
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS	207.019.010	186.563.100	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	46.415.525	0	46.415.525	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	6.815.000	0	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	247.820.748	475.243.984	36.064.442	439.179.542	167.705.268	RS	EN EJECUCION
33	03-124	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	202.792.000	0	202.792.000	43.010.312	159.781.688	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.582.077.010	1.631.048.642	731.266.509	79.074.754	652.191.755	167.705.268		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	691.045.000	0	63.104.500	0	63.104.500	627.940.500	RS*	ARI 2022
31	2	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	704.917.000	0	40.491.700	0	40.491.700	664.425.300	RS*	ARI 2022
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	650.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	615.000.000	RS	ARI 2022
33	03-124	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.172.347.666	0	264.981.866	0	264.981.866	1.907.365.800		
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	4.754.424.676	1.631.048.642	996.248.375	79.074.754	917.173.621	2.075.071.068		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE MAULLIN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	50.000.000	0	50.000.000	784.246.000	RS	EN LICITACIÓN
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	12.435.068	0	12.435.034	12.435.034	0	34	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	846.681.068	0	62.435.034	12.435.034	50.000.000	784.246.034		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	25.523.600	0	25.523.600	112.094.400	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	80.242.000	0	80.242.000	370.968.000	RS	EN LICITACIÓN
29	5	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	517.357.624	0	517.357.624	0	517.357.624	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.106.185.624	0	623.123.224	0	623.123.224	483.062.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	50.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	45.000.000	RS	ARI 2022
29	3	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	205.250.000	0	205.250.000	0	205.250.000	0	RS*	ARI 2022
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.632	0	126.385.632	0	126.385.632	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	381.635.632	0	336.635.632	0	336.635.632	45.000.000		
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.334.502.324	0	1.022.193.890	12.435.034	1.009.758.856	1.312.308.434		
							COMUNA DE PUERTO VARAS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.237.007.000	484.503.319	538.789.368	0	538.789.368	213.714.313	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE LA QUEBRADA, PUERTO VARAS	246.000.000	204.358.001	0	0	0	0	RS	TERMINO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	52.464.000	0	52.464.000	10.003.047	42.460.953	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.282.407.000	1.765.243.187	591.253.368	10.003.047	581.250.321	1.884.268.446		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	1	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	160.000.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	101.251.400	0	101.251.400	605.005.600	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	87.200.000	0	87.200.000	0	RS	EN ADJUDICACION
31	2	L	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	818.000.000	0	63.600.000	0	63.600.000	754.400.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.811.457.000	0	292.051.400	0	292.051.400	1.519.405.600		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	6.170.249.666	1.765.243.187	959.690.434	10.003.047	949.687.387	3.403.674.046		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.959.390.445	118.130.555	236.937	117.893.618	0	RS	EN EJECUCION
31	1	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	264.429.800	216.119.200	0	216.119.200	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.702.449.619	863.652.381	0	863.652.381	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	94.848.325	261.993.375	0	261.993.375	1.693.938.300	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	147.463.604	716.916.006	0	716.916.006	1.440.447.390	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	2.838.191.706	177.066.265	411.958.109	0	411.958.109	2.249.167.332	RS	EN ADJUDICACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	18.317.970.706	10.345.648.058	2.588.769.626	236.937	2.588.532.689	5.383.553.022		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	504.376.000	0	504.376.000	0	RS*	EN LICITACION
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	182.350.000	0	182.350.000	718.150.000	RS*	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.404.876.000	0	686.726.000	0	686.726.000	718.150.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE P	2.405.500.000	0	40.550.000	0	40.550.000	2.364.950.000	RS*	EN LICITACIÓN
31	2	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	EJECUCION	40020386	CONSTRUCCION INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO SEDE PTO MONTT	733.194.000	0	53.319.400	0	53.319.400	679.874.600	RS	ARI 2022
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	0	70.000.000	0	70.000.000	192.261.000	RS	ARI 2022
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVAD	367.671.565	0	367.671.565	96.382.686	271.288.879	0	RS***	EN EJECUCION
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLIC	41.864.424	0	41.864.424	0	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.810.490.989	0	573.405.389	96.382.686	477.022.703	3.237.085.600		
							TOTAL PROVINCIALES	23.533.337.695	10.345.648.058	3.848.901.015	96.619.623	3.752.281.392	9.338.788.622		
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	98.699.721.245	36.797.674.667	17.924.577.898	1.937.398.403	15.987.179.495	42.977.812.430		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE ANCUD								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	155.719.974	4.588.525	0	4.588.525	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	30.800.000	0	30.800.000	0	RS	EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	648.834.084	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	558.705.785	534.324.785	24.381.000	0	24.381.000	0	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAM
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	651.094.742	644.765.397	4.689.345	4.689.345	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	836.562.306	9.196.694	1.623.159	7.573.535	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICU	403.233.000	398.268.822	4.964.178	0	4.964.178	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	45.474.000	0	45.474.000	0	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAM
33	3-12	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.909.000	0	199.909.000	1.423.538	198.485.462	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.797.811.023	3.461.907.365	324.002.742	7.736.042	316.266.700	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, AN	1.787.342.000	0	498.084.829	0	498.084.829	1.289.257.171	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.787.342.000	0	498.084.829	0	498.084.829	1.289.257.171		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	3-12	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	85.116.683	0	85.116.683	0	85.116.683	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	85.116.683	0	85.116.683	0	85.116.683	0		
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.670.269.706	3.461.907.365	907.204.254	7.736.042	899.468.212	1.289.257.171		
							COMUNA DE CASTRO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	55.734.706	0	55.734.706	0	RS	EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	2.764.063.309	921.413.291	5.110.430	916.302.861	93.879.400	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CUL	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	83.314.608	0	83.314.608	0	RS	EN EJECUCION
33	3-12	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	321.614.000	0	321.614.000	4.853.415	316.760.585	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	583.100.000	579.220.600	3.879.400	0	3.879.400	0	RS*	TERMINO
29	5	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	68.425.000	68.425.000	0	0	0	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.392.638.000	3.912.802.595	1.385.956.005	9.963.845	1.375.992.160	93.879.400		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	103.276.973	0	103.276.973	91.041.027	RS	EN ADJUDICACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	194.318.000	0	103.276.973	0	103.276.973	91.041.027		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	3-12	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	5.638.341.666	3.912.802.595	1.540.618.644	9.963.845	1.530.654.799	184.920.427		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CHONCHI								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	200.000.000	0	200.000.000	132.913.953	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	112.910.388	130.000.000	0	130.000.000	300.353.612	RS	EN LIQUIDACION (REVALUACION)
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	442.466.502	48.144.153	0	48.144.153	0	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	36.313.682		0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	12.546.816	611.792.305	0	611.792.305	2.226.229.879	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	128.667.588	71.332.412	59.678.807	11.653.605	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	294.589.721	0	294.589.721	40.900.271	253.689.450	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.096.789.376	1.044.387.023	1.355.858.591	100.579.078	1.255.279.513	2.659.497.444		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40022710	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE CUCAO, COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	180.000.000	RS*	ARI 2022
31	2	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	24.567.500	0	24.567.500	221.107.500	RS*	ARI 2022
31	2	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	962.086.000	0	56.208.600	0	56.208.600	905.877.400	RS*	ARI 2022
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	52.399.279	51.626.721	0	51.626.721	1.775.833.000	RS	EN CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.414.005.666	52.399.279	278.788.487	0	278.788.487	3.082.817.900		
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	8.510.795.042	1.096.786.302	1.634.647.078	100.579.078	1.534.068.000	5.742.315.344		
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ	614.955.000	529.888.315	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	1.556.275.000	0	340.633.185	0	340.633.185	1.215.641.815	RS	EN LICITACIÓN
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	99.999.000	0	99.999.000	19.999.438	79.999.562	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.271.229.000	529.888.315	440.632.185	19.999.438	420.632.747	1.215.641.815		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	3	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	197.000.000	0	197.000.000	0	197.000.000	0	RS*	ARI 2022
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	323.385.666	0	323.385.666	0	323.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.594.614.666	529.888.315	764.017.851	19.999.438	744.018.413	1.215.641.815		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE DALCAHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE	466.092.000	439.996.847	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	278.334	0	278.334	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA, DALCAHUE	315.969.336	314.969.336	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	5.925.000	8.161.500	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	497.165.437	258.142.656	0	258.142.656	54.557.907	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	0	263.201.664	0	263.201.664	595.971.336	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	350.589.287	0	0	0	0	RS	TERMINO
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	308.285.000	0	308.285.000	100.813.862	207.471.138	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.498.940.520	1.966.843.257	843.994.154	106.738.862	737.255.292	650.529.243		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	179.017.800	0	179.017.800	216.071.200	RS	EN EJECUCION
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	72.616.429	0	72.616.429	674.219.571	RS	CONVENIO EN TRAMITE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.141.925.000	0	251.634.229	0	251.634.229	890.290.771		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	5	N	SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	390.938.000	0	390.938.000	0	RS*	ARI 2022
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	517.323.666	0	517.323.666	0	517.323.666	0		
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	5.158.189.186	1.966.843.257	1.612.952.049	106.738.862	1.506.213.187	1.540.820.014		
							COMUNA DE PUQUELDON								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.897.097.000	256.317.438	0	256.317.438	318.686.899	RS	PENDIENTE REVALUACION
33	33-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	198.237.000	0	198.237.000	0	198.237.000	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.670.338.337	2.897.097.000	454.554.438	0	454.554.438	318.686.899		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	228.237.600	0	228.237.600	562.950.400	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	228.237.600	0	228.237.600	562.950.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	33-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.587.912.003	2.897.097.000	809.177.704	0	809.177.704	881.637.299		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE QUEILEN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	886.126.249	289.238.708	75.908.292	213.330.416	175.547.043	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	801.023.000	48.039.016	264.608.457	22.824.184	241.784.273	488.375.527	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.491.000	0	199.491.000	108.552.762	90.938.238	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN	167.671.000	0	167.671.000	157.275.160	10.395.840	0	RS*	EN EJECUCION
29	5	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN	19.444.600	19.444.600	0	0	0	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.538.541.600	953.609.865	921.009.165	364.560.398	556.448.767	663.922.570		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.664.927.266	953.609.865	1.047.394.831	364.560.398	682.834.433	663.922.570		
							COMUNA DE QUELLON								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON	2.531.139.000	2.368.323.791	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.697.420.000	155.346.347	534.324.664	230.949.089	303.375.575	1.007.748.989	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	130.210.769	0	130.210.769	196.487.089	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	10.350.000	0	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	23.060.000	0	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION
29	3	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON	384.893.833	370.448.195	7.472.481	7.472.481	0	6.973.157	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	835.261.000	0	200.887.320	0	200.887.320	634.373.680	RE	EN LIQUIDACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	27.334.000	0	27.334.000	20.256.823	7.077.177	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.059.524.833	3.117.487.475	933.639.234	258.678.393	674.960.841	1.845.582.915		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	143.165.000	0	143.165.000	572.660.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	18.650.600	0	18.650.600	74.602.400	RS	CONVENIO EN TRAMITE
29	5	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	187.309.000	0	187.309.000	0	187.309.000	0	RE*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	996.387.000	0	349.124.600	0	349.124.600	647.262.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	94.412.509	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	94.412.509	0	101.385.666	0	101.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.150.324.342	3.117.487.475	1.384.149.500	258.678.393	1.125.471.107	2.492.845.315		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE QUEMCHI								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	294.405.468	0	294.405.468	0	RS*	EN LIQUIDACION
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	119.496.976	0	119.496.976	0	RS*	EN LIQUIDACION
31	2	A	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI.	494.720.758	494.720.758	0	0	0	0	RS*	TERMINO
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	162.052.228	0	162.052.228	0	SR	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE, QUEMCHI	532.823.858	405.106.547	127.717.311	5.706.642	122.010.669	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	158.820.000	0	158.820.000	5.816.180	153.003.820	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES Y ADQ. CAMION RECOLECTOR RSD SECT. INSULARE	291.193.000	270.322.185	20.870.815	0	20.870.815	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.889.006.421	3.005.643.623	883.362.798	11.522.822	871.839.976	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	600.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	380.000.000	RS*	EN LICITACIÓN
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	767.348.000	0	220.000.000	0	220.000.000	380.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.782.740.087	3.005.643.623	1.229.748.464	11.522.822	1.218.225.642	380.000.000		
							COMUNA DE QUINCHAO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	829.058.000	730.000	298.131.257	0	298.131.257	530.196.743	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO	367.393.000	147.391.383	165.001.617	0	165.001.617	55.000.000	RS*	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	132.912.390	0	113.086.695	113.086.695	0	19.825.695	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.329.363.390	148.121.383	576.219.569	113.086.695	463.132.874	605.022.438		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO	155.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	124.000.000	IN	CONVENIO EN TRAMITE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	155.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	124.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	106.559.971	0	106.559.971	0	106.559.971	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	106.559.971	0	106.559.971	0	106.559.971	0		
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.590.923.361	148.121.383	713.779.540	113.086.695	600.692.845	729.022.438		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	543.336.961	0	0	0	985.030.039	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.097.291.000	878.186.876	697.041.393	553.681.711	143.359.682	522.062.731	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	400.121.297	0	400.121.297	100.000.000	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.923.907.800	2.219.652.340	1.097.162.690	553.681.711	543.480.979	1.607.092.770		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	4.454.843.000	0	281.179.381	0	281.179.381	4.173.663.619	RS	EN REVALUACION
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	250.000.000	0	250.000.000	10.419.256.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	15.124.099.000	0	531.179.381	0	531.179.381	14.592.919.619		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVAT	2.453.429.905	0	2.453.429.905	0	2.453.429.905	0	RS***	EN EJECUCION
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLIC	619.270.576	0	619.270.576	0	619.270.576	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.072.700.481	0	3.072.700.481	0	3.072.700.481	0		
							TOTAL PROVINCIALES	23.120.707.281	2.219.652.340	4.701.042.553	553.681.711	4.147.360.842	16.200.012.389		
							TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	71.469.744.607	23.309.839.520	16.344.732.468	1.546.547.284	14.798.185.184	31.320.394.781		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CHAITEN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	118.575.240	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	229.300.000	262.102.000	0	262.102.000	0	RS	EN EJECUCION
33	03-12	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	53.829.479	146.170.521	0	RS**	EN EJECUCION
29	5	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO	534.255.000	427.404.001	217.404.001	0	217.404.001	0	RS*	TERMINO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.363.464.000	775.279.241	679.506.001	53.829.479	625.676.522	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	3	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITÉN	301.405.000	0	301.405.000	0	301.405.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	301.405.000	0	301.405.000	0	301.405.000	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-12	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.791.254.666	775.279.241	1.107.296.667	53.829.479	1.053.467.188	0		
							COMUNA DE FUTALEUFU								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	0	0	0	0	RS	TERMINO
31	2	A	DEPORTE	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.439.918.627	93.662.475	0	93.662.475	366.999.898	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	703.415.000	600.716.453	102.698.547	0	102.698.547	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)
22	ESTUDIO	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	31.428.000	94.630.000	0	94.630.000	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	18.160.000	0	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION
29	4	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	38.279.732	27.587.134	7.340.867	0	7.340.867	3.351.731	RS*	EN EJECUCION
29	5	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	17.102.368	11.083.348	1.478.652	0	1.478.652	4.540.368	RS*	EN EJECUCION
29	6	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	51.401.000	48.128.836	3.272.137	0	3.272.137	27	RS*	EN EJECUCION
33	03-12	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	266.290.000	0	266.290.000	33.007.444	233.282.556	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.165.511.478	8.084.818.448	587.532.678	33.007.444	554.525.234	374.892.024		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-12	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.291.897.144	8.084.818.448	713.918.344	33.007.444	680.910.900	374.892.024		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE HUALAIHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA	231.709.000	217.737.229	0	0	0	0	RS*	TERMINO
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA	364.878.000	356.421.271	0	0	0	0	RS*	TERMINO
31	2	A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	657.583.000	535.395.268	122.187.732	0	122.187.732	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE,	474.773.000	76.987.449	83.389.681	0	83.389.681	314.395.870	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION
29	3	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	120.595.791	44.394.875	0	44.394.875	0	RS*	EN EJECUCION
29	5	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	300.275.241	0	220.768.448	0	220.768.448	79.506.793	RS*	EN EJECUCION
33	3-12	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	56.937.000	0	56.937.000	0	56.937.000	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.319.117.907	1.327.451.208	575.335.536	0	575.335.536	393.902.663		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	3-12	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.445.503.573	1.327.451.208	701.721.202	0	701.721.202	393.902.663		
							COMUNA DE PALENA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.053.103.260	518.497.740	146.082.613	372.415.127	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	39.313.000	4.685.000	0	4.685.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA	68.106.000	61.445.781	0	0	0	0	RS*	TERMINO
31	2	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	137.018.700	676.981.300	0	676.981.300	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	659.939.056	593.487.944	676.158	592.811.786	0	RS	EN LICITACION
22	ESTUDIOS	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	30.000.000	0	30.000.000	85.675.000	RS*	EN EJECUCION
33	3-12	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	59.382.785	0	59.382.785	59.382.785	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.940.514.785	2.965.144.797	1.883.034.769	206.141.556	1.676.893.213	85.675.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	3-12	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	118.055.881	0	118.055.881	0	118.055.881	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	118.055.881	0	118.055.881	0	118.055.881	0		
							TOTAL COMUNA DE PALENA	5.058.570.666	2.965.144.797	2.001.090.650	206.141.556	1.794.949.094	85.675.000		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	345.014.741	2.853.996.719	0	2.853.996.719	6.589.079.540	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815	4.990.418.000	4.853.909.931	0	0	0	0	RS*	TERMINO
31	2	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	1.515.694.394	3.923.917.498	1.375.618.568	2.548.298.930	10.860.702.108	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	2.256.940.527	143.059.473	15.402.578	127.656.895	0	IN	EJECUCION (SALDO PROFORMA \$16,
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	1.305.607.737	2.955.021.912	47.727.317	2.907.294.595	24.439.212.351	RS	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.178.665.000	10.277.167.330	9.875.995.602	1.438.748.463	8.437.247.139	41.888.993.999		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	145.108.240	0	145.108.240	280.432.760	SR	PROCESO EXPROPIACION (DA)
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	148.590.000	0	148.590.000	594.360.000	SR	PROCESO EXPROPIACION (DA)
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.168.491.000	0	293.698.240	0	293.698.240	874.792.760		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVAT	584.435.530	0	584.435.530	0	584.435.530	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	584.435.530	0	584.435.530	0	584.435.530	0		
							TOTAL PROVINCIALES	63.931.591.530	10.277.167.330	10.754.129.372	1.438.748.463	9.315.380.909	42.763.786.759		
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	82.518.817.579	23.429.861.024	15.278.156.235	1.731.726.942	13.546.429.293	43.618.256.446		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							REGIONALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
29	4	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habitación Pabellón CMA	387.114.086	176.360.192	0	0	0	210.753.894	RS*	EN EJECUCION
29	5	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habitación Pabellón CMA	668.312.499	627.686.079	0	0	0	40.626.420	RS*	EN EJECUCION
22	ESTU	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	304.792.250	45.207.750	0	45.207.750	0	RS*	EN EJECUCION
29	3	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LA	1.301.999.993	422.270.268	879.729.733	0	879.729.733	-8	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021	2.028.090.000	1.976.635.010	0	0	0	0	RS*	TERMINO
29	3	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION OFICINA MÓVIL IPS-CHILEATIENDE	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	RS*	TERMINO
29	3	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	EN CONVENIO
22	ESTU	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	46.000.000	0	46.000.000	367.944.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.474.460.578	3.557.743.799	970.937.483	0	970.937.483	894.324.306		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO, HUALAIHUÉ Y PALENA, REG. DE LOS LAGOS, 20	613.500.000	0	86.674.000	0	86.674.000	526.826.000	RS*	EN LICITACIÓN
31	2	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADM. REGIONAL, P	1.019.076.000	0	137.105.075	0	137.105.075	881.970.925	RS	EN EJECUCION (OBRAS EN LICITACIO
29	5	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMÁTICA Y DIGITAL REGIÓN POLICIAL LO	539.595.000	0	539.595.000	0	539.595.000	0	RS*	EN LICITACIÓN
29	3	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	531.990.000	0	531.990.000	0	531.990.000	0	RS*	MODIFICACION DE CONVENIO
31	1	L	MULTISECTORIAL	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIOS NORTE y BC NO	206.226.000	0	41.245.200	0	41.245.200	164.980.800	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS	3.350.500.000	0	383.878.464	0	383.878.464	2.966.621.536	RS*	EN LICITACIÓN
31	2	L	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	230.623.597	0	230.623.597	5.253.888.403	RS	EN LICITACIÓN
31	1	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y	241.133.000	0	41.133.000	0	41.133.000	200.000.000	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	11.986.532.000	0	1.992.244.336	0	1.992.244.336	9.994.287.664		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	3.129.543.250	0	3.129.543.250	0	3.129.543.250	0	RS***	
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	3.257.279.710	0	3.257.279.710	2.900.000	3.254.379.710	0	RS***	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.386.822.960	0	6.386.822.960	2.900.000	6.383.922.960	0		
							TOTAL REGIONAL	23.847.815.538	3.557.743.799	9.350.004.779	2.900.000	9.347.104.779	10.888.611.970		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							SOCIAL								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS	130.000.000	123.116.828	6.883.000	0	6.883.000	172	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCIÓN SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	3.999.977	96.000.529	0	96.000.529	99.999.494	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	RSD	II DE MEDIO AMBIENTE	40023036	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A E. CIRCULAR	235.000.000	90.743.334	90.743.000	0	90.743.000	53.513.666	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA PROGRAMA PILOTO DE EFICIENCIA ENERGETICA REGIONAL PARA FAMILIAS VULNERABLES	505.000.000	38.250.000	61.750.000	0	61.750.000	405.000.000	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.070.000.000	256.110.139	255.376.529	0	255.376.529	558.513.332		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	TE A B	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA A BOMBEROS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	ARI 2022
33	110	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	0	2.606.915.000	0	RS**	
33	03	N	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	248.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	200.000.000	RS**	CONSOLIDADA
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.354.915.000	0	5.154.915.000	0	5.154.915.000	200.000.000		
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	6.424.915.000	256.110.139	5.410.291.529	0	5.410.291.529	758.513.332		
							PRODUCTIVO								
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.986.630.403	13.369.000	0	13.369.000	597	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO	2.082.000.000	0	332.169.000	0	332.169.000	1.749.831.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA	699.800.000	0	197.800.000	0	197.800.000	502.000.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	REMI AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	0	295.180.000	0	295.180.000	103.000.000	RS**	EN CONVENIO
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	0	30.800.000	0	30.800.000	469.200.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	77.224.000	0	77.224.000	422.776.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	CENTRO UNIVERSITARIO	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE LA PESCA, REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	CENTRO UNIVERSITARIO	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO	250.000.000	248.000.000	1.693.000	0	1.693.000	307.000	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN DE ALGAS PELILLO	250.000.000	240.430.000	9.570.000	0	9.570.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUO	50.000.000	49.200.000	800.000	0	800.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	154.594.750	76.824.000	0	76.824.000	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	8.761.398.750	3.728.855.153	1.785.429.000	0	1.785.429.000	3.247.114.597		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FOSIS	40019469	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES JEFAS DE HOGAR, RE	150.000.000	143.172.000	6.828.000	0	6.828.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	SEREMI VIVIENDA	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENE	1.300.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	1.020.000.000	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.450.000.000	143.172.000	286.828.000	0	286.828.000	1.020.000.000		
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	UDEA-SERNATU	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.000.000.000	216.981.428	0	0	0	783.018.572	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	UDEA-SERNATU	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINO
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	716.981.428	0	0	0	783.018.572		
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	185.098.276	15.787.000	0	15.787.000	2.114.724	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA.	190.000.000	189.316.581	684.000	0	684.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30341175	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV	600.000.000	297.895.387	202.105.000	0	202.105.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	7.632.000	0	7.632.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30341173	CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP	450.000.000	344.207.260	105.793.000	0	105.793.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	429.632.948	100.367.000	0	100.367.000	52	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL PATAGONIA VERDE	2.288.000.000	1.753.518.259	432.368.000	0	432.368.000	2.114.776		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE								
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	78.141.839	124.258.000	0	124.258.000	161	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE	764.464.240	507.331.218	257.095.000	0	257.095.000	38.022	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	30433775	RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO	500.000.192	499.888.033	87.000	0	87.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	497.749.364	23.250.000	0	23.250.000	41.528.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	259.676.893	140.323.000	0	140.323.000	107	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	MI DE AGRICULT	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	250.000.000	500.000.000	0	500.000.000	1.506.500.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	II DE MEDIO AME	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	537.847.093	49.881.000	0	49.881.000	37.100.664	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	II DE MEDIO AME	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN C	2.212.769.231	339.540.827	306.428.000	0	306.428.000	1.566.800.404	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	25.051.000	0	25.051.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	30440729	TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	326.826.504	308.425.504	18.401.000	0	18.401.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	MI DE AGRICULT	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	185.000.000	0	185.000.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SERNAPESCA	30343724	TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL	1.260.000.000	1.228.590.737	41.777.000	0	41.777.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	PESCA	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS	900.000.000	687.565.057	212.435.000	0	212.435.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	51.125.000	0	51.125.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	ON NACIONAL DE	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.724.044.816	0	0	0	0	RS**	TERMINO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	172.830.000	0	0	0	18.787.250	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DE BIENES NACH	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	522.170.621	457.822.000	0	457.822.000	220.007.379	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO	230.000.000	229.975.368	0	0	0	0	RS**	TERMINO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO	233.158.000	230.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINO
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA	327.800.000	311.052.564	16.747.000	0	16.747.000	436	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	MI DE AGRICULT	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	9.423.000	313.377.000	0	313.377.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	DMISION DE RIEG	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LA	2.040.000.000	4.600.000	450.000.000	0	450.000.000	1.585.400.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SALUD	LIBRE	RV. SALUD OSOR	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de	200.000.000	153.594.235	46.399.000	0	46.399.000	6.765	RS**	EN EJECUCION
33	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILL	14.980.000.000	3.440.739	600.000.000	0	600.000.000	14.376.559.261	RS**	EN EJECUCION
							PROGRAMAS DE ARRASTRE	33.479.170.049	10.038.190.491	3.819.456.000	0	3.819.456.000	19.352.728.449		
							PROGRAMAS NUEVOS								
33	03	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40026513	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN INCENDIO MERCADO MUNICI	49.960.000	0	49.960.000	0	49.960.000	0	RS**	TERMINO (RECILIACION)
33	03	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde cono Destino de Turismo Aventura	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	RS**	ARI 2022
33	03-999	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.646.681.000	0	1.646.681.000	0	1.646.681.000	0	RS**	
							TOTAL PROGRAMAS NUEVOS	1.796.641.000	0	1.796.641.000	0	1.796.641.000	0		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
PROGRAMAS FET															
30	10	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL	359.099.000	30.000.000	179.549.500	0	179.549.500	149.549.500	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS IN	800.000.000	614.901.191	185.098.809	0	185.098.809	0	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA AGRUPACIONES VULNERABLES	500.000.000	496.442.000	3.558.000	0	3.558.000	0	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN D	1.286.000.000	506.999.608	299.319.500	0	299.319.500	479.680.892	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	396.558.000	399.913.142	0	399.913.142	503.528.858	RS**	EN EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS FET								4.245.099.000	2.044.900.799	1.067.438.951	0	1.067.438.951	1.132.759.250		
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								53.520.308.799	18.425.618.130	9.188.160.951	0	9.188.160.951	25.537.735.644		
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								59.945.223.799	18.681.728.269	14.598.452.480	0	14.598.452.480	26.296.248.976		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 02 2021								410.060.481.283	140.584.456.997	91.197.796.903	6.076.001.411	85.121.795.492	175.360.633.729		

RATE

RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE

RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33

RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA

RS***=RECOMENDACION POR SUBSIDIO

RE=REEVALUACION

IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
