




GOBIERNO  
REGIONAL DE  
LOS LAGOS  
*Acción de Futuro*

## ESTADO SITUACION FNDR 02 - JUNIO 2021




## Marco Decretado FNDR 2021 al 30 Junio

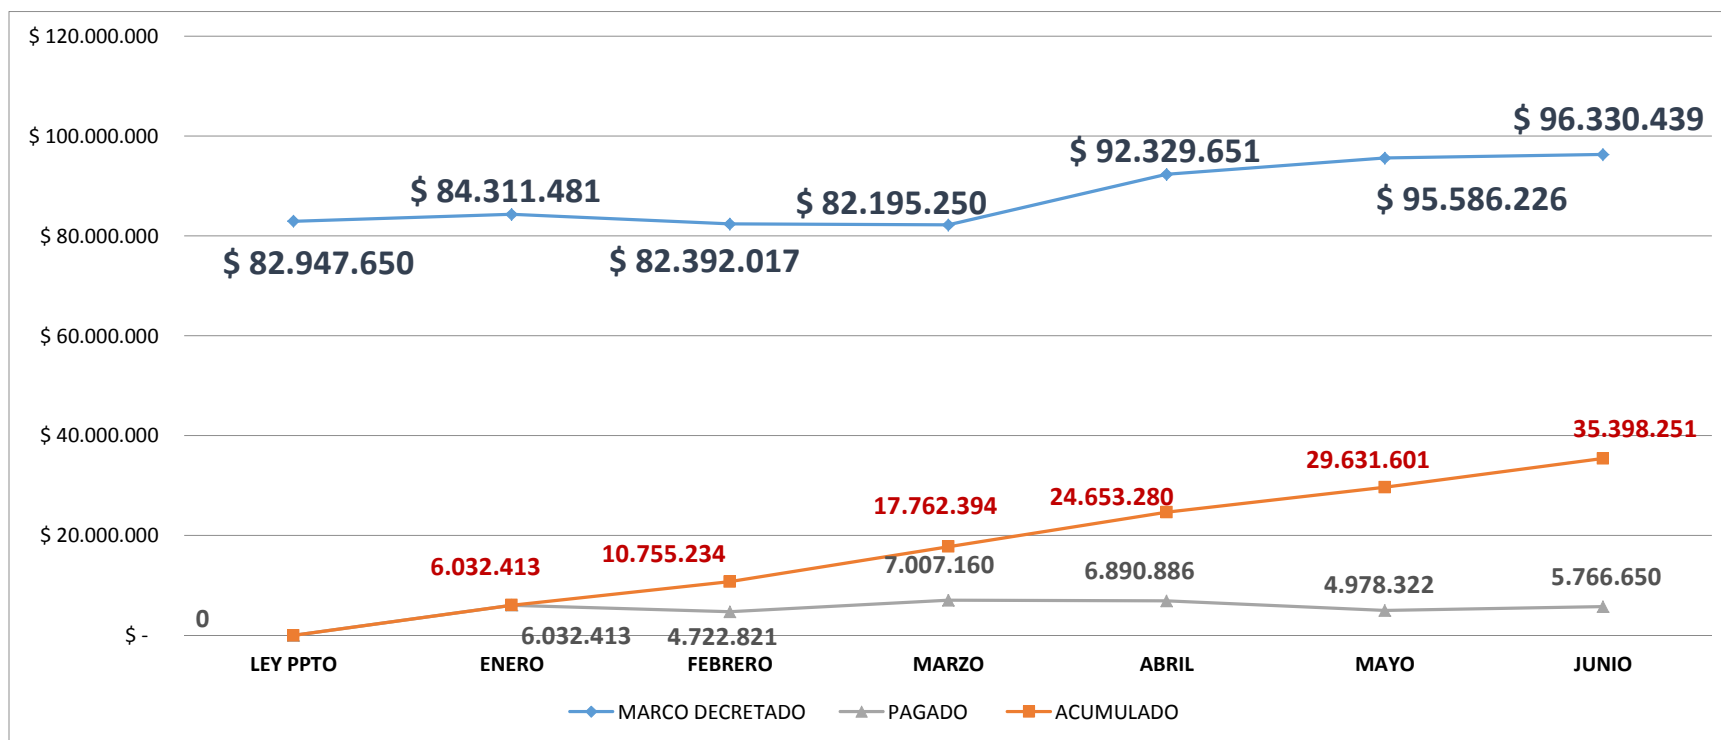




## Eficiencia Presupuestaria FNDR al 30 Junio 2021 – %

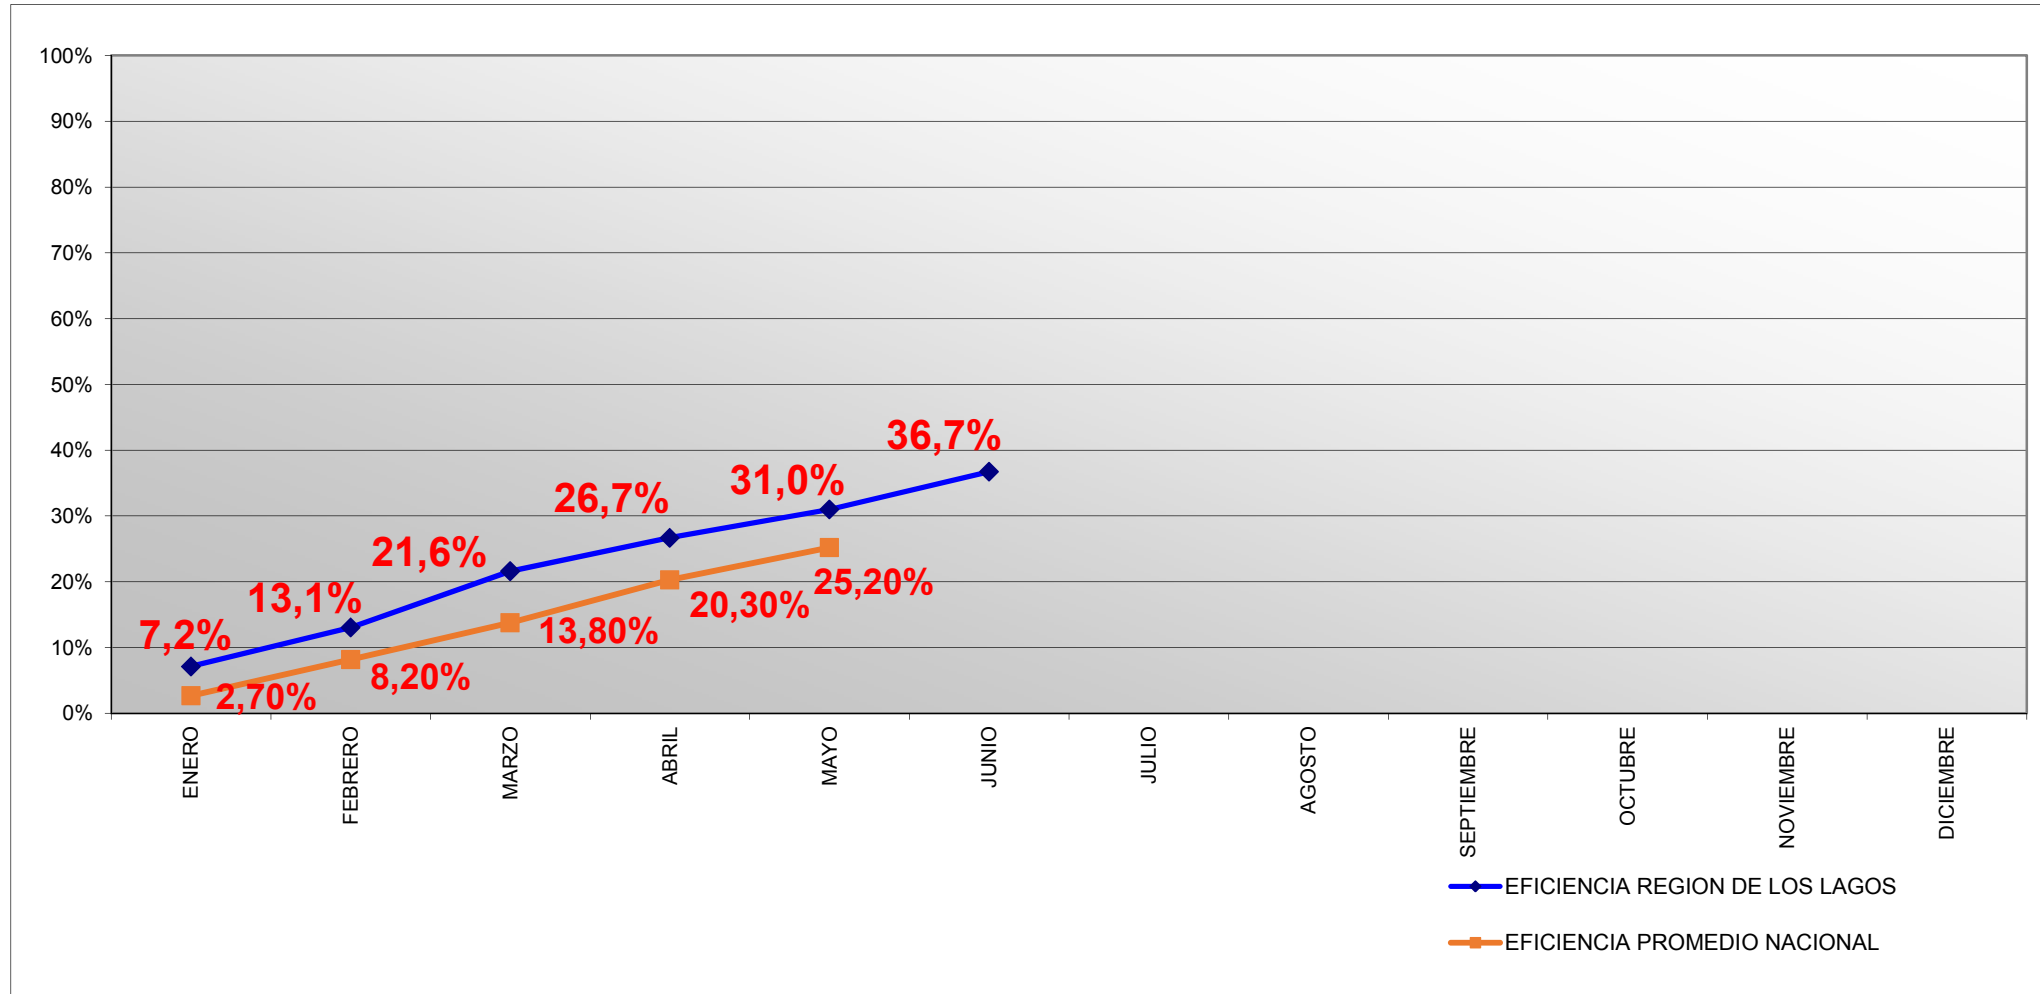



## Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR al 30 de Junio 2021 – %

COSTO TOTAL			FNDR 2021						
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO	97.887.296.673	22%	33.823.234.849	11.274.918.098	12%	9.189.738.932	2.085.179.166	81,51%	52.789.143.726
LLANQUIHUE	113.585.083.699	25%	31.439.080.055	17.792.688.135	19%	10.732.454.588	7.060.233.547	60,32%	64.353.315.509
CHILOE	57.777.200.805	13%	16.076.600.624	13.063.500.060	14%	7.355.326.499	5.708.173.561	56,30%	28.637.100.121
PALENA	84.478.625.778	19%	16.995.888.404	18.355.843.737	20%	3.389.654.081	14.966.189.656	18,47%	49.126.893.637
REGIONAL	38.306.082.435	9%	6.940.379.861	18.063.568.075	20%	2.679.451.629	15.384.116.446	14,83%	13.302.134.499
FOMENTO	57.823.788.209	13%	17.181.789.987	13.371.234.000	15%	2.051.625.062	11.111.584.938	15,34%	27.478.788.222
TOTAL	449.858.077.599	100%	122.456.973.780	91.921.752.105	100%	35.398.250.791	56.315.477.314		235.687.375.714

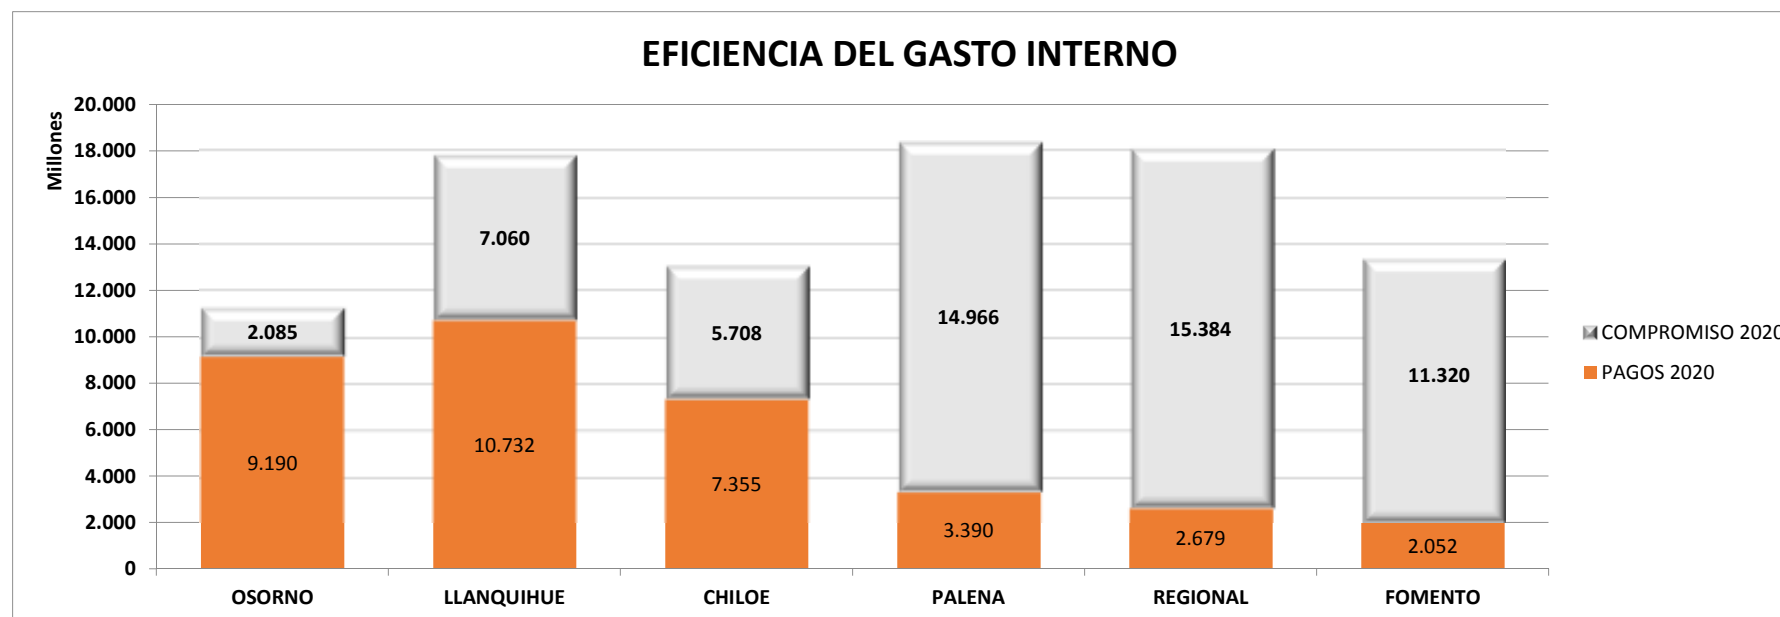






## Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno Gasto FNDR al 30 de Junio 2021 – %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO	14	39.120.989.367	40%	14.004.908.464	2.439.979.226	22%	2.216.214.347	223.764.879	90,83%	22.676.101.677
OSORNO	14	29.217.264.000	30%	9.800.562.401	3.843.951.026	34%	3.426.888.255	417.062.771	89,15%	15.572.750.573
PTO. OCTAY	5	2.352.557.112	2%	1.072.531.447	934.559.970	8%	887.492.153	47.067.817	94,96%	345.465.695
PURRANQUE	14	9.163.624.432	9%	1.428.139.679	994.608.318	9%	442.511.449	552.096.869	44,49%	6.740.876.435
PUYEHUE	8	4.513.631.993	5%	3.093.489.670	602.922.561	5%	252.842.173	350.080.388	41,94%	817.219.762
RIO NEGRO	8	2.741.105.769	3%	1.180.324.687	390.905.334	3%	129.933.141	260.972.193	33,24%	1.169.875.748
SAN JUAN DE LA COSTA	4	7.138.651.000	7%	3.231.549.001	271.707.628	2%	159.924.377	111.783.251	58,86%	3.635.394.371
SAN PABLO	3	3.639.473.000	4%	11.729.500	1.796.284.035	16%	1.673.933.037	122.350.998	93,19%	1.831.459.465
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>97.887.296.673</b>	<b>100%</b>	<b>33.823.234.849</b>	<b>11.274.918.098</b>	<b>100%</b>	<b>9.189.738.932</b>	<b>2.085.179.166</b>	<b>81,51%</b>	<b>52.789.143.726</b>

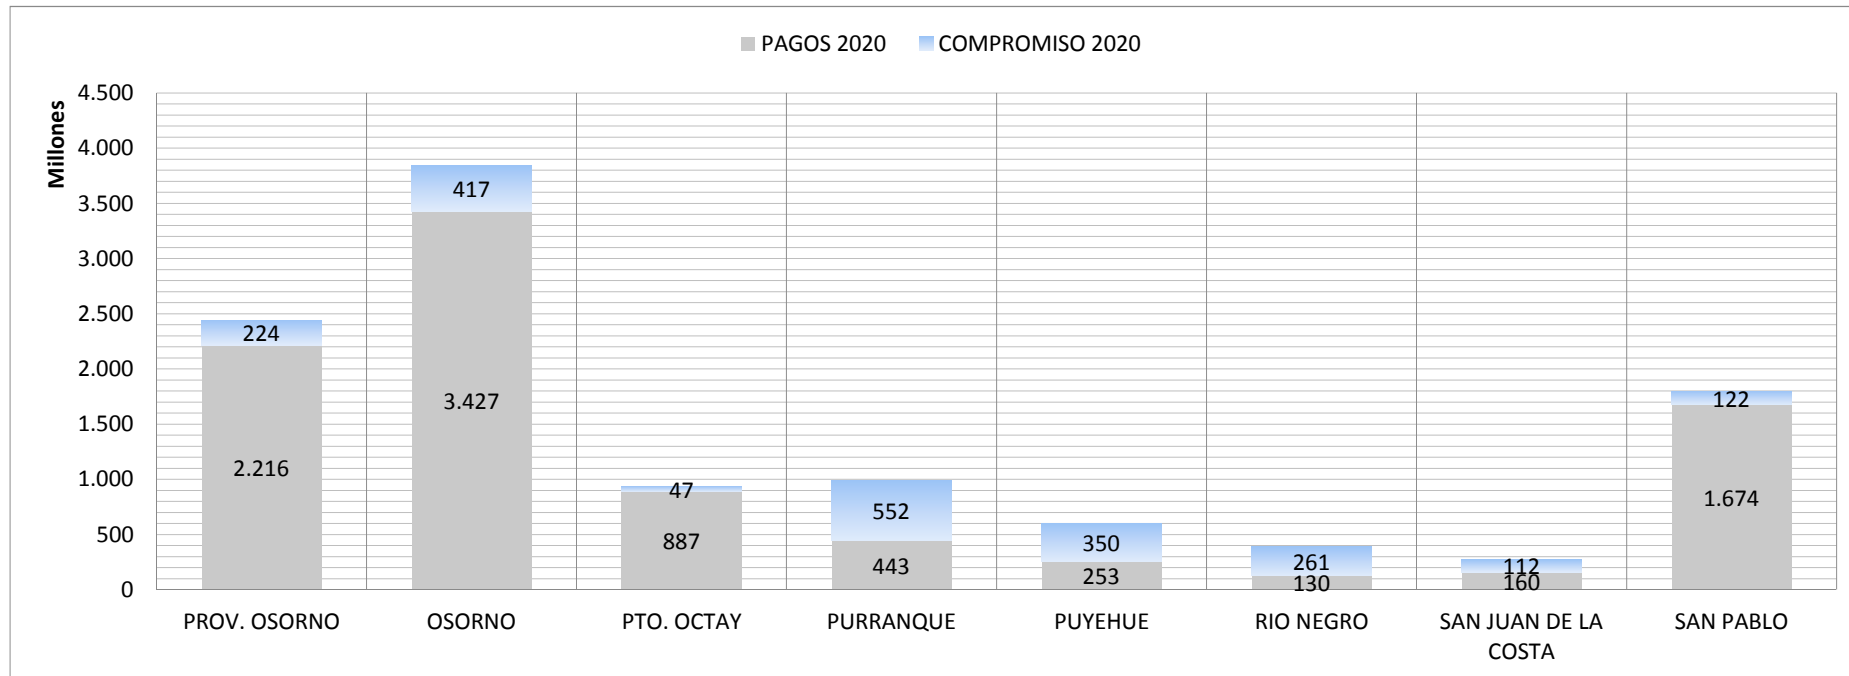



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue Gasto FNDR al 30 de Junio – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE	13	30.119.554.956	27%	15.258.816.406	3.822.743.838	22%	1.955.377.939	1.867.365.899	51,15%	11.037.994.712
CALBUCO	11	16.302.701.892	14%	1.600.876.324	1.961.004.446	11%	1.177.897.356	783.107.090	60,07%	12.740.821.122
COCHAMO	10	4.971.216.098	4%	57.997.400	1.609.640.000	9%	286.985.004	1.322.654.996	17,83%	3.303.578.698
FRESIA	10	6.471.606.495	6%	1.870.326.590	545.130.598	3%	358.840.476	186.290.122	65,83%	4.056.149.307
FRUTILLAR	10	10.260.280.391	9%	2.316.853.351	4.169.691.937	24%	3.703.019.379	466.672.558	88,81%	3.773.735.103
LLANQUIHUE	6	5.885.343.768	5%	3.828.816.269	327.054.368	2%	24.300.441	302.753.927	7,43%	1.729.473.131
LOS MUERMOS	12	4.289.163.010	4%	1.159.386.907	1.030.880.751	6%	767.932.903	262.947.848	74,49%	2.098.895.352
MAULLIN	7	2.946.824.961	3%	259.031.774	672.523.563	4%	342.278.163	330.245.400	50,89%	2.015.269.624
P. MONTT	13	20.210.194.534	18%	608.863.534	2.523.704.049	14%	1.364.252.852	1.159.451.197	54,06%	17.077.626.951
P.VARAS	14	11.041.927.594	10%	4.478.111.500	1.077.314.585	6%	751.570.075	325.744.510	69,76%	5.486.501.509
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>112.498.813.699</b>	<b>100%</b>	<b>31.439.080.055</b>	<b>17.739.688.135</b>	<b>100%</b>	<b>10.732.454.588</b>	<b>7.007.233.547</b>	<b>60,50%</b>	<b>63.320.045.509</b>

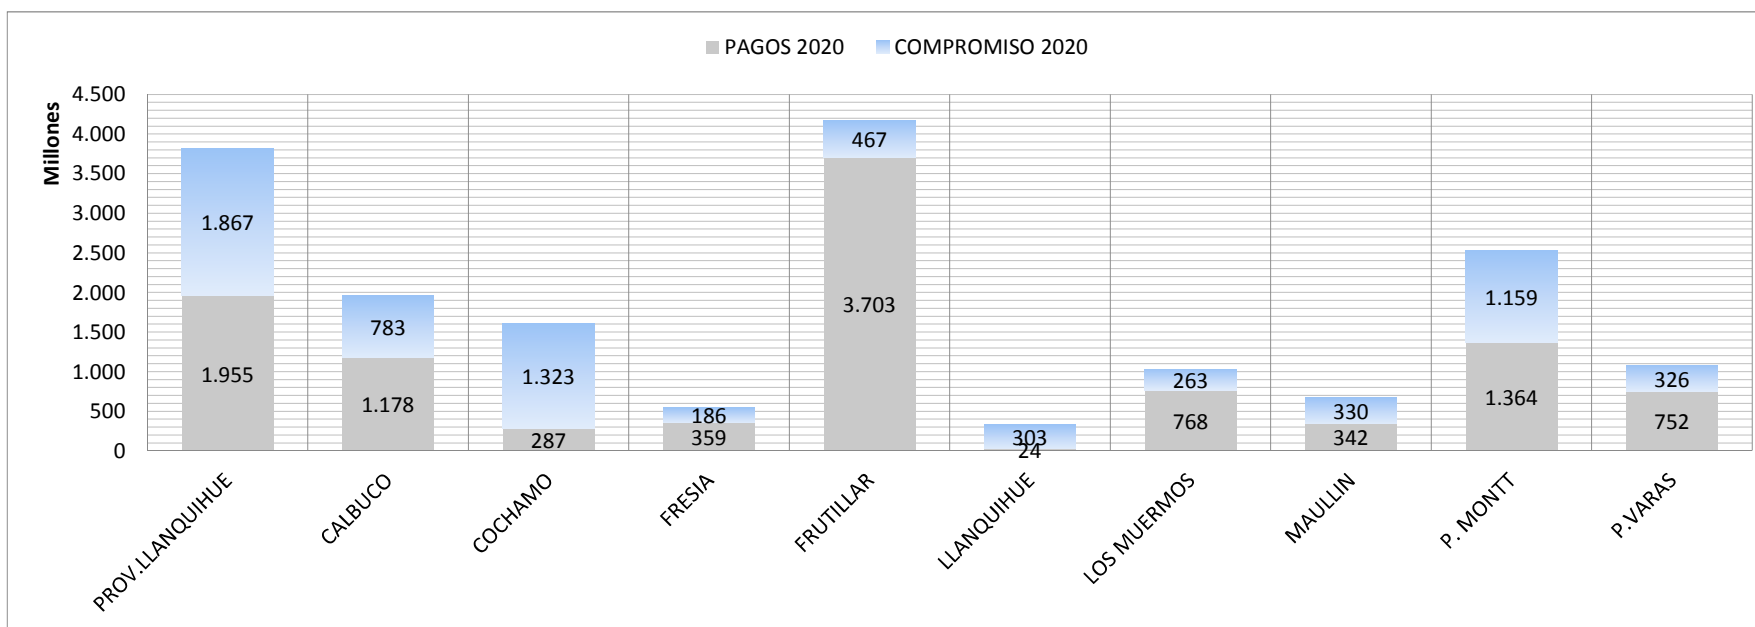




## Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

### Gasto FNDR al 30 de Junio 2021 – %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE	4	9.297.587.800	16%	1.407.928.844	1.236.212.401	9%	14.847.608	1.221.364.793	1,20%	6.653.446.555
ANCUD	12	5.806.366.499	10%	1.055.727.100	1.976.094.123	15%	1.778.087.923	198.006.200	89,98%	2.774.545.276
CASTRO	12	7.632.540.000	13%	1.783.569.456	3.404.750.408	26%	2.457.156.911	947.593.497	72,17%	2.444.220.136
CHONCHI	12	6.553.872.684	11%	2.025.665.892	697.409.018	5%	312.675.046	384.733.972	44,83%	3.830.797.774
CURACO DE VÉLEZ	3	2.327.715.000	4%	650.412.984	345.728.027	3%	216.771.605	128.956.422	62,70%	1.331.573.989
DALCAHUE	10	3.670.783.680	6%	607.997.656	1.307.570.149	10%	939.560.840	368.009.309	71,86%	1.755.215.875
PUQUELDON	4	5.130.120.337	9%	3.282.614.899	243.264.387	2%	197.460.470	45.803.917	81,17%	1.604.241.051
QUEILEN	6	3.367.906.000	6%	771.466.530	594.648.373	5%	582.484.897	12.163.476	97,95%	2.001.791.097
QUELLON	12	7.606.828.000	13%	2.391.277.130	1.505.564.609	12%	433.989.004	1.071.575.605	28,83%	3.709.986.261
QUEMCHI	10	4.669.483.805	8%	1.959.994.133	1.263.817.958	10%	241.614.771	1.022.203.187	19,12%	1.445.671.714
QUINCHAO	5	1.713.997.000	3%	139.946.000	488.440.607	4%	180.677.424	307.763.183	36,99%	1.085.610.393
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>57.777.200.805</b>	<b>100%</b>	<b>16.076.600.624</b>	<b>13.063.500.060</b>	<b>100%</b>	<b>7.355.326.499</b>	<b>5.708.173.561</b>	<b>56,30%</b>	<b>28.637.100.121</b>

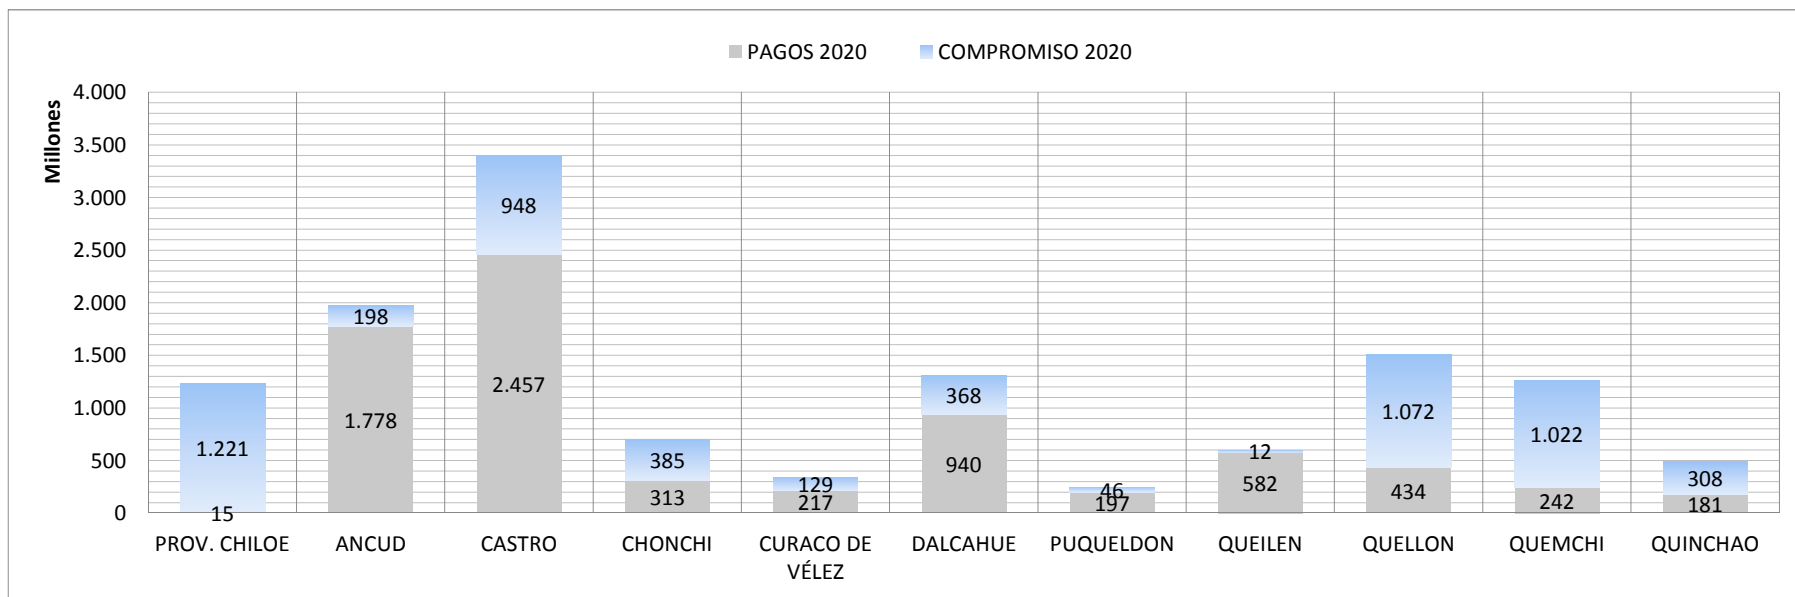



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR al 30 de Junio 2021 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					SALDO AÑOS FUTURO
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	
PROV. PALENA	12	64.264.883.668	76%	6.465.230.954	12.917.255.661	70%	1.396.406.823	11.520.848.838	10,81%	44.882.397.053
CHAITEN	4	1.423.184.320	2%	95.407.000	627.632.200	3%	395.145.560	232.486.640	62,96%	700.145.120
FUTALEUFU	10	9.372.746.047	11%	8.099.592.373	1.086.379.090	6%	234.849.304	851.529.786	21,62%	186.774.584
HUALAIHUE	11	3.202.264.907	4%	1.127.483.773	948.963.831	5%	83.793.012	865.170.819	8,83%	1.125.817.303
PALENA	9	6.215.546.836	7%	1.208.174.304	2.775.612.955	15%	1.279.459.382	1.496.153.573	46,10%	2.231.759.577
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>84.478.625.778</b>	<b>100%</b>	<b>16.995.888.404</b>	<b>18.355.843.737</b>	<b>100%</b>	<b>3.389.654.081</b>	<b>14.966.189.656</b>	<b>18,47%</b>	<b>49.126.893.637</b>

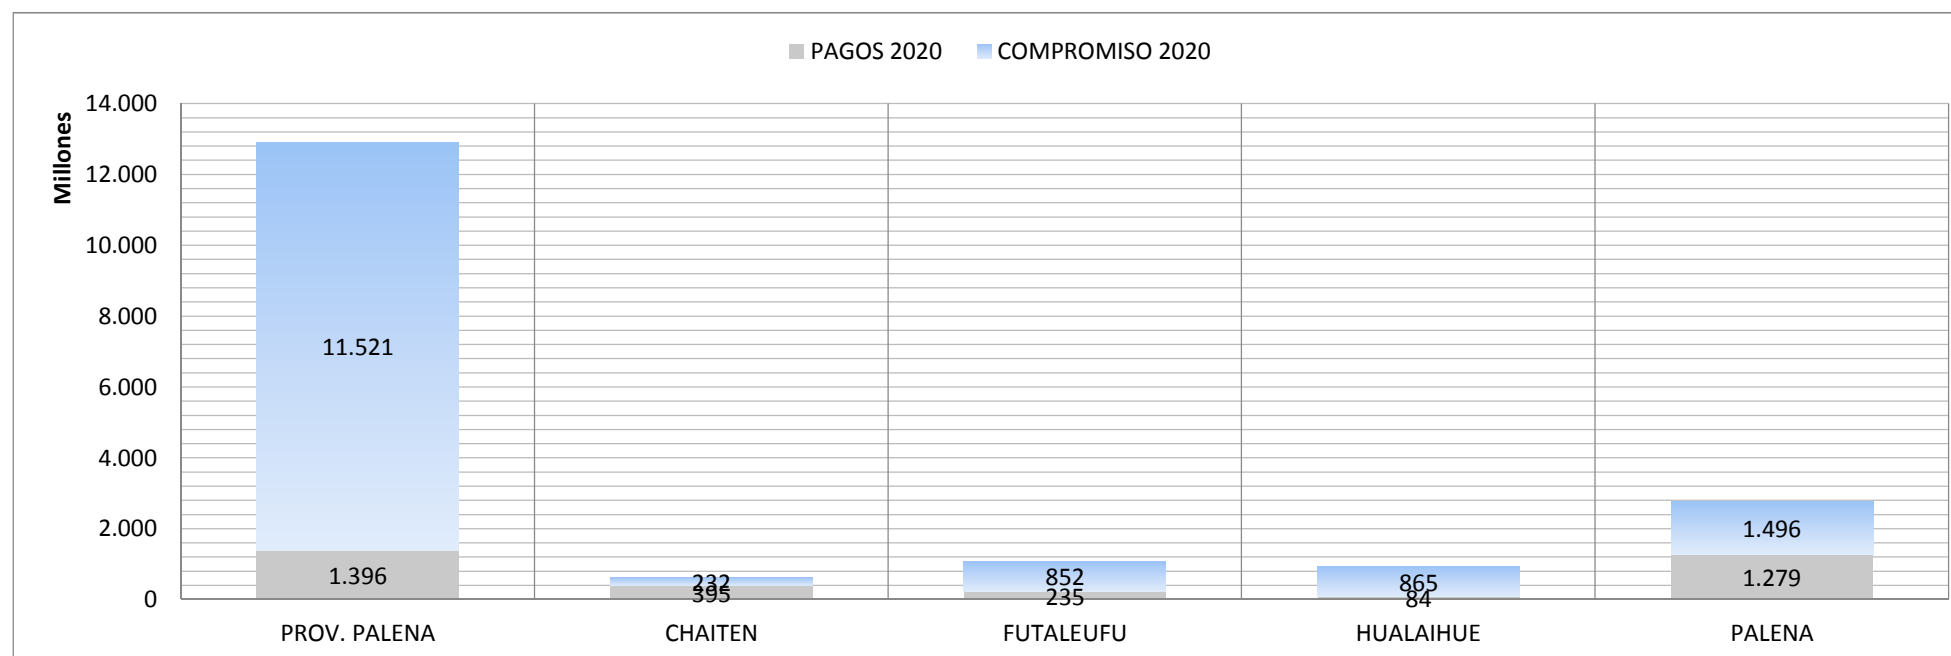






## Eficiencia Presupuestaria Por Provision Gasto FNDR al 30 de Junio 2021 – %


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2021				
PROVISIÓN	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
LIBRE	58.297.360.000	54.478.702.402	59,27%	-3.818.657.598
PV	15.253.396.000	15.253.396.000	16,59%	0
FRIL	7.219.742.000	7.219.742.000	7,85%	0
ENERGIZACION	5.587.120.000	5.587.120.000	6,08%	0
FIE	511.250.000	511.250.000	0,56%	0
RSD	1.377.065.000	1.377.065.000	1,50%	0
FIC	1.577.281.000	1.577.281.000	1,72%	0
PIR	1.224.452.000	1.224.452.000	1,33%	0
SS	1.151.883.000	611.853.703	0,67%	-540.029.297
FDL	900.546.000	850.546.000	0,93%	-50.000.000
FAR	2.606.915.000	2.606.915.000	2,84%	0
PVP	623.429.000	623.429.000	0,68%	0
<b>TOTAL</b>	<b>96.330.439.000</b>	<b>91.921.752.105</b>	<b>100%</b>	<b>-4.408.686.895</b>

COMPROMISO V/S PAGOS 2021			
COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	% DIST. DE LOS PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
54.478.702.402	25.887.736.679	73,13%	28.587.941.723
15.253.396.000	1.505.774.544	4,25%	13.747.621.456
7.219.742.000	4.432.676.989	12,52%	2.787.065.011
5.587.120.000	1.953.257.371	5,52%	3.633.862.629
511.250.000	215.790.522	0,61%	295.459.478
1.377.065.000	554.191.401	1,57%	617.873.599
1.577.281.000	0	0,00%	1.577.281.000
1.224.452.000	86.096.187	0,24%	1.138.355.813
611.853.703	277.830.573	0,78%	334.023.130
850.546.000	295.296.525	0,83%	555.249.475
2.606.915.000	189.600.000	0,54%	2.417.315.000
623.429.000	0	0,00%	623.429.000
<b>91.921.752.105</b>	<b>35.398.250.791</b>	<b>100%</b>	<b>56.315.477.314</b>

Marco Decretado Versus Compromiso

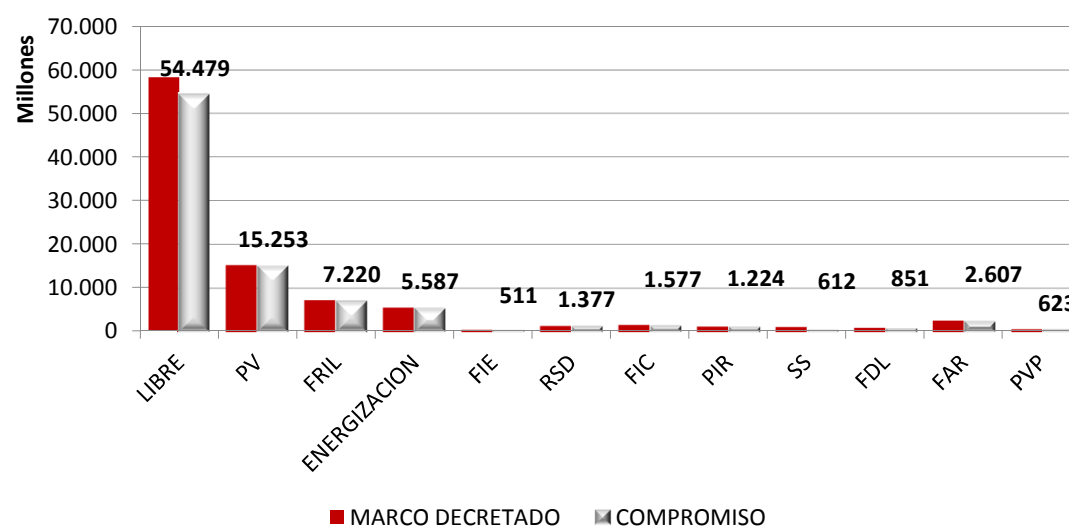


Compromiso Versus Pagos 2021

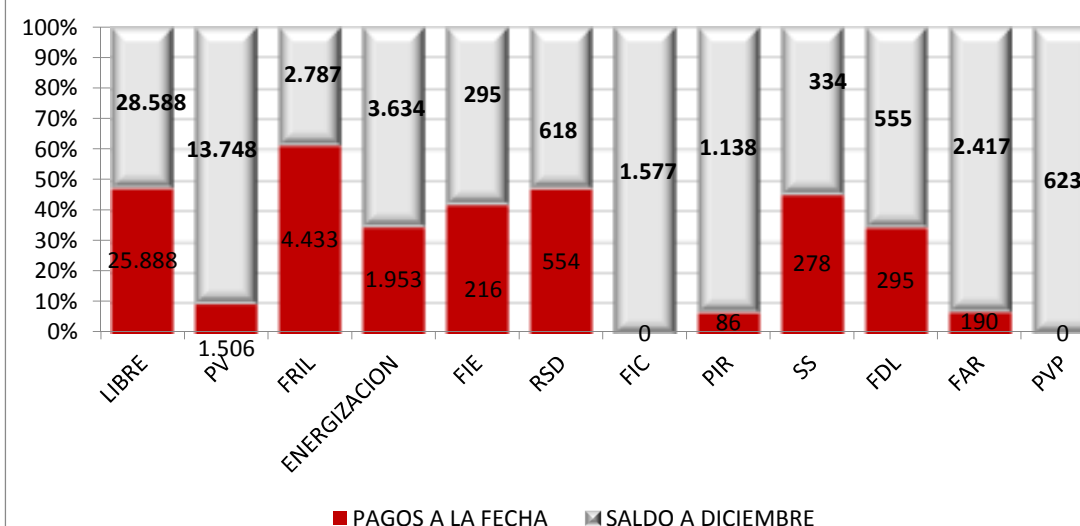

## Eficiencia Presupuestaria Por Sector

### Gasto FNDR al 30 de Junio 2021 – %


SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
	COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO AÑOS FUTUROS
TRANSPORTE	101.638.927.829	22,59%	32.779.562.516	18.163.868.146	20%	5.272.905.635	12.890.962.511	50.695.497.167
VIVIENDA	45.941.141.125	10,21%	5.120.122.106	8.933.647.066	10%	6.637.667.270	2.295.979.796	31.887.371.953
EDUCACION Y CULTURA	72.949.905.906	16,22%	23.251.568.374	9.442.483.381	10%	7.358.682.641	2.083.800.740	40.255.854.151
SALUD	56.218.507.031	12,50%	11.454.493.865	8.330.772.449	9%	1.343.897.154	6.986.875.295	36.433.240.717
MULTISECTORIAL	66.990.446.076	14,89%	13.597.424.621	19.139.917.710	21%	6.059.344.734	13.080.572.976	34.253.103.745
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18.346.455.999	4,08%	4.602.859.067	3.707.846.714	4%	1.954.802.342	1.753.044.372	10.035.750.218
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.328.177.361	5,85%	7.334.863.234	7.270.570.953	8%	1.352.933.865	5.917.637.088	11.722.743.174
JUSTICIA	76.160.000	0,02%	0	31.160.000	0%	7.497.000	23.663.000	45.000.000
DEPORTE	19.770.261.095	4,39%	8.599.013.899	1.772.573.394	2%	1.044.080.106	728.493.288	9.398.673.802
SILVOAGROPECUARIO	16.747.171.221	3,72%	6.870.299.401	2.824.792.000	3%	200.262.127	2.624.529.873	7.052.079.820
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TU	14.899.675.956	3,31%	7.326.100.540	6.199.321.132	7%	1.812.920.546	4.178.376.586	1.582.278.284
ENERGIA	7.153.448.000	1,59%	0	5.637.299.160	6%	1.953.257.371	3.684.041.789	1.516.148.840
PESCA	2.797.800.000	0,62%	1.520.666.157	467.500.000	1%	400.000.000	67.500.000	809.633.843
<b>TOTAL</b>	<b>449.858.077.599</b>	<b>100%</b>	<b>122.456.973.780</b>	<b>91.921.752.105</b>	<b>100%</b>	<b>35.398.250.791</b>	<b>56.315.477.314</b>	<b>235.687.375.714</b>

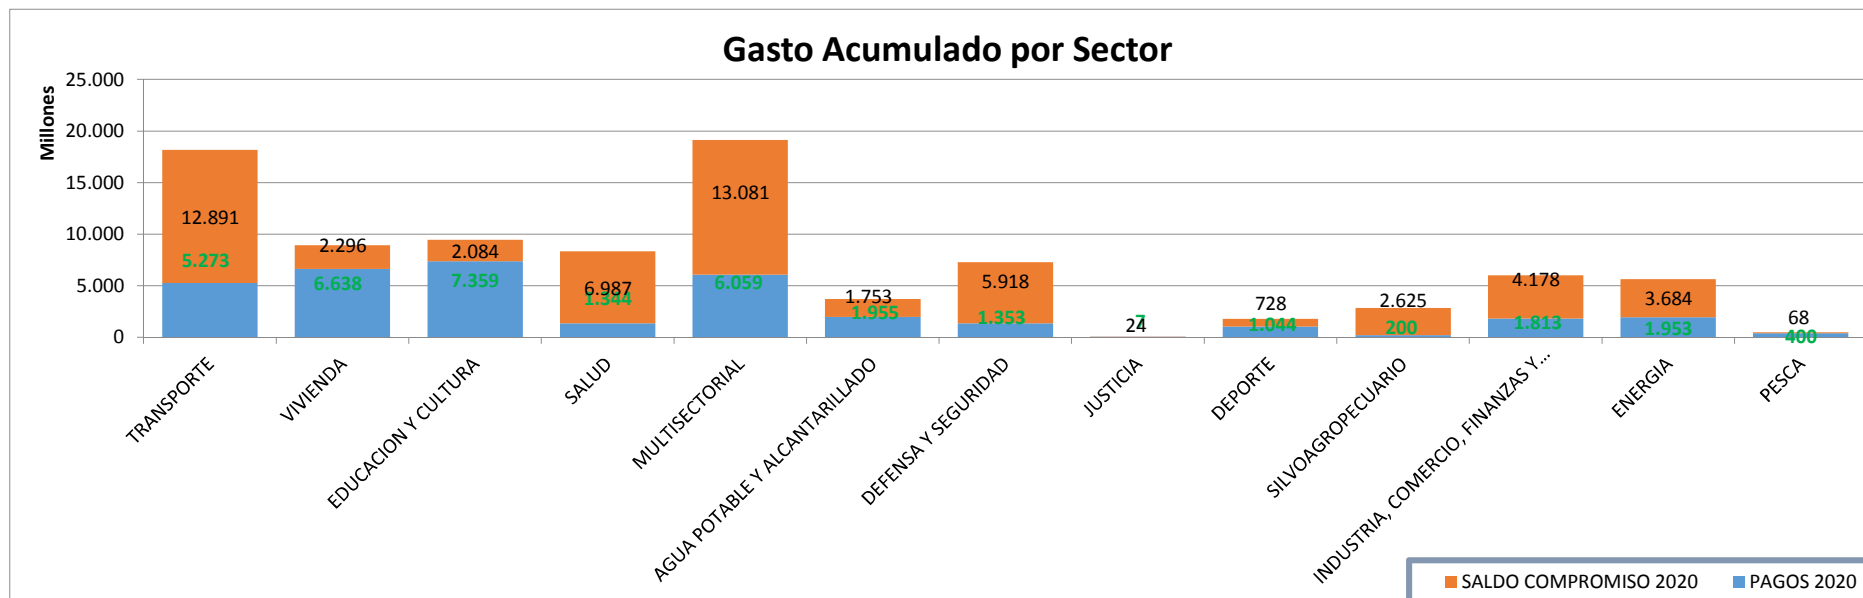



## Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR al 30 de Junio 2021 – %

COSTO TOTAL			FNDR 2021						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO PROXIMOS AÑOS
22	1.450.002.000	0%	123.900.000	803.045.000	545.000.000	0,59%	123.452.000	421.548.000	781.102.000
24	8.913.110.000	2%	0	8.756.777.000	8.913.110.000	9,70%	1.478.314.641	7.434.795.359	0
29	13.544.574.736	3%	1.133.986.341	6.738.362.000	6.681.643.033	7,27%	417.986.932	6.263.656.101	5.728.945.362
30	4.493.099.000	1%	0	0	2.044.902.000	2,22%	0	2.044.902.000	2.448.197.000
31	355.202.464.970	79%	103.517.329.705	60.203.757.000	50.067.716.369	54,47%	26.688.203.464	23.379.512.905	201.617.418.896
33	66.254.826.893	15%	17.681.757.734	19.828.498.000	23.669.380.703	25,75%	6.690.293.754	16.771.062.949	25.111.712.456
TOTAL	449.858.077.599	100%	122.456.973.780	96.330.439.000	91.921.752.105	100%	35.398.250.791	56.315.477.314	235.687.375.714

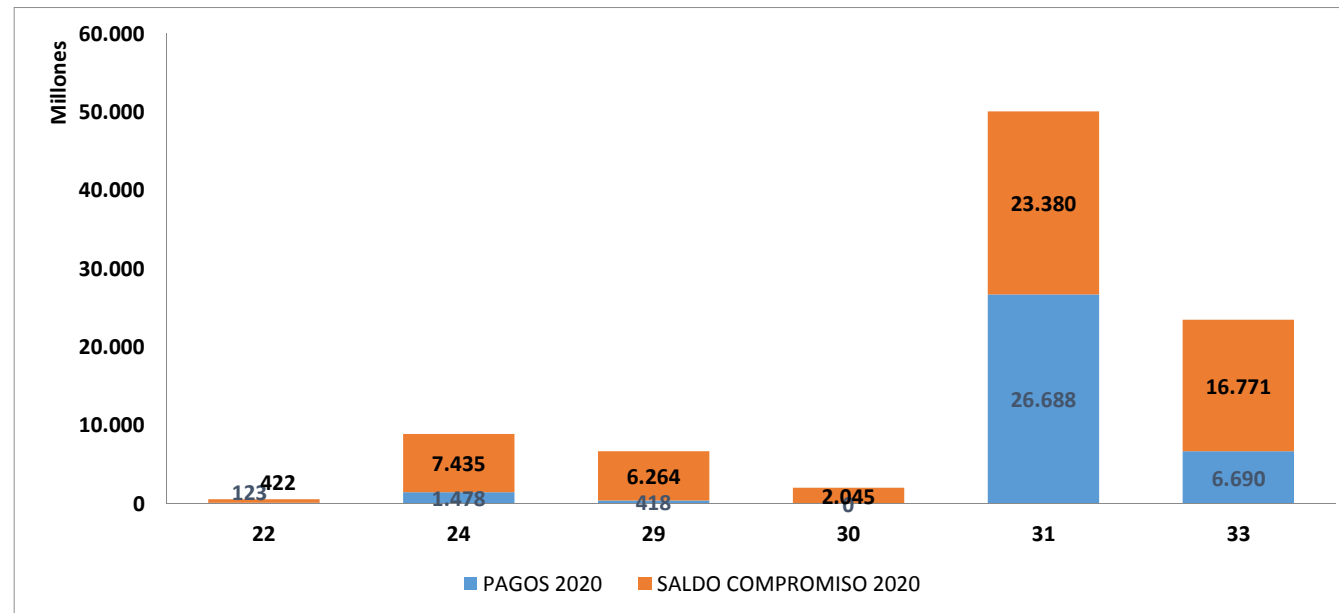

NOTA PARA CONTROL DE FONDOS DEL SUBTITULO 30 SE CREO PROGRAMA 50

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA	7.805.646.000	6.570.711.562	73.841.603	0	73.841.603	1.161.092.835	RE	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33)	820.000.000	704.106.657	115.893.343	38.309.250	77.584.093	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.370.081.000	1.245.597.880	1.356.240.510	1.356.240.510	0	4.768.242.610	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.295.526.000	1.000.146.478	1.075.065.757	976.465.757	98.600.000	1.220.313.765	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	232.520.067	372.133.135	372.133.135	0	522.387.798	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	76.160.000	0	31.160.000	7.497.000	23.663.000	45.000.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	0	519.616.678	519.616.678	0	3.624.569.322	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	156.625.925	43.374.075	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						24.838.640.000	9.753.082.644	3.743.951.026	3.426.888.255	317.062.771	11.341.606.330			
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. MOYANO, OSORNO	167.403.000	0	10.000.000	0	10.000.000	157.403.000	RS	En Licitacion
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	988.704.000	0	10.000.000	0	10.000.000	978.704.000	RS	En Licitacion
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	10.000.000	0	10.000.000	504.920.243	RS	En Licitacion / Liquidación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO, COMUNA DE OSORNO	650.792.000	0	10.000.000	0	10.000.000	640.792.000	RS	Modificación de Convenio
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION						2.369.299.000	47.479.757	40.000.000	0	0	40.000.000	2.281.819.243		
INICIATIVAS NUEVAS														
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR NORTE, OSORNO	1.815.521.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1.805.521.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	50.000.000	0	50.000.000	143.804.000	RS	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						2.009.325.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	1.949.325.000		
TOTAL COMUNA DE OSORNO						29.217.264.000	9.800.562.401	3.843.951.026	3.426.888.255	417.062.771	15.572.750.573			
COMUNA DE PUERTO OCTAY														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO	19.780.000	7.512.000	12.268.000	0	12.268.000	0	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30478036	REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY	1.264.238.764	987.598.930	276.639.834	257.408.443	19.231.391	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40013401	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	460.788.000	77.420.517	375.608.788	360.040.362	15.568.426	7.758.695	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	270.043.348	0	270.043.348	270.043.348	0	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						2.014.850.112	1.072.531.447	934.559.970	887.492.153	47.067.817	7.758.695			
INICIATIVAS NUEVAS														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	RS*	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						337.707.000	0	0	0	0	0	337.707.000		
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY						2.352.557.112	1.072.531.447	934.559.970	887.492.153	47.067.817	345.465.695			

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134930	CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE	1.004.973.000	917.630.386	74.552.614	74.552.614	0	12.790.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	16.859.700	16.219.730	639.970	0	639.970	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	17.806.000	0	17.806.000	2.724.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	7.800.000	11.700.000	0	11.700.000	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	481.879.563	18.059.437	7.512.262	10.547.175	30.000.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	500.000.000	0	182.877.004	182.877.004	0	317.122.996	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	177.569.569	22.430.431	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.296.411.700	1.428.139.679	505.635.025	442.511.449	63.123.576	362.636.996		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR (C33)	694.291.000	0	75.000.000	0	75.000.000	619.291.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO (C33)	625.991.000	0	50.738.815	0	50.738.815	575.252.185	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE (C33)	516.681.732	0	250.000.000	0	250.000.000	266.681.732	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016563	REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA PURRANQUE (C33)	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.915.963.732	0	454.738.815	0	454.738.815	1.461.224.917		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	14.234.478	0	14.234.478	683.724.522	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013127	ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO GESTION DE TRANSITO PURRANQUE Y CORTE ALTO	135.500.000	0	10.000.000	0	10.000.000	125.500.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	10.000.000	0	10.000.000	4.107.790.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.951.249.000	0	34.234.478	0	34.234.478	4.917.014.522		
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.163.624.432	1.428.139.679	994.608.318	442.511.449	552.096.869	6.740.876.435		
						COMUNA DE PUYEHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30067012	REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS	3.101.704.930	3.077.979.670	23.725.260	0	23.725.260	0	RS(IN)	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40007052	REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE	26.527.000	15.510.000	11.017.000	1.441.000	9.576.000	0	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	260.000.000	0	260.000.000	251.401.173	8.598.827	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.388.231.930	3.093.489.670	294.742.260	252.842.173	41.900.087	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE(C33)	378.086.000	0	85.229.349	0	85.229.349	292.856.651	RS*	Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	276.551.379	0	68.111.268	0	68.111.268	208.440.111	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	19.839.684	0	19.839.684	0	19.839.684	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS (C33)	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	RS*	En Licitación
	31	N	SS	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	365.923.000	0	50.000.000	0	50.000.000	315.923.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.125.400.063	0	308.180.301	0	308.180.301	817.219.762		
						TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	4.513.631.993	3.093.489.670	602.922.561	252.842.173	350.080.388	817.219.762		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE RIO NEGRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30284622	REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO	731.185.907	668.131.467	13.054.440	628.593	12.425.847	50.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO (C33)	397.780.901	357.639.153	10.522.218	10.522.218	0	29.619.530	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO, COMUNA RIO NEGRO	175.662.361	154.554.067	21.108.294	16.886.636	4.221.658	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF CHIFIN	34.340.000	0	34.340.000	23.870.000	10.470.000	0	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	78.025.694	121.974.306	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.538.969.169	1.180.324.687	279.024.952	129.933.141	149.091.811	79.619.530		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	39.198.600	0	39.198.600	0	39.198.600	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	39.198.600	0	39.198.600	0	39.198.600	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO	593.858.000	0	26.204.000	0	26.204.000	567.654.000	RS	Convenio en Tramite
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	0	46.477.782	0	46.477.782	522.602.218	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.162.938.000	0	72.681.782	0	72.681.782	1.090.256.218		
						TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.741.105.769	1.180.324.687	390.905.334	129.933.141	260.972.193	1.169.875.748		
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO	3.749.709.000	3.204.904.217	11.683.051	905.248	10.777.803	533.121.732	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	10.024.577	0	10.024.577	2.550.558.639	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	159.019.129	40.980.871	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.536.937.000	3.231.549.001	221.707.628	159.924.377	61.783.251	3.083.680.371		
						INICIATIVAS NUEVAS								
S	31	N	FDL	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	50.000.000	0	50.000.000	551.714.000	RS	Resolución en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	601.714.000	0	50.000.000	0	50.000.000	551.714.000		
						TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	7.138.651.000	3.231.549.001	271.707.628	159.924.377	111.783.251	3.635.394.371		



PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE SAN PABLO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	3.414.573.000	0	1.583.113.535	1.583.113.535	0	1.831.459.465	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	90.819.502	109.180.498	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.639.473.000	11.729.500	1.796.284.035	1.673.933.037	122.350.998	1.831.459.465		
						TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	3.639.473.000	11.729.500	1.796.284.035	1.673.933.037	122.350.998	1.831.459.465		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30086815	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO	15.318.985.549	4.736.606.083	0	0	0	10.582.379.466	RE	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY	1.452.174.000	1.344.511.915	0	0	0	107.662.085	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	5.486.962.838	1.084.028.450	1.018.393.862	65.634.588	238.623.712	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30448275	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33)	404.079.018	388.107.468	15.971.550	8.621.550	7.350.000	0	RS*	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126279	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO	1.947.625.000	1.942.600.773	5.024.227	0	5.024.227	0	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	3.542.559.000	46.836.000	0	0	0	3.495.723.000	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE OSORNO	363.763.000	49.084	100.921.155	92.404.000	8.517.155	262.792.761	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT OSORNO	5.579.270.000	0	1.052.969.711	1.052.969.711	0	4.526.300.289	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40015603	HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE	103.016.000	59.234.303	43.781.697	31.415.732	12.365.965	0	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	30465788	AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO	329.071.800	0	0	0	0	329.071.800	RS	En Ejecución
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30402378	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO	32.260.000	0	12.409.492	12.409.492	0	19.850.508	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.882.418.367	14.004.908.464	2.315.106.282	2.216.214.347	98.891.935	19.562.403.621		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.816.000	0	52.816.000	0	52.816.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	52.816.000	0	52.816.000	0	52.816.000	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30324573	CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU	1.496.798.000	0	72.056.944	0	72.056.944	1.424.741.056	RS	Convenio en Confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395473	CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33)	1.688.957.000	0	0	0	0	1.688.957.000	RS*	Cambia Unidad Financiera
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.185.755.000		72.056.944	0	72.056.944	3.113.698.056		
						TOTAL PROVINCIALES	39.120.989.367	14.004.908.464	2.439.979.226	2.216.214.347	223.764.879	22.676.101.677		
						TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	97.887.296.673	33.823.234.849	11.274.918.098	9.189.738.932	2.085.179.166	52.789.143.726		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30080460	CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT	394.331.499	357.098.349	37.233.150	37.233.150	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000		10.000.000	0	10.000.000	39.462.000	RS	En Ejecución
	31	L	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC. VILLA LOS PINOS ALTOS	445.639.000	0	250.546.000	111.942.441	138.603.559	195.093.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE QUEPE Y AVDA. JUAN SOLER MANFREDINI	525.598.000	0	183.807.630	142.347.625	41.460.005	341.790.370	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.304.377.035	4.050.000	689.297.716	509.917.663	179.380.053	7.611.029.319	RS	En Ejecución
	31	A	RSD	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	1.111.238.000	234.779.699	391.718.887	391.718.887	0	484.739.414	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	164.943.086	35.056.914	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	11.030.645.534	595.928.048	1.762.603.383	1.358.102.852	404.500.531	8.672.114.103		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO	23.524.000	5.964.000	10.000.000	0	10.000.000	7.560.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	0	10.000.000	6.150.000	3.850.000	12.645.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30270222	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO	22.000.000	5.964.000	10.000.000	0	10.000.000	6.036.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.686.063.000	1.007.486	573.429.000	0	573.429.000	2.111.626.514	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	57.671.666	0	57.671.666	871.343.334	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS	5.496.302.000	0	100.000.000	0	100.000.000	5.396.302.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.179.549.000	12.935.486	761.100.666	6.150.000	754.950.666	8.405.512.848		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	26.500.000	0	26.500.000	614.318.000	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.452.000	0	26.500.000	0	26.500.000	418.952.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.086.270.000	0	53.000.000	0	53.000.000	1.033.270.000		
						TOTAL COMUNA DE P. MONTT	21.296.464.534	608.863.534	2.576.704.049	1.364.252.852	1.212.451.197	18.110.896.951		
						COMUNA DE CALBUCO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.207.370.892	64.911.263	54.329.168	10.582.095	16.951.737	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	9.889.982.000	169.015.232	518.137.000	516.833.640	1.303.360	9.202.829.768	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30326322	REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO	281.984.000	224.490.200	57.493.800	0	57.493.800	0	RS	En Ejecución
	31	L	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.553.691.000	0	382.562.113	162.472.514	220.089.599	1.171.128.887	RS	En Ejecución
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33)	110.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	77.000.000	RS*	En Ejecución
	31	N	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	947.807.000	0	261.438.870	261.438.870	0	686.368.130	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	149.823.164	50.176.836	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	14.272.697.892	1.600.876.324	1.517.543.046	1.177.897.356	339.645.690	11.154.278.522		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015774	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SAN ANDRES Y LOS TULIPANES	365.318.000	0	45.000.000	0	45.000.000	320.318.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015770	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES	437.544.000	0	45.000.000	0	45.000.000	392.544.000	RS	Licitación Adjudicada
ASC	31	N	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	341.707.000	0	341.707.000	0	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.144.569.000	0	431.707.000	0	431.707.000	712.862.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	885.435.000	0	11.754.400	0	11.754.400	873.680.600	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	885.435.000	0	11.754.400	0	11.754.400	873.680.600		
						TOTAL COMUNA DE CALBUCO	16.302.701.892	1.600.876.324	1.961.004.446	1.177.897.356	783.107.090	12.740.821.122		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE COCHAMO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	23.800.000	14.500.000	9.300.000	0	9.300.000	0	RS	Resciliacion Convenio C/Etapa
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30328431	CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE	40.280.000	20.740.000	19.540.000	13.160.000	6.380.000	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE COCHAMO	1.321.664.194	0	20.620.000	13.184.010	7.435.990	1.301.044.194	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	40.000.000	0	40.000.000	66.672.600	RS	En Ejecución
	31	L	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE LLAGUEPE	606.455.904	0	422.019.000	86.096.187	335.922.813	184.436.904	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	174.544.807	25.455.193	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.321.630.098	57.997.400	711.479.000	286.985.004	424.493.996	1.552.153.698		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	L	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA LLANADA GRANDE	122.370.000	0	10.000.000	0	10.000.000	112.370.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	ENERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	868.161.000	0	384.550.000	0	384.550.000	483.611.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMO	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	15.000.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO	42.500.000	0	10.000.000	0	10.000.000	32.500.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.058.031.000	0	414.550.000	0	414.550.000	643.481.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	30428675	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMO	617.579.000	0	483.611.000	0	483.611.000	133.968.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30428523	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO NORTE, COCHAMO	473.976.000	0	0	0	0	473.976.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.591.555.000	0	483.611.000	0	483.611.000	1.107.944.000		
						TOTAL COMUNA DE COCHAMO	4.971.216.098	57.997.400	1.609.640.000	286.985.004	1.322.654.996	3.303.578.698		
						COMUNA DE FRESIA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	201.443.501	27.426.679	0	27.426.679	309.448.885	RE	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	957.303.978	33.279.422	0	33.279.422	327.133.600	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA	590.808.430	335.213.608	72.430.113	63.815.489	8.614.624	183.164.709	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION APR EL MAÑO	490.790.000	376.365.503	11.994.384	0	11.994.384	102.430.113	RS	En Liquidación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	0	94.365.696	94.365.696	0	679.834.304	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES FRESIA (EL RINCON - RIO LLICO - TEODORO SCHAFFER)	239.183.000	0	66.996.610	66.996.610	0	172.186.390	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	133.662.681	66.337.319	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.151.017.495	1.870.326.590	506.492.904	358.840.476	147.652.428	1.774.198.001		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	23.003.390	0	23.003.390	896.112.610	RS	Licitación Desierta
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33)	866.629.000	0	15.634.304	0	15.634.304	850.994.696	RS*	Licitación Adjudicada
	29	L	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33)	534.844.000	0	0	0	0	534.844.000	RS*	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.320.589.000	0	38.637.694	0	38.637.694	2.281.951.306		
						TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.471.606.495	1.870.326.590	545.130.598	358.840.476	186.290.122	4.056.149.307		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE FRUTILLAR								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30465246	CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE	163.185.391	163.185.391	0	0	0	0	RS	Terminada
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30077934	CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR	1.461.360.000	1.218.124.258	3.235.742	0	3.235.742	240.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	105.198.517	82.911.875	53.498.189	29.413.686	40.892.608	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.379.910.000	830.345.185	3.649.521.190	3.649.521.190	0	1.900.043.625	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.433.458.391	2.316.853.351	3.935.668.807	3.703.019.379	232.649.428	2.180.936.233		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	218.397.000	0	12.500.000	0	12.500.000	205.897.000	RS	Licitacion Desierta
ASC	31	L	SS	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR	449.572.000	0	184.023.130	0	184.023.130	265.548.870	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40005972	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR(C33)	410.792.000	0	12.500.000	0	12.500.000	398.292.000	RS*	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	12.500.000	0	12.500.000	413.242.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION RED APR SECTOR CASMA, FRUTILLAR	322.319.000	0	12.500.000	0	12.500.000	309.819.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.826.822.000	0	234.023.130	0	234.023.130	1.592.798.870		
						TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.260.280.391	2.316.853.351	4.169.691.937	3.703.019.379	466.672.558	3.773.735.103		
						COMUNA DE LLANQUIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.532.529.768	3.488.289.637	44.240.131	6.329.255	37.910.876	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40007476	CONSTRUCCION APR COLEGIAL ESPERANZA, LLANQUIHUE	385.181.000	340.526.632	44.654.368	17.971.186	26.683.182	0	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.117.710.768	3.828.816.269	288.894.499	24.300.441	264.594.058	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	0	37.481.869	0	37.481.869	44.918.131	RS	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	82.400.000	0	37.481.869	0	37.481.869	44.918.131		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016314	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33)	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000		
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	678.000	0	678.000	238.105.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.685.233.000	0	678.000	0	678.000	1.684.555.000		
						TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.885.343.768	3.828.816.269	327.054.368	24.300.441	302.753.927	1.729.473.131		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	27.260.000	12.963.000	12.161.060	9.541.000	2.620.060	2.135.940	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30465403	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS	27.413.000	10.036.840	10.036.840	10.036.840	0	7.339.320	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY	1.114.527.000	262.693.000	74.676.211	9.360.000	65.316.211	777.157.789	RS(IN)	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40009545	CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33)	526.563.000	525.729.390	833.610	0	833.610	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30422722	CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	653.685.000	150.000.000	161.493.873	87.145.690	74.348.183	342.191.127	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS	207.019.010	99.601.553	24.025.103	0	24.025.103	83.392.354	RS	En Liquidación
	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40011698	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES, LOS MUERMOS	115.072.000	0	115.072.000	115.072.000	0	0	RS	Terminada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30463128	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MONTT BARRIO COMERCIAL	37.500.000	24.899.112	12.600.888	9.100.000	3.500.888	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40011005	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO (C33)	351.704.000	73.464.012	278.239.988	277.871.399	368.589	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	0	91.741.178	91.741.178	0	45.908.822	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	890.770.000	0	50.000.000	2.536.000	47.464.000	840.770.000	RS	Convenio en Trámite
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	155.528.796	44.471.204	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.289.163.010	1.159.386.907	1.030.880.751	767.932.903	262.947.848	2.098.895.352		
						TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	4.289.163.010	1.159.386.907	1.030.880.751	767.932.903	262.947.848	2.098.895.352		
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	259.031.774	15.017.563	9.484.776	5.532.787	0	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	30485255	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAULLIN	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	185.287.387	14.712.613	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	621.555.337	259.031.774	362.523.563	342.278.163	20.245.400	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN TEN	834.246.000	0	20.000.000	0	20.000.000	814.246.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ	137.618.000	0	20.000.000	0	20.000.000	117.618.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED (C33)	902.195.624	0	250.000.000	0	250.000.000	652.195.624	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.874.059.624	0	290.000.000	0	290.000.000	1.584.059.624		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE	451.210.000	0	20.000.000	0	20.000.000	431.210.000	RS	Convenio en Trámite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	451.210.000	0	20.000.000	0	20.000.000	431.210.000		
						TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.946.824.961	259.031.774	672.523.563	342.278.163	330.245.400	2.015.269.624		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO VARAS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	20.000.000	0	20.000.000	1.650.554.133	RE	En Liquidacion / En Reevaluacion
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005578	MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS	258.669.418	195.904.175	62.765.243	60.017.117	2.748.126	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40001254	MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS	248.242.534	228.806.813	19.435.721	5.636.526	13.799.195	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30066636	REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA	2.826.817.000	2.256.883.403	39.933.597	0	39.933.597	530.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005278	CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33)	980.817.000	610.418.300	235.999.547	205.288.253	30.711.294	134.399.153	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	85.912.424	0	0	0	0	85.912.424	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	400.069.218	80.298.900	0	0	0	319.770.318	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	1.237.007.000	4.375.000	242.042.603	209.128.434	32.914.169	990.589.397	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA	246.000.000	25.043.042	108.043.661	108.043.661	0	112.913.297	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	163.456.084	36.543.916	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.230.470.594	4.478.111.500	928.220.372	751.570.075	176.650.297	3.824.138.722		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	22	N	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	175.000.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	75.000.000	0	75.000.000	631.257.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	906.257.000	0	100.000.000	0	100.000.000	806.257.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS (C33)	818.000.000	0	41.894.213	0	41.894.213	776.105.787	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	80.000.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	905.200.000	0	49.094.213	0	49.094.213	856.105.787		
						TOTAL COMUNA DE P.VARAS	11.041.927.594	4.478.111.500	1.077.314.585	751.570.075	325.744.510	5.486.501.509		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	7.077.521.000	6.727.964.072	349.556.928	27.428.091	322.128.837	0	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO	1.947.580.000	177.066.265	25.000.000	0	25.000.000	1.745.513.735	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133755	CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33)	9.774.474.000	7.927.334.204	666.796.091	338.060.859	328.735.232	1.180.343.705	RS*	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE PTO. MONTT	435.343.000	49.084	73.790.000	73.790.000	0	361.503.916	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	3.678.102.000	417.402.781	1.218.079.863	1.218.079.863	0	2.042.619.356	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014647	MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS	328.934.956	0	328.934.956	278.934.956	50.000.000	0	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.241.954.956	15.249.816.406	2.662.157.838	1.936.293.769	725.864.069	5.329.980.712		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU	2.050.780.000	0	96.210.000	19.084.170	77.125.830	1.954.570.000	RS	Licitación Desierta
H	31	L	LIBRE	DISEÑO	30437675	CONSTRUCCION INTERTERRAZAS PUERTO MONTT, ETAPA I	511.250.000	0	10.000.000	0	10.000.000	501.250.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	9.000.000	250.000.000	0	250.000.000	2.045.827.000	RE	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33)	105.867.000	0	0	0	0	105.867.000	RS*	En Licitación
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PERIODICA CAMINOS VECINALES CALBUCO Y MAULLIN 2020-2021(C33)	900.500.000	0	300.000.000	0	300.000.000	600.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	5.873.224.000	9.000.000	656.210.000	19.084.170	637.125.830	5.208.014.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	RSD	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	252.188.000	0	252.188.000	0	252.188.000	0	RS*	Convenio en Confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	252.188.000	0	252.188.000	0	252.188.000	0	RS*	Convenio en Confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS*	Convenio en Confección 2023
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.004.376.000	0	504.376.000	0	504.376.000	500.000.000		
						TOTAL PROVINCIALES	30.119.554.956	15.258.816.406	3.822.743.838	1.955.377.939	1.867.365.899	11.037.994.712		
						TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	113.585.083.699	31.439.080.055	17.792.688.135	10.732.454.588	7.060.233.547	64.353.315.509		



GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL						PRESUPUESTO FNDR 2021								
PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE ANCUD								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	126.194.543	34.113.956	29.525.431	4.588.525	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	30.300.000	40.400.000	40.400.000	0	30.800.000	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012136	HABILITACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KM 26 Y 27, COMUA DE ANCUD	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	134.118.205	65.881.795	0	RS**	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30083781	DIAGNOSTICO FORTIFICACIONES DE ANCUD	9.375.000	0	9.375.000	0	9.375.000	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	256.882.357	279.162.399	277.621.122	1.541.277	123.050.244	RS	En Ejecución
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	563.580.000	0	355.741.534	355.741.534	0	207.838.466	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	661.606.000	642.350.200	19.034.800	2.415.197	16.619.603	221.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION RED APR PUMANZANO, ANCUD	842.254.000	0	495.237.203	495.237.203	0	347.016.797	RS	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCUMEO	406.672.000	0	147.153.336	147.153.336	0	259.518.664	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40001823	AMPLIACION SALA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS	225.228.000	0	106.469.895	106.469.895	0	118.758.105	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.019.024.499	1.055.727.100	1.876.094.123	1.778.087.923	98.006.200	1.087.203.276		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1.687.342.000	RS	Resolucion en Trámite
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.787.342.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1.687.342.000		
						TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.806.366.499	1.055.727.100	1.976.094.123	1.778.087.923	198.006.200	2.774.545.276		
						COMUNA DE CASTRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485135	CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33)	457.733.000	435.946.053	13.009.452	0	13.009.452	8.777.495	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	336.933.000	191.276.297	72.168.027	56.290.043	15.877.984	73.488.676	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40003369	CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33)	550.000.000	285.558.353	121.441.453	121.441.453	0	143.000.194	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076663	CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33)	564.532.000	447.235.824	117.296.176	110.115.115	7.181.061	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	600.518.000	203.793.037	240.990.257	240.990.257	0	155.734.706	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	219.759.892	1.928.320.043	1.928.320.043	0	1.631.276.065	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.489.072.000	1.783.569.456	2.693.225.408	2.457.156.911	236.068.497	2.012.277.136		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA	139.625.000	0	10.000.000	0	10.000.000	129.625.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014732	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y URBANOS SECTOR TEN TEN Y LA CHACRAN (C33)	158.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	118.000.000	RS*	Licitación Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	583.100.000	0	583.100.000	0	583.100.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	68.425.000	0	68.425.000	0	68.425.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	949.150.000	0	701.525.000	0	701.525.000	247.625.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	10.000.000	0	10.000.000	184.318.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	194.318.000	0	10.000.000	0	10.000.000	184.318.000		
						TOTAL COMUNA DE CASTRO	7.632.540.000	1.783.569.456	3.404.750.408	2.457.156.911	947.593.497	2.444.220.136		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	23.958.165	0	23.958.165	308.955.788	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	53.730.074	61.389.015	59.180.314	2.208.701	428.144.911	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006762	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33)	588.576.000	520.377.383	0	0	0	68.198.617	RS*	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33)	120.000.000	110.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI	490.611.000	401.541.190	40.925.312	40.925.312	0	48.144.498	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	54.026.000	30.600.000	21.799.279	21.799.279	0	1.626.721	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	35.568.000	15.000.000	745.682	14.254.318	22.792.000	RS	En Ejecución
	33	A	SS	EJECUCION	30091901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO	597.480.684	499.967.747	16.391.703	16.391.703	0	81.121.234	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	62.399.451	106.355.544	0	106.355.544	2.681.814.005	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	190.000.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	173.632.756	26.367.244	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.362.282.684	2.025.665.892	505.819.018	312.675.046	193.143.972	3.830.797.774		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014051	ADQUISICION DE CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHONCHI URBANO (C33)	191.590.000	0	191.590.000	0	191.590.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	191.590.000	0	191.590.000	0	191.590.000	0		
						TOTAL COMUNA DE CHONCHI	6.553.872.684	2.025.665.892	697.409.018	312.675.046	384.733.972	3.830.797.774		
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI	571.440.000	493.221.484	36.666.831	36.666.831	0	41.551.685	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	180.104.774	19.895.226	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	771.440.000	493.221.484	236.666.831	216.771.605	19.895.226	41.551.685		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	157.191.500	109.061.196	0	109.061.196	1.290.022.304	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.556.275.000	157.191.500	109.061.196	0	109.061.196	1.290.022.304		
						TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.327.715.000	650.412.984	345.728.027	216.771.605	128.956.422	1.331.573.989		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN	466.092.000	63.846.643	152.718.043	141.402.482	11.315.561	249.527.314	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE	93.707.000	55.016.650	38.377.350	38.377.350	0	313.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	353.680.553	3.807.631	3.529.297	278.334	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	320.000.000	110.000.000	193.206.488	176.337.052	16.869.436	16.793.512	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	0	14.086.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	758.577.000	18.541.310	511.250.000	215.790.522	295.459.478	228.785.690	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	0	108.257.641	108.257.641	0	252.810.359	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	255.866.496	0	255.866.496	255.866.496	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.633.797.680	607.997.656	1.277.570.149	939.560.840	338.009.309	748.229.875		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	15.000.000	0	15.000.000	380.089.000	RS	En Licitación
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN	641.897.000	0	15.000.000	0	15.000.000	626.897.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.036.986.000	0	30.000.000	0	30.000.000	1.006.986.000		
						TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	3.670.783.680	607.997.656	1.307.570.149	939.560.840	368.009.309	1.755.215.875		
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.618.173.447	20.000.000	0	20.000.000	833.927.890	RS	En Liquidacion / En cambio UT
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006078	CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33)	666.831.000	664.441.452	2.389.548	0	2.389.548	0	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	197.460.470	2.539.530	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.338.932.337	3.282.614.899	222.389.548	197.460.470	24.929.078	833.927.890		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF PUQUELDON	791.188.000	0	20.874.839	0	20.874.839	770.313.161	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	791.188.000	0	20.874.839	0	20.874.839	770.313.161		
						TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	5.130.120.337	3.282.614.899	243.264.387	197.460.470	45.803.917	1.604.241.051		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30078798	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN	487.098.000	459.236.777	27.813.223	22.344.966	5.468.257	48.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30480757	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33)	361.002.000	312.229.753	48.772.247	47.376.361	1.395.886	0	RS*	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	0	273.062.903	273.062.903	0	1.077.849.097	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	240.000.000	0	240.000.000	239.700.667	299.333	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.439.012.000	771.466.530	589.648.373	582.484.897	7.163.476	1.077.897.097		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI	801.023.000	0	5.000.000	0	5.000.000	796.023.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	801.023.000	0	5.000.000	0	5.000.000	796.023.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014326	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION AERODROMO (C33)	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.367.906.000	771.466.530	594.648.373	582.484.897	12.163.476	2.001.791.097		
						COMUNA DE QUELLON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO	2.531.139.000	2.121.102.141	200.036.859	179.711.650	20.325.209	210.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.667.420.000	745.531	50.000.000	0	50.000.000	1.616.674.469	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30125850	CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON	302.702.000	232.173.278	62.039.496	62.039.496	0	8.489.226	RS	En Ejecución
	31	N	FDL	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	508.302.000	0	150.000.000	81.744.298	68.255.702	358.302.000	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40000178	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	0	9.000.000	9.000.000	0	37.350.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	101.493.560	98.506.440	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.255.913.000	2.354.020.950	671.076.355	433.989.004	237.087.351	2.230.815.695		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30488426	CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	2.882.500	7.206.250	0	7.206.250	18.736.250	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	835.261.000	34.373.680	40.453.004	0	40.453.004	760.434.316	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	864.086.000	37.256.180	47.659.254	0	47.659.254	779.170.566		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	15.825.000	0	15.825.000	700.000.000	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA (C33)	187.309.000	0	187.309.000	0	187.309.000	0	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	378.420.000	0	378.420.000	0	378.420.000	0	RS*	Tramite en CGR
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	205.275.000	0	205.275.000	0	205.275.000	0	RS*	Tramite en CGR
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.486.829.000	0	786.829.000	0	786.829.000	700.000.000		
						TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.606.828.000	2.391.277.130	1.505.564.609	433.989.004	1.071.575.605	3.709.986.261		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEMCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33)	547.411.000	253.005.532	32.708.320	0	32.708.320	261.697.148	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33)	477.979.805	358.482.829	32.708.320	0	32.708.320	86.788.656	RS*	En Liquidación
	31	A	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33)	499.000.000	124.500.000	374.500.000	0	374.500.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI (SALDO)	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS	ARI
S	31	L	FDL	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	500.494.000	0	150.000.000	101.609.786	48.390.214	350.494.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	140.004.985	59.995.015	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.610.942.805	1.959.994.133	789.916.640	241.614.771	548.301.869	861.032.032		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR PARA SE	145.597.000	0	145.597.000	0	145.597.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR PARA SE	145.596.000	0	145.596.000	0	145.596.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	291.193.000	0	291.193.000	0	291.193.000	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	FDL	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE (C33)	600.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	450.000.000	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	32.708.318	0	32.708.318	134.639.682	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	767.348.000	0	182.708.318	0	182.708.318	584.639.682		
						TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.669.483.805	1.959.994.133	1.263.817.958	241.614.771	1.022.203.187	1.445.671.714		
						COMUNA DE QUINCHAO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC	829.058.000	730.000	119.632.880	0	119.632.880	708.695.120	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33)	367.393.000	0	68.807.727	43.929.709	24.878.018	298.585.273	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	136.747.715	63.252.285	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.396.451.000	730.000	388.440.607	180.677.424	207.763.183	1.007.280.393		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007527	ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES	162.546.000	139.216.000	0	0	0	23.330.000	RS	Convenio en Confección
	31	N	FDL	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ISLA MEULIN, QUINCHAO	155.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	55.000.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	317.546.000	139.216.000	100.000.000	0	100.000.000	78.330.000		
						TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.713.997.000	139.946.000	488.440.607	180.677.424	307.763.183	1.085.610.393		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA	1.528.367.000	527.224.353	50.000.000	14.847.608	35.152.392	951.142.647	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.016.128.000	82.700.000	976.471.555	0	976.471.555	956.956.445	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33)	1.298.249.800	798.004.491	209.740.846	0	209.740.846	290.504.463	RS*	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.842.744.800	1.407.928.844	1.236.212.401	14.847.608	1.221.364.793	2.198.603.555		
						INICIATIVAS NUEVAS								
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000		
						TOTAL PROVINCIALES	9.297.587.800	1.407.928.844	1.236.212.401	14.847.608	1.221.364.793	6.653.446.555		
						TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	57.777.200.805	16.076.600.624	13.063.500.060	7.355.326.499	5.708.173.561	28.637.100.121		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHAITEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	72.307.000	53.675.240	53.675.240	0	11.824.760	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	23.100.000	89.584.227	81.750.000	7.834.227	378.717.773	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	259.720.320	0	259.720.320	259.720.320	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	888.929.320	95.407.000	402.979.787	395.145.560	7.834.227	390.542.533		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO (C33)	534.255.000	0	224.652.413	0	224.652.413	309.602.587	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	534.255.000	0	224.652.413	0	224.652.413	309.602.587		
						TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.423.184.320	95.407.000	627.632.200	395.145.560	232.486.640	700.145.120		
						COMUNA DE FUTALEUFU								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	118.268.328	0	118.268.328	0	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.900.581.000	3.439.918.627	460.662.373	0	460.662.373	0	RS(RE)	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU	703.415.000	563.024.010	34.834.406	6.113.617	28.720.789	105.556.584	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	40006627	REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33)	281.260.005	196.693.686	84.566.319	84.566.319	0	0	RS*	Terminado
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33)	126.058.000	0	50.000.000	20.952.000	29.048.000	76.058.000	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	123.217.368	76.782.632	0	RS**	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	74.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5.160.000	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.273.698.383	8.099.592.373	987.331.426	234.849.304	752.482.122	186.774.584		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	38.279.732	0	38.279.732	0	38.279.732	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	17.102.368	0	17.102.368	0	17.102.368	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	43.665.564	0	43.665.564	0	43.665.564	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	99.047.664	0	99.047.664	0	99.047.664	0		



GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL														PRESUPUESTO FNDR 2021				
PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL				
						COMUNA DE HUALAIHUE												
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION												
S-PV	31	A	PV	EJECUCION	30311722	REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN	638.980.000	553.325.273	72.898.062	72.898.062	0	12.756.665	RS	En Ejecución				
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33)	231.709.000	217.737.229	6.728.348	0	6.728.348	7.243.423	RS*	En Ejecución				
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33)	364.878.000	356.421.271	8.456.729	0	8.456.729	0	RS*	En Ejecución				
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO	657.583.000	0	125.435.625	10.894.950	114.540.675	532.147.375	RS	En Ejecución				
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución				
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.093.150.000	1.127.483.773	413.518.764	83.793.012	329.725.752	552.147.463						
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION												
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO	33.986.000	0	10.000.000	0	10.000.000	23.986.000	RS	Licitación Adjudicada				
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO	33.986.000	0	10.000.000	0	10.000.000	23.986.000	RS	Licitación Adjudicada				
AS	31	L	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE	474.773.000	0	50.179.160	0	50.179.160	424.593.840	RS	Licitación Adjudicada				
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	542.745.000	0	70.179.160	0	70.179.160	472.565.840						
						INICIATIVAS NUEVAS												
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30471865	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33)	101.104.000	0	0	0	0	101.104.000		RS vencido - debe reevaluar				
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	156.403.836	0	156.403.836	0	156.403.836	0	RS*	Revaluado				
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	308.862.071	0	308.862.071	0	308.862.071	0	RS*	Revaluado				
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	566.369.907	0	465.265.907	0	465.265.907	101.104.000						
						TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	3.202.264.907	1.127.483.773	948.963.831	83.793.012	865.170.819	1.125.817.303						
						COMUNA DE PALENA												
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION												
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	503.235.568	885.373.923	885.373.923	0	1.182.991.509	RS	En Ejecución				
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30116040	CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL	43.998.000	35.173.080	8.824.920	0	8.824.920	0	RS	En Liquidación				
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS	Terminado				
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33)	68.106.000	47.522.650	20.583.350	13.923.131	6.660.219	0	RS*	En Ejecución				
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	179.859.328	20.140.672	0	RS**	En Ejecución				
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.084.008.000	585.931.298	1.315.085.193	1.279.459.382	35.625.811	1.182.991.509						
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION												
PV	31	A	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	622.243.006	266.130.994	0	266.130.994	365.053.000	RS(RE)	En Licitación				
PV	31	N	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	814.000.000	0	233.284.932	0	233.284.932	580.715.068	RS	Licitación Adjudicada				
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33)	130.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	103.000.000	RS*	Licitación Adjudicada				
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.197.427.000	622.243.006	526.415.926	0	526.415.926	1.048.768.068						
						TOTAL COMUNA DE PALENA	5.281.435.000	1.208.174.304	1.841.501.119	1.279.459.382	562.041.737	2.231.759.577						

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	9.788.091.000	133.735.539	3.258.000.000	5.819.395	3.252.180.605	6.396.355.461	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33)	4.990.418.000	4.853.909.931	136.508.069	0	136.508.069	0	RS*	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	977.479.734	1.422.520.266	1.279.460.793	143.059.473	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30447539	DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33)	140.366.668	140.366.668	0	0	0	0	RS*	Terminado
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	0	51.495.000	0	51.495.000	56.391.000	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	349.721.866	48.318.134	0	48.318.134	0	RS*	En Ejecución
PV	31	N	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	10.017.216	3.813.751.821	111.126.635	3.702.625.186	24.876.072.963	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	46.524.643.668	6.465.230.954	8.730.593.290	1.396.406.823	7.334.186.467	31.328.819.424		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
S-PV	31	L	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	0	4.158.237.821	0	4.158.237.821	12.142.076.179	RS	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	16.300.314.000	0	4.158.237.821	0	4.158.237.821	12.142.076.179		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA	425.541.000	0	11.277.050	0	11.277.050	414.263.950	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA	742.950.000	0	17.147.500	0	17.147.500	725.802.500	RS	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480167	ADQUISICION LANCHAS POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33)	237.746.000	0	0	0	0	237.746.000	RS	Vencido
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30398377	ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33)	33.689.000	0	0	0	0	33.689.000	RS	Vencido
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.439.926.000	0	28.424.550	0	28.424.550	1.411.501.450		
						TOTAL PROVINCIALES	64.264.883.668	6.465.230.954	12.917.255.661	1.396.406.823	11.520.848.838	44.882.397.053		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						REGIONALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.185.189.000	3.008.590.769	125.391.979	13.358.810	112.033.169	51.206.252	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	387.114.000	133.599.940	228.712.000	69.464.483	159.247.517	24.802.060	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	668.312.499	234.455.949	384.305.044	263.956.130	120.348.914	49.551.506	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	3.405.537.000	0	3.405.537.000	1.300.970.371	2.104.566.629	0	RS***	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30460140	CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33)	3.712.267.936	3.549.833.203	1.515.887	0	1.515.887	160.918.846	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	661.135.000	0	661.135.000	0	661.135.000	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PRIVADO	2.495.654.000	0	2.495.654.000	177.344.270	2.318.309.730	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	2.350.784.000	0	2.350.784.000	0	2.350.784.000	0	RS***	En Ejecución
	33	A	LIBRE	EJECUCION	40016388	TRANSFERENCIA ADQUISICION 07 MULTIPROPOSITO, 02 CARROS Y 01 CARRO ALJIBE REGIÓN DE LOS LAGOS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	13.900.000	200.000.000	69.500.000	130.500.000	136.100.000	RS*	En Ejecución
	33	A	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	189.600.000	2.417.315.000	0	RS**	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021 (C33)	2.028.090.000	0	595.257.565	595.257.565	0	1.432.832.435	RS*	Licitación Adjudicada
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	934.111.836	0	934.111.836	0	934.111.836	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	25.285.110.271	6.940.379.861	16.489.319.311	2.679.451.629	13.809.867.682	1.855.411.099		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA REG. DE LOS LAGOS, 2020 - 2021(C33)	613.500.000	0	30.675.000	0	30.675.000	582.825.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADMINISTRACION REGIONAL	996.652.000	0	49.832.600	0	49.832.600	946.819.400	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMATICA Y DIGITAL POLICIAL LOS LAGOS(C33)	539.595.000	0	539.595.000	0	539.595.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION DE LOS LAGOS(C33)	531.990.000	0	0	0	0	531.990.000	RS*	En Licitación
	31	N	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIO NORTE Y PIRDT	206.226.000	0	86.226.000	0	86.226.000	120.000.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS 2020-2021(C33)	3.350.500.000	0	140.000.000	0	140.000.000	3.210.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.238.463.000	0	846.328.600	0	846.328.600	5.392.134.400		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	130.000.000	0	130.000.000	5.354.512.000	RS	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS(C33)	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES UNIDADES Y DESTACAMENTO DE LA REGION DE LOS LAGOS(C33)	1.302.032.000	0	1.302.032.000	0	1.302.032.000	0	RS*	En Conformación UT
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DET. DE BRECHAS A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	30.000.000	0	30.000.000	211.133.000	RS	Convenio en confección
	22	N	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33)	413.944.000	0	200.000.000	0	200.000.000	213.944.000	RS*	Convenio en confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	7.716.621.000	0	1.662.032.000	0	1.662.032.000	6.054.589.000		
						TOTAL REGIONAL	39.240.194.271	6.940.379.861	18.997.679.911	2.679.451.629	16.318.228.282	13.302.134.499		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
PRESUPUESTO PROGRAMAS						FOMENTO								
						PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
R	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	11.194.022	488.805.978	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FUNCHI	40025247	RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE MICROEMPRESAS FAMILIARES	1.000.000.000	52.765.000	947.235.000	947.235.000	0	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FOSIS	40025197	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR INFORMAL REGION DE LOS LAGOS	1.750.000.000	999.996.000	750.000.000	1.296.000	748.704.000	4.000	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FUNDACION ART	40025326	RECUPERACION ECONOMICA DE LA ARTESANIA TRADICIONAL DE LA REGION DE LOS LAGOS	250.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	154.595.000	3.024.000	0	0	76.823.750	RS**	En Ejecución
						TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	5.231.418.750	2.717.356.000	2.440.259.000	1.199.725.022	1.237.509.978	76.827.750		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
AS	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40019477	TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYMES	1.000.000.000	880.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019474	PROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA MUJERES EMP. SECTOR ALGUERO	120.000.000	7.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019475	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CAPACITACION Y RECONVERSION LABORAL PARA ALGUEROS DE ANCUD	150.000.000	13.000.000	137.000.000	137.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019379	PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEMERSALES	300.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD (S)	505.000.000	20.000.000	485.000.000	0	485.000.000	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019469	REPOSICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES JEFA DE HOGAR	150.000.000	20.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	RS**	En Ejecución
	33	N	RSD	SEREMI DE MEDI	40023036	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TORNO A LA ECONOMIA CIR	235.000.000	0	205.000.000	0	0	235.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPREDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS (S)	130.000.000	10.000.000	110.000.000	1.500.000	108.500.000	10.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION APOYO A LA REINSENCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD (S)	200.000.000	3.999.977	185.000.000	0	185.000.000	11.000.023	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SEREMI VIVIENDA	40019485	TRANSF. MEJOR. DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	20.000.000	770.000.000	0	770.000.000	510.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	N	LIBRE	SENAMA	40024008	PREVEN. PROGR. MEJOR. INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES (S)	474.000.000	0	474.000.000	0	474.000.000	0	RS**	En Tramite DIPRES
AS	33	N	LIBRE	SENAMA	40015477	PREVENCION PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS REGION DE LOS LAGOS (S)	456.000.000	0	456.000.000	0	456.000.000	0	RS**	En Tramite DIPRES
						TOTAL ACUERDO SOCIAL	5.020.000.000	1.173.999.977	3.285.000.000	471.500.000	2.608.500.000	766.000.023		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
ASC	33	A	LIBRE	FUDEA-SERNATU	40022229	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	1.012.675.000	100.000.000	912.675.000	52.635.861	RS**	En Ejecución
						TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	434.689.139	1.012.675.000	100.000.000	912.675.000	52.635.861		
						PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
PV	33	A	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA	203.000.000	184.613.176	18.387.000	0	18.387.000	-176	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341329	TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC	309.000.000	301.181.123	7.819.000	0	7.819.000	-123	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA	190.000.000	189.316.581	171.000	0	171.000	512.419	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30341175	PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV	600.000.000	296.299.083	200.000.000	697.937	199.302.063	103.700.917	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30341173	TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	450.000.000	294.207.260	130.000.000	0	130.000.000	25.792.740	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC	530.000.000	296.632.948	150.000.000	0	150.000.000	83.367.052	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	126.296.879	43.204.000	0	43.204.000	-879	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	30.782.899	179.218.000	0	179.218.000	-899	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SERNATUR	30337226	TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE	1.275.000.000	1.249.784.880	25.216.000	0	25.216.000	-880	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE BIENE	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	325.273.549	174.727.000	2.230.014	172.496.986	-549	RS**	En Ejecución
						TOTAL PATAGONIA VERDE	4.751.500.000	3.601.756.185	928.742.000	2.927.951	925.814.049	221.001.815		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						PROGRAMAS DE ARRASTRE								
	33	A	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN	202.400.000	37.349.999	30.000.000	0	30.000.000	135.050.001	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	40014803	PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	219.937.838	75.000.000	0	75.000.000	469.526.402	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30378428	PROGRAMA SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA PARA LA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA	500.000.192	500.000.192	0	0	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30433775	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS	500.000.192	495.707.192	1.074.000	0	1.074.000	3.219.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	502.749.364	481.749.364	80.778.000	0	80.778.000	-59.778.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS	400.000.000	181.514.893	100.000.000	0	100.000.000	118.485.107	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	2.006.500.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO	30136320	PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE	600.157.757	317.817.757	307.011.000	0	307.011.000	-24.671.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO	40005399	TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	308.004.725	225.000.000	0	225.000.000	1.679.764.506	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II	540.800.000	518.502.126	25.051.000	0	25.051.000	-2.753.126	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30440729	PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES	320.000.000	308.425.504	18.401.000	0	18.401.000	-6.826.504	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	81.800.000	0	81.800.000	103.199.928	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAPESCA	30343724	PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016	1.547.258.233	1.336.907.233	242.128.000	0	242.128.000	-31.777.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL	900.000.000	630.041.157	80.000.000	0	80.000.000	189.958.843	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS	700.000.000	698.800.385	51.125.000	0	51.125.000	-49.925.385	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	COMISION NACIO	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.184.780.439	200.000.000	199.564.190	435.810	615.219.561	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	172.830.250	140.492.250	51.125.000	1.500.000	49.625.000	-18.787.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE BIENE	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	269.146.592	250.000.000	25.262.446	224.737.554	680.853.408	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FUNCHI	40016769	TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR PRODUCCION P.A.	1.000.000.000	580.625.000	12.500.000	50.000.000	-37.500.000	406.875.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES	230.000.000	228.800.000	1.200.000	0	1.200.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION D	230.000.000	226.000.000	7.158.000	1.145.453	6.012.547	-3.158.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	90.000.000	25.000.000	0	25.000.000	212.800.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERV. SALUD OSC	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAG. PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	84.385.968	22.500.000	0	22.500.000	93.114.032	RS**	En Ejecución
						PROGRAMAS DE ARRASTRE	17.757.729.459	9.253.988.686	1.986.851.000	277.472.089	1.709.378.911	6.516.889.773		
						PROGRAMAS NUEVOS								
	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40026513	PROGRAMA DE REACTIVACION Y CAPACITACION INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCUD	49.960.000	0	49.960.000	0	49.960.000	0	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40024244	TRANSFERENCIA DE PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	0	15.000.000	0	15.000.000	307.800.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	LIBRE	COMISION DE RIE	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	0	11.250.000	0	11.250.000	2.028.750.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Y POSICIONAMIENTO PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVENTURA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	LIBRE	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO, ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	0	19.314.000	0	19.314.000	14.960.686.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.577.281.000	0	1.577.281.000	0	1.577.281.000	0	RS**	En Tramite DIPRES
						TOTAL PROGRAMAS NUEVOS	19.070.041.000	0	1.672.805.000	0	1.672.805.000	17.397.236.000		
						PROGRAMAS FET								
	30	N	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS NIVEL PREFIAL COMUNIDAD IND	359.099.000	0	50.000.000	0	50.000.000	309.099.000	RS**	En Tramite CGR
ASC	30	N	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSF. FINAN. DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGION (S)	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	En Tramite CGR
ASC-R	30	N	LIBRE	INDAP	40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PARA JOVENES Y MU	800.000.000	0	614.902.000	0	614.902.000	185.098.000	RS**	En Tramite CGR
ASC-R	30	N	LIBRE	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	RS**	En Tramite CGR
	30	N	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	0	507.000.000	0	507.000.000	779.000.000	RS**	En Tramite CGR
	30	N	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE LEÑA DE C	1.300.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	1.175.000.000	RS**	En Tramite CGR
						TOTAL PROGRAMAS FET	4.493.099.000	0	2.044.902.000	0	2.044.902.000	2.448.197.000		
						TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO	57.823.788.209	17.181.789.987	13.371.234.000	2.051.625.062	11.111.584.938	27.478.788.222		
						TOTAL PRESUPUESTO 2021	449.858.077.599	122.456.973.780	91.921.752.105	35.398.250.791	56.315.477.314	235.687.375.714		

PLAN  
SI=CONVENIO DE SALUD  
II=CONVENIO CREADORES MAS HUMANAS  
PIV=PATAGONIA VERDE  
AB=ACUERDO SOCIAL  
AC=ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO  
RI=PROGRAMA DE REACTIVACION

RATE  
RS=RECOMENDACION TECNICA FAVORABLE  
RI=RECOMENDACION TECNICA CIRCULAR 33  
RS=RECOMENDACION POR TRANSPARENCIA  
RS=RECOMENDACION POR SUBSIDIO  
RI=REVALUACION  
RI=REVALUACION DE NORMATIVA
