




GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS
Acción de Futuro

ESTADO SITUACION FNDR 02 - AGOSTO 2021




Marco Decretado FNDR - 02 al 31 Agosto 2021

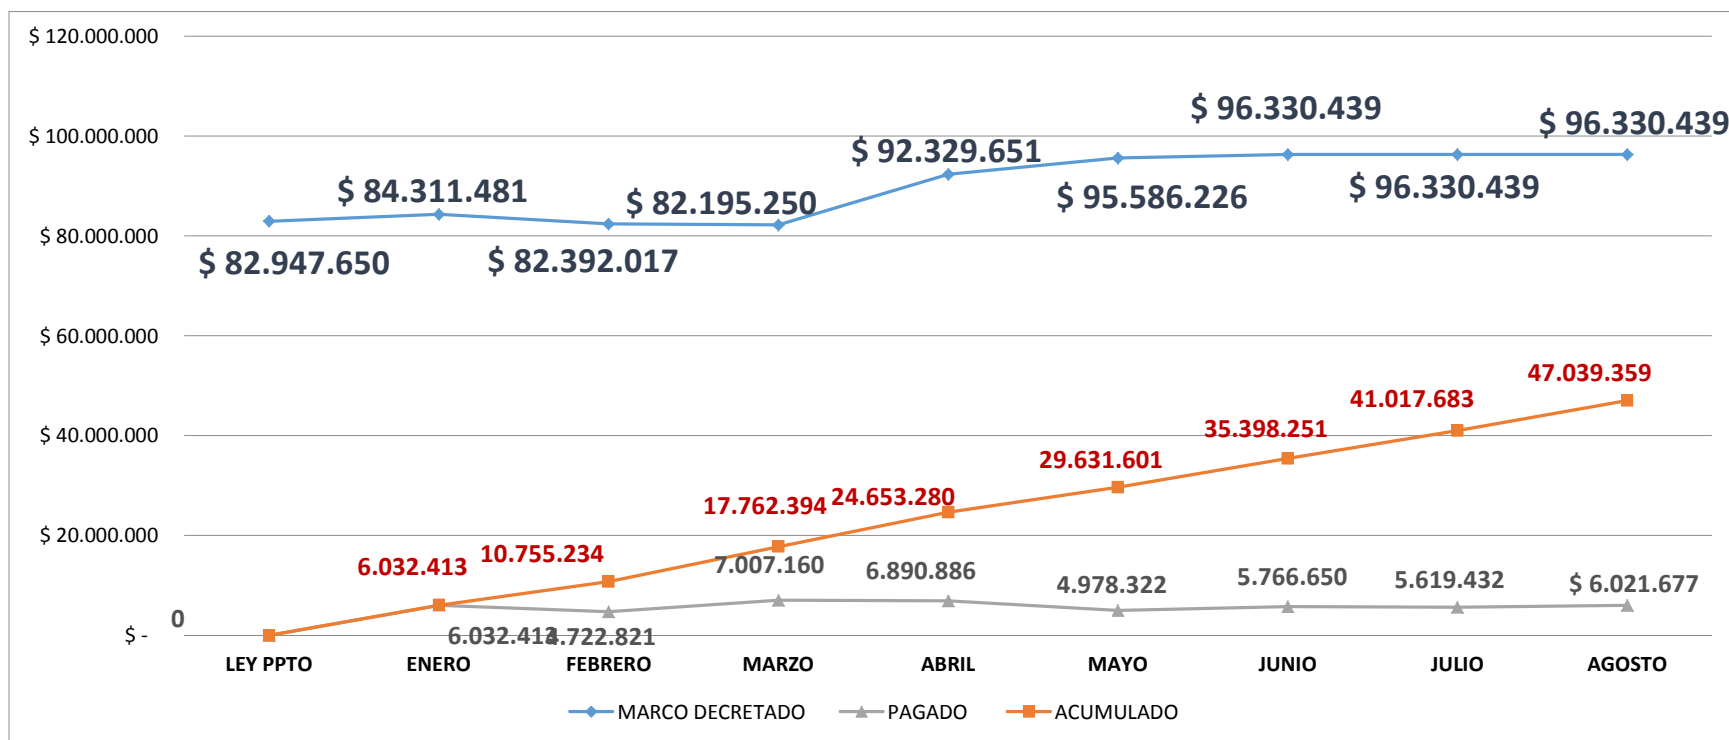




Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 Devengado al 31 Agosto 2021 - %

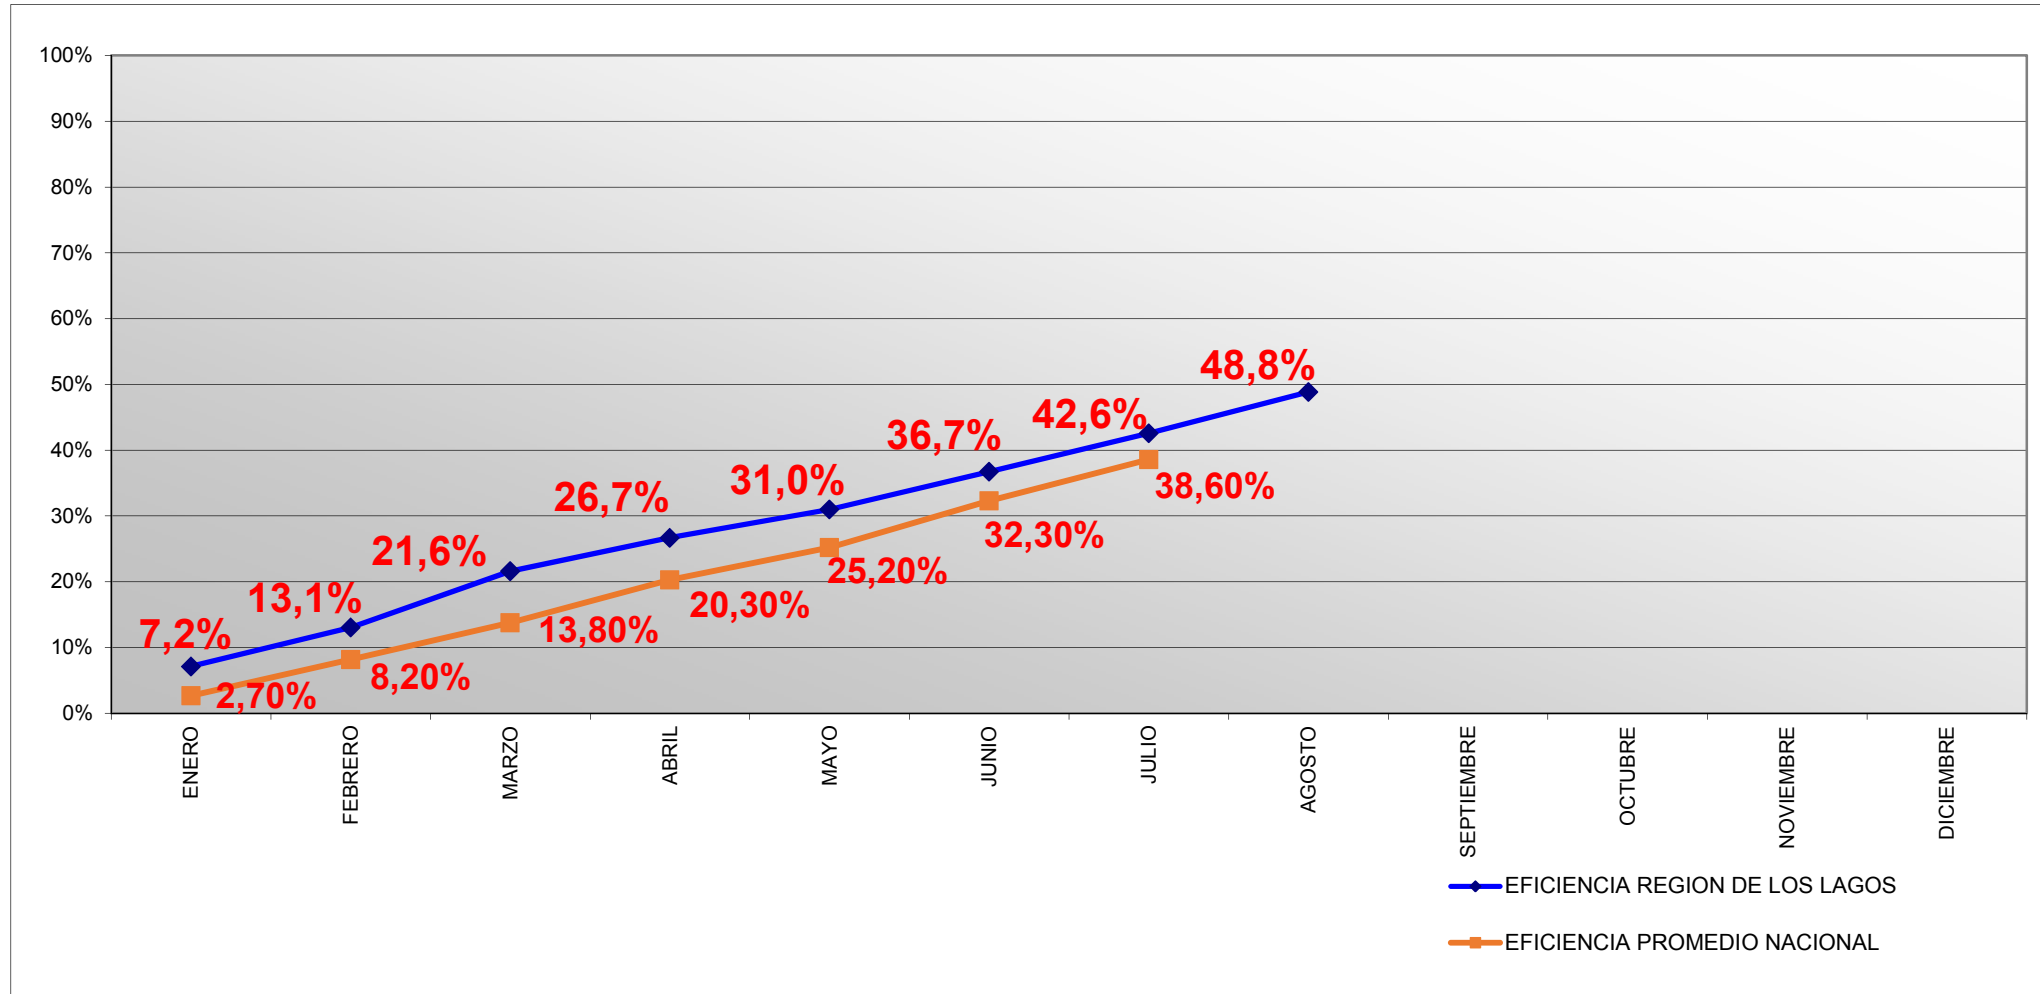

Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNR - 02 Devengado al 31 de Agosto 2021 - %

	COSTO TOTAL		FNR 2021						
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO	98.543.522.813	22%	33.836.067.349	13.629.938.937	14%	11.457.774.120	2.172.164.817	84,06%	51.077.516.527
LLANQUIHUE	114.585.980.167	25%	31.439.080.055	20.491.100.168	21%	15.091.531.748	5.399.568.420	73,65%	62.655.799.944
CHILOE	59.549.041.956	13%	16.076.600.624	15.504.236.660	16%	9.553.996.316	5.950.240.344	61,62%	27.968.204.672
PALENA	83.805.023.617	18%	17.103.775.404	18.088.827.874	19%	4.317.776.310	13.771.051.564	23,87%	48.612.420.339
REGIONAL	39.097.134.956	9%	6.926.059.341	18.609.303.361	19%	4.162.577.442	14.446.725.919	22,37%	13.561.772.254
FOMENTO	57.802.145.224	13%	17.157.850.481	10.007.032.000	10%	2.455.703.229	7.551.328.771	24,54%	30.366.965.743
TOTAL	453.382.848.733	100%	122.539.433.254	96.330.439.000	100%	47.039.359.165	49.291.079.835		234.242.679.479

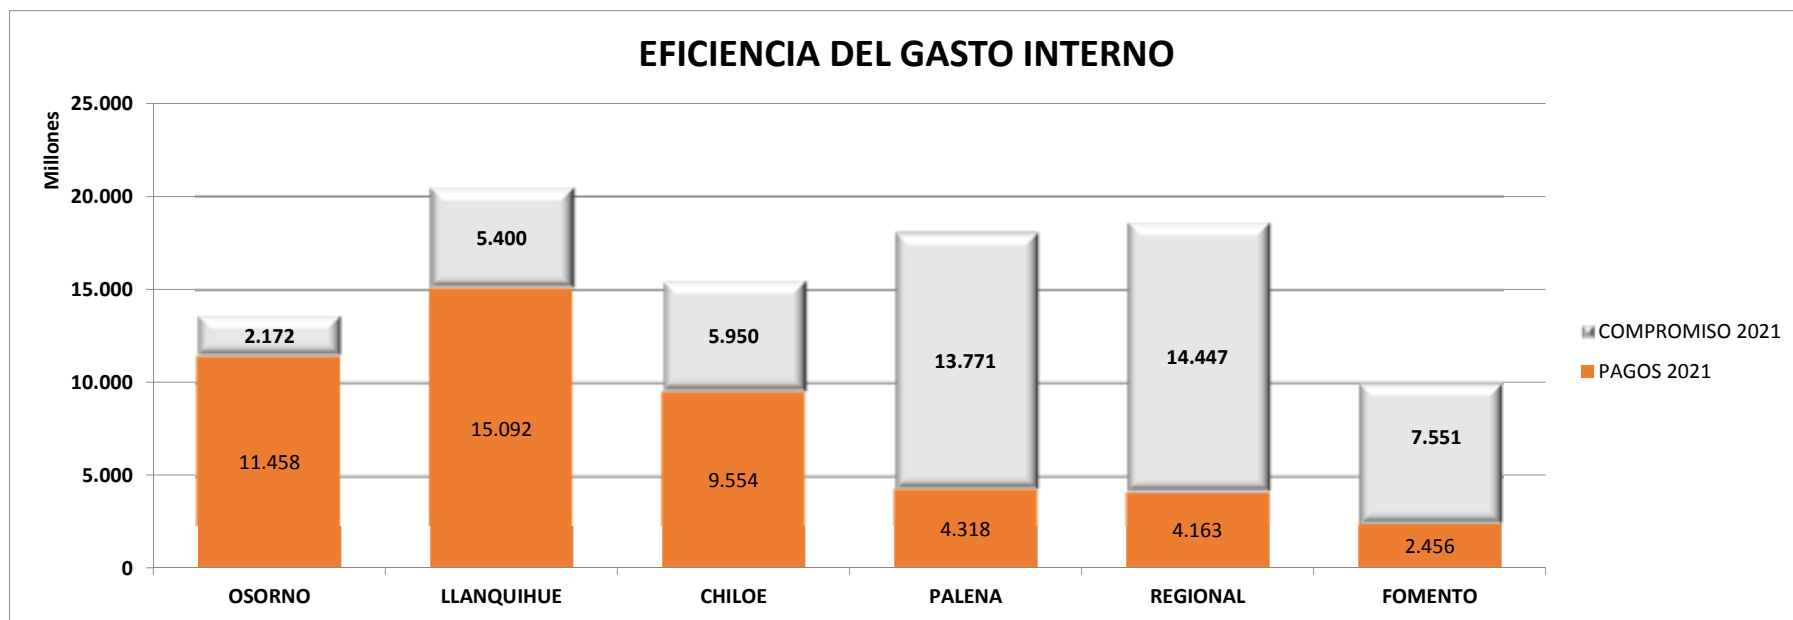




Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 de Agosto 2021 - %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO	14	39.120.322.809	40%	14.004.908.464	2.845.592.579	21%	2.583.483.629	262.108.950	90,79%	22.269.821.766
OSORNO	14	29.285.620.322	30%	9.800.562.401	4.916.006.074	36%	4.701.292.333	214.713.741	95,63%	14.569.051.847
PTO. OCTAY	5	2.402.343.897	2%	1.072.531.447	1.324.636.203	10%	972.661.203	351.975.000	73,43%	5.176.247
PURRANQUE	16	9.356.286.432	9%	1.440.972.179	793.780.802	6%	508.230.029	285.550.773	64,03%	7.121.533.451
PUYEHUE	9	4.513.631.993	5%	3.093.489.670	626.063.413	5%	258.631.702	367.431.711	41,31%	794.078.910
RIO NEGRO	8	2.691.105.769	3%	1.180.324.687	246.457.704	2%	151.223.583	95.234.121	61,36%	1.264.323.378
SAN JUAN DE LA COSTA	4	7.138.651.000	7%	3.231.549.001	271.707.628	2%	183.079.181	88.628.447	67,38%	3.635.394.371
SAN PABLO	5	4.035.560.591	4%	11.729.500	2.605.694.534	19%	2.099.172.460	506.522.074	80,56%	1.418.136.557
TOTAL	75	98.543.522.813	100%	33.836.067.349	13.629.938.937	100%	11.457.774.120	2.172.164.817	84,06%	51.077.516.527

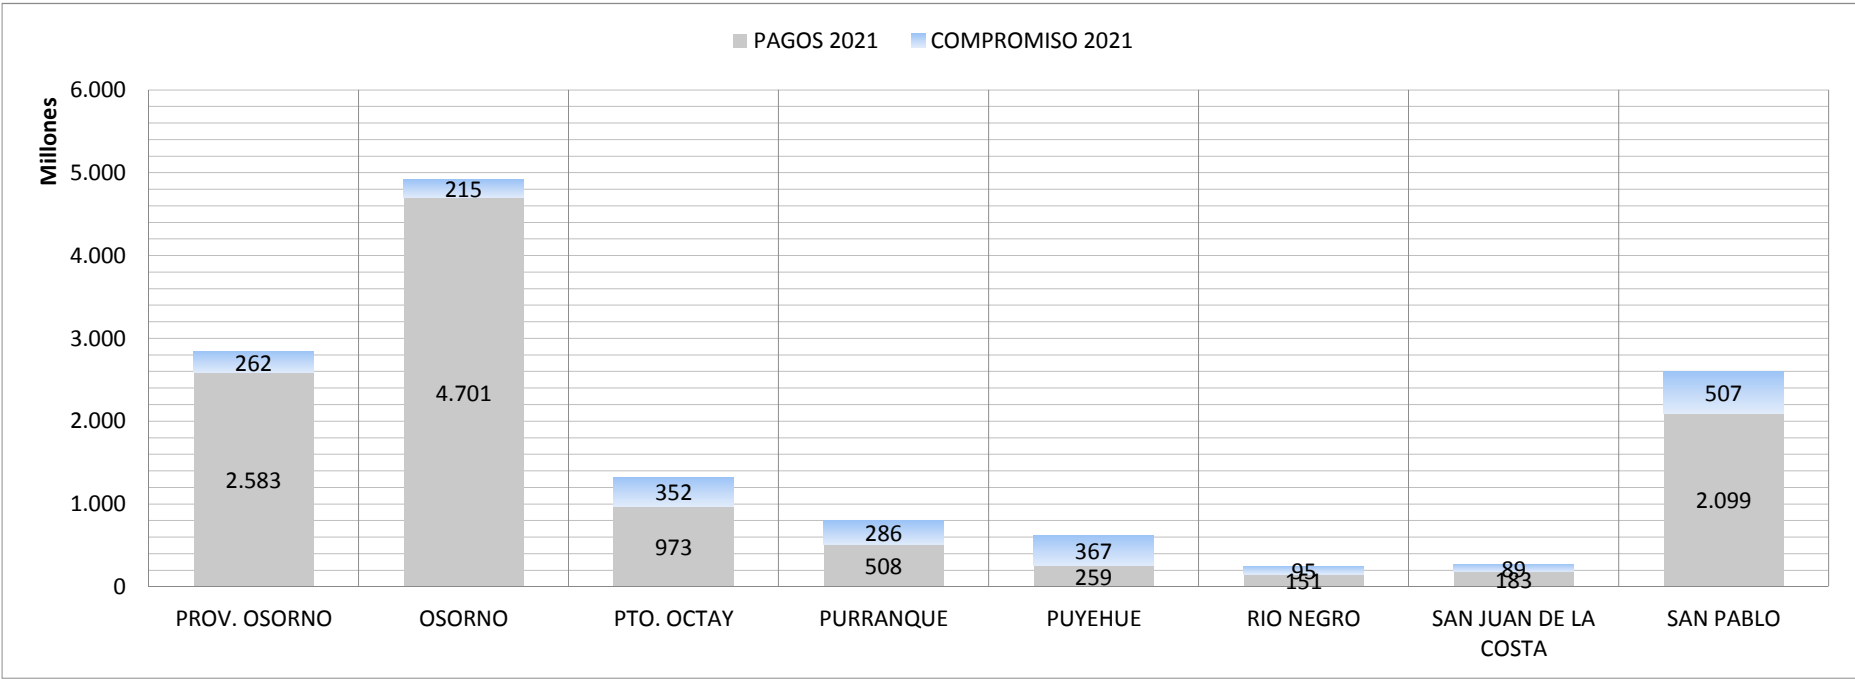



Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 de Agosto - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE	13	31.023.466.662	27%	15.258.816.406	3.363.206.570	16%	2.361.079.156	1.002.127.414	70,20%	12.401.443.686
CALBUCO	13	16.302.701.892	14%	1.600.876.324	2.379.417.213	12%	1.984.155.827	395.261.386	83,39%	12.322.408.355
COCHAMO	10	4.973.112.237	4%	57.997.400	1.580.156.139	8%	499.716.201	1.080.439.938	31,62%	3.334.958.698
FRESIA	10	6.471.606.495	6%	1.870.326.590	1.060.824.608	5%	1.011.301.408	49.523.200	95,33%	3.540.455.297
FRUTILLAR	10	10.455.913.464	9%	2.316.853.351	5.902.061.919	29%	5.184.321.805	717.740.114	87,84%	2.236.998.194
LLANQUIHUE	6	5.780.156.318	5%	3.828.816.269	202.212.550	1%	50.253.867	151.958.683	24,85%	1.749.127.499
LOS MUERMOS	12	4.291.222.010	4%	1.159.386.907	980.513.256	5%	872.941.236	107.572.020	89,03%	2.151.321.847
MAULLIN	7	2.946.824.961	3%	259.031.774	799.503.563	4%	342.278.163	457.225.400	42,81%	1.888.289.624
P. MONTT	16	21.299.048.534	19%	608.863.534	3.271.388.134	16%	1.920.908.438	1.350.479.696	58,72%	17.418.796.866
P.VARAS	14	11.041.927.594	10%	4.478.111.500	951.816.216	5%	864.575.647	87.240.569	90,83%	5.611.999.878
TOTAL	111	114.585.980.167	100%	31.439.080.055	20.491.100.168	100%	15.091.531.748	5.399.568.420	73,65%	62.655.799.944

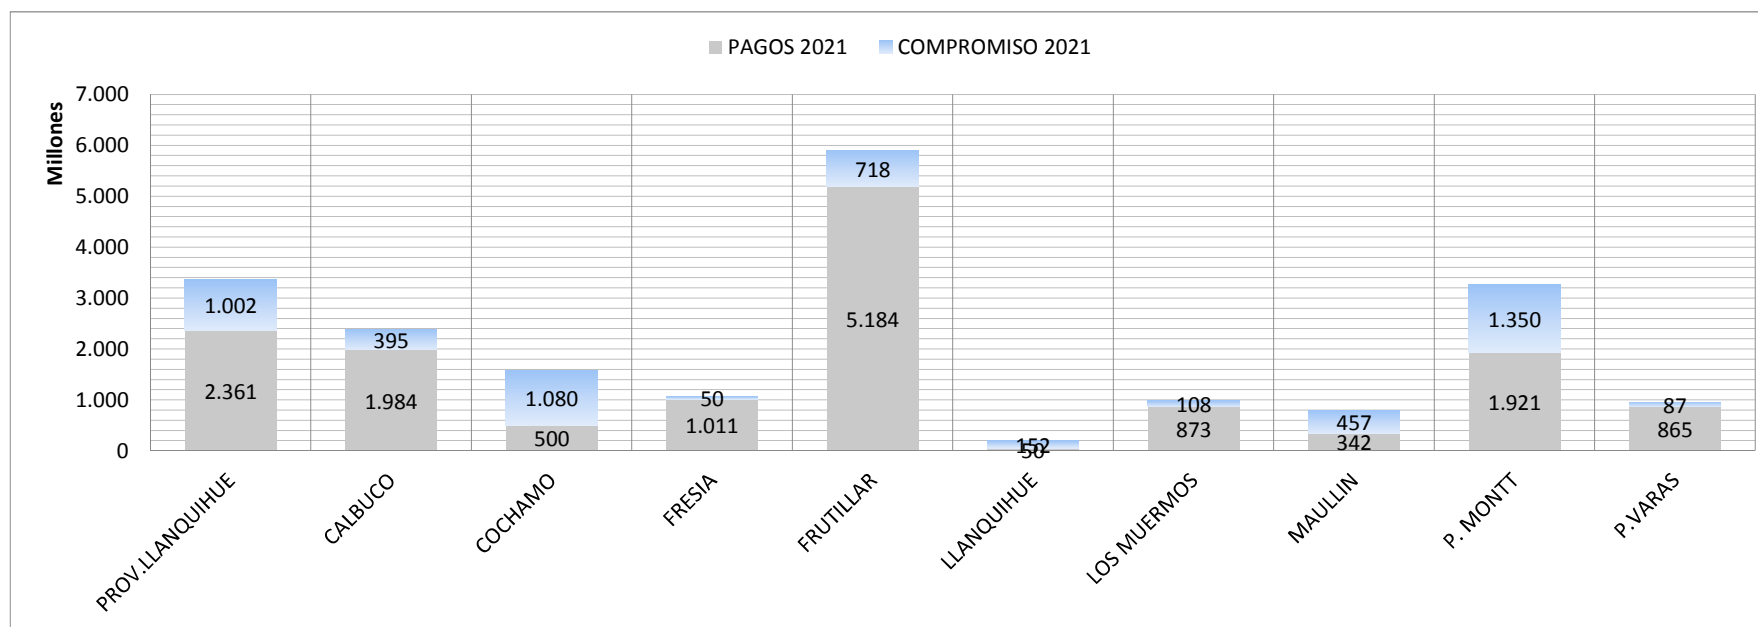




Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 de Agosto 2021 – %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE	4	9.297.587.800	16%	1.407.928.844	1.659.481.483	11%	14.847.608	1.644.633.875	0,89%	6.230.177.473
ANCUD	12	5.808.875.744	10%	1.055.727.100	2.448.724.699	16%	2.318.141.571	130.583.128	94,67%	2.304.423.945
CASTRO	12	7.578.660.600	13%	1.783.569.456	4.150.846.833	27%	3.006.914.150	1.143.932.683	72,44%	1.644.244.311
CHONCHI	12	6.472.418.202	11%	2.025.665.892	687.076.115	4%	312.675.046	374.401.069	45,51%	3.759.676.195
CURACO DE VÉLEZ	3	2.354.511.203	4%	650.412.984	323.537.240	2%	263.463.034	60.074.206	81,43%	1.380.560.979
DALCAHUE	11	4.726.118.580	8%	607.997.656	1.449.130.195	9%	1.167.666.835	281.463.360	80,58%	2.668.990.729
PUQUELDON	4	5.213.309.746	9%	3.282.614.899	326.453.796	2%	283.189.409	43.264.387	86,75%	1.604.241.051
QUEILEN	8	3.612.410.091	6%	771.466.530	1.516.089.561	10%	983.827.900	532.261.661	64,89%	1.324.854.000
QUELLON	12	7.606.828.000	13%	2.391.277.130	1.260.652.396	8%	580.946.260	679.706.136	46,08%	3.954.898.474
QUEMCHI	11	5.164.324.990	9%	1.959.994.133	1.199.852.959	8%	317.261.485	882.591.474	26,44%	2.004.477.898
QUINCHAO	5	1.713.997.000	3%	139.946.000	482.391.383	3%	305.063.018	177.328.365	63,24%	1.091.659.617
TOTAL	94	59.549.041.956	100%	16.076.600.624	15.504.236.660	100%	9.553.996.316	5.950.240.344	61,62%	27.968.204.672

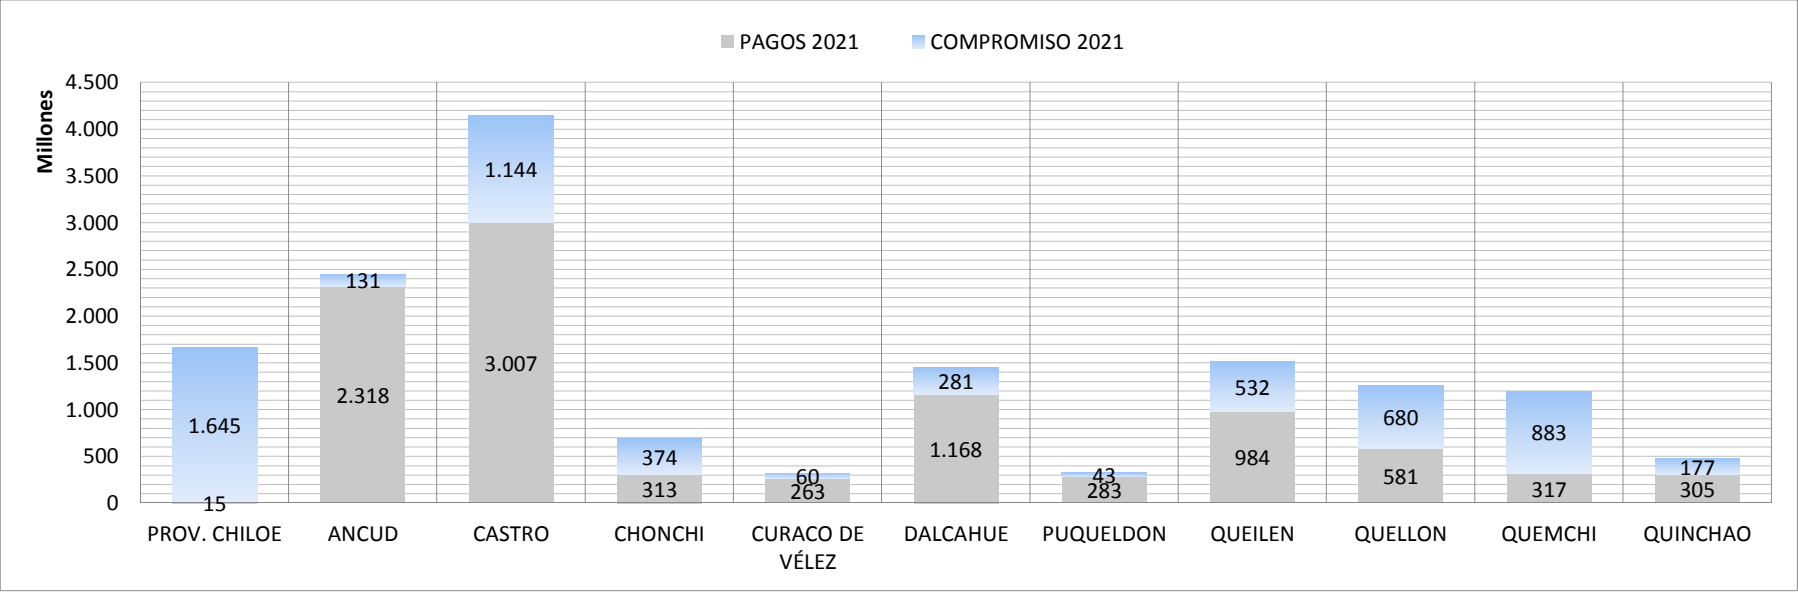



Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR -02 Devengado al 31 de Agosto 2021 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					SALDO AÑOS FUTURO
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	
PROV. PALENA	12	64.264.883.668	77%	6.573.117.954	12.837.335.111	71%	1.629.041.654	11.208.293.457	12,69%	44.854.430.603
CHAITEN	5	1.724.589.320	2%	95.407.000	1.050.400.322	6%	461.845.560	588.554.762	43,97%	578.781.998
FUTALEUFU	10	9.380.481.483	11%	8.099.592.373	1.066.222.426	6%	284.862.519	781.359.907	26,72%	214.666.684
HUALAIHUE	11	3.153.634.146	4%	1.127.483.773	1.015.318.038	6%	355.287.597	660.030.441	34,99%	1.010.832.335
PALENA	8	5.281.435.000	6%	1.208.174.304	2.119.551.977	12%	1.586.738.980	532.812.997	74,86%	1.953.708.719
TOTAL	46	83.805.023.617	100%	17.103.775.404	18.088.827.874	100%	4.317.776.310	13.771.051.564	23,87%	48.612.420.339

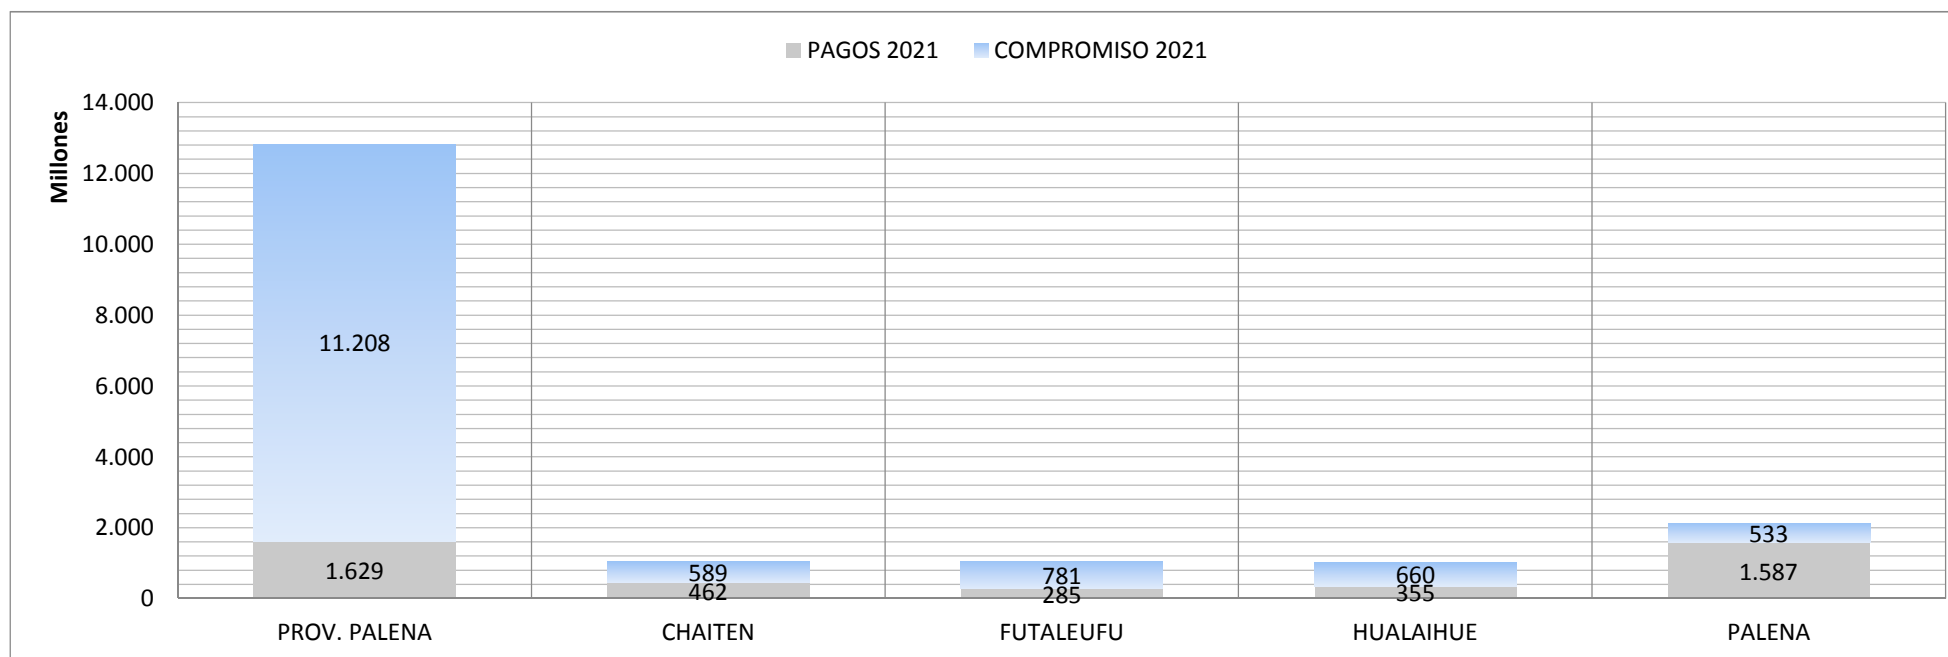




Eficiencia Presupuestaria Por Provision Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 de Agosto 2021 – %

PROVISIÓN
LIBRE
PATAGONIA VERDE
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION
FONDO DE INFRAESTRURA EDUCACIONAL
RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO
FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SERVICIO SANITARIO
FONDO DESARROLLO LOCAL
FONDO APOYO REGIONAL
PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2021			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
59.456.347.000	60.644.214.606	62,95%	1.187.867.606
15.253.396.000	14.524.435.972	15,08%	-728.960.028
7.219.742.000	7.219.742.000	7,49%	0
5.394.362.000	5.394.362.000	5,60%	0
511.250.000	511.250.000	0,53%	0
1.377.065.000	1.124.878.000	1,17%	-252.187.000
1.101.081.000	1.101.081.000	1,14%	0
1.224.452.000	1.017.731.422	1,06%	-206.720.578
661.854.000	661.854.000	0,69%	0
900.546.000	900.546.000	0,93%	0
2.606.915.000	2.606.915.000	2,71%	0
623.429.000	623.429.000	0,65%	0
96.330.439.000	96.330.439.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2021			
COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	% DIST. DE LOS PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
60.644.214.606	35.585.606.712	58,68%	25.058.607.894
14.524.435.972	1.953.904.088	13,45%	12.570.531.884
7.219.742.000	5.118.730.095	70,90%	2.101.011.905
5.394.362.000	2.037.456.978	37,77%	3.356.905.022
511.250.000	302.336.471	59,14%	208.913.529
1.124.878.000	774.281.000	68,83%	350.597.000
1.101.081.000	0	0,00%	1.101.081.000
1.017.731.422	271.476.052	26,67%	746.255.370
661.854.000	234.353.703	35,41%	427.500.297
900.546.000	489.914.066	54,40%	410.631.934
2.606.915.000	271.300.000	10,41%	2.335.615.000
623.429.000	0	0,00%	623.429.000
96.330.439.000	47.039.359.165		49.291.079.835

Marco Decretado Versus Compromiso

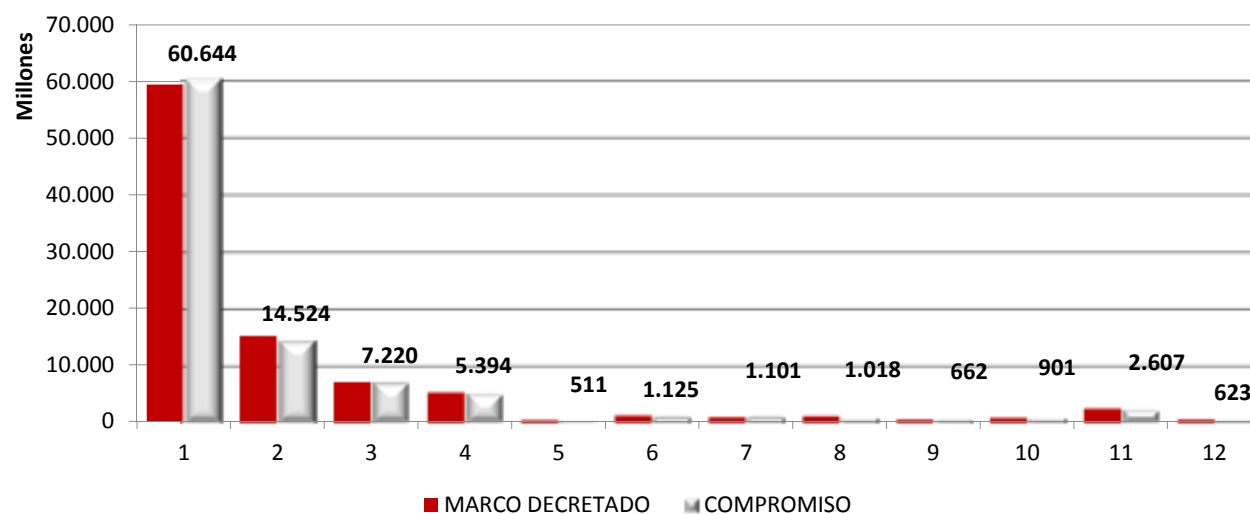


Compromiso Versus Pagos 2021

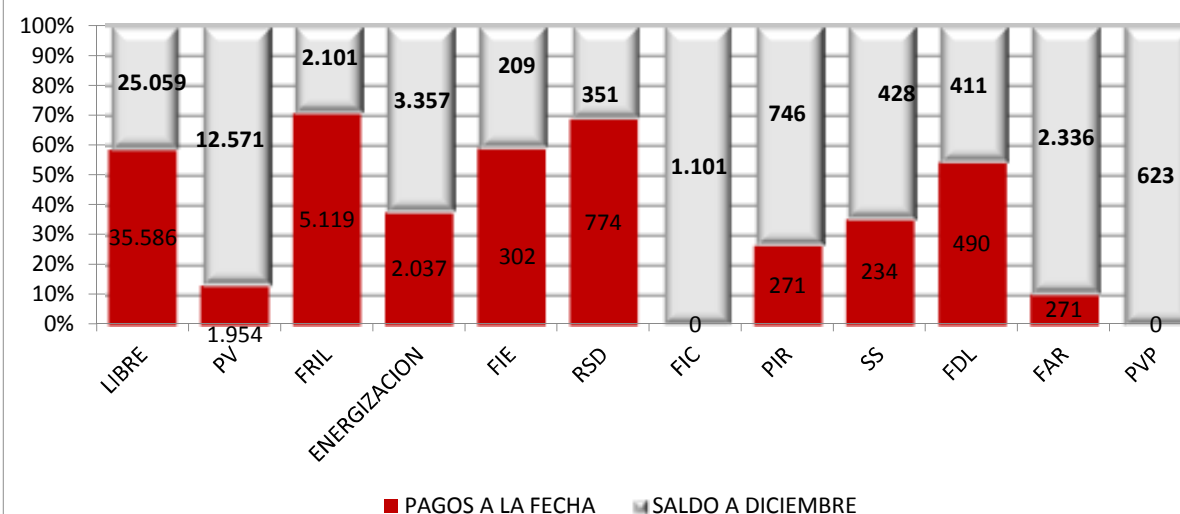

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 de Agosto 2021 - %

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
	COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO AÑOS FUTUROS
TRANSPORTE	102.637.586.429	22,64%	32.779.562.516	20.520.862.575	21%	7.275.888.786	13.244.973.789	49.337.161.338
VIVIENDA	45.142.035.125	9,96%	5.120.023.938	10.921.592.620	11%	8.630.527.292	2.291.065.328	29.100.418.567
EDUCACION Y CULTURA	73.660.239.729	16,25%	23.251.568.374	11.902.870.371	12%	9.966.434.596	1.936.435.775	38.505.800.984
SALUD	57.426.860.995	12,67%	11.560.892.845	8.358.287.977	9%	2.074.685.828	6.283.602.149	37.507.680.173
MULTISECTORIAL	66.233.549.097	14,61%	13.597.423.949	18.365.910.815	19%	8.226.779.248	10.139.131.567	34.198.210.333
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19.815.919.717	4,37%	4.602.957.235	4.198.067.648	4%	3.132.799.673	1.065.267.975	11.014.894.834
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.328.145.354	5,81%	7.334.863.234	6.163.797.948	6%	1.509.658.305	4.654.139.643	12.829.484.172
JUSTICIA	76.160.000	0,02%	0	7.497.000	0%	7.497.000	0	68.663.000
DEPORTE	19.771.129.095	4,36%	8.599.013.899	2.336.987.719	2%	1.403.084.192	933.903.527	8.835.127.477
SILVOAGROPECUARIO	14.396.380.347	3,18%	6.849.381.447	1.563.576.000	2%	479.830.065	1.083.745.935	5.790.369.900
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TU	18.136.352.845	4,00%	7.323.079.660	5.465.988.132	6%	1.827.448.007	3.638.540.125	5.342.045.053
ENERGIA	6.960.690.000	1,54%	0	5.461.631.195	6%	2.104.726.173	3.356.905.022	1.499.058.805
PESCA	2.797.800.000	0,62%	1.520.666.157	1.063.369.000	1%	400.000.000	663.369.000	213.764.843
TOTAL	453.382.848.733	100%	122.539.433.254	96.330.439.000	100%	47.039.359.165	49.291.079.835	234.242.679.479

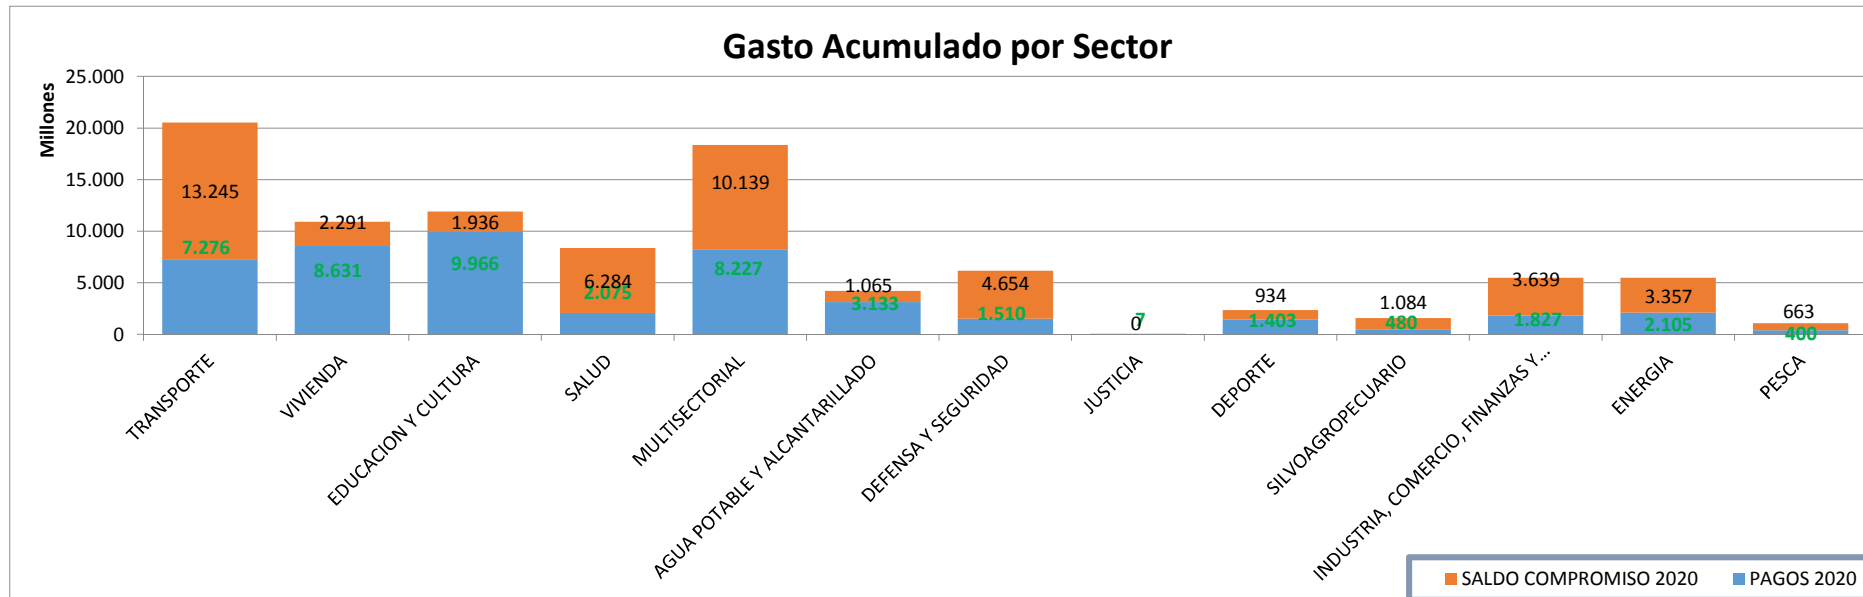




Distribucion por Sub Titulo

Gasto FNDR - 02

Devengado al 31 de Agosto 2021 - %

COSTO TOTAL			FNDR 2021						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO PROXIMOS AÑOS
22	1.250.002.000	0%	123.900.000	803.045.000	520.000.000	0,54%	229.682.750	290.317.250	606.102.000
24	8.720.352.000	2%	0	8.720.352.000	8.720.352.000	9,05%	2.134.183.958	6.586.168.042	0
29	14.633.567.469	3%	1.227.552.821	6.738.362.000	6.170.012.000	6,41%	417.986.932	5.752.025.068	7.236.002.648
31	358.133.765.293	79%	103.530.162.205	60.220.868.000	58.569.994.000	60,80%	36.395.380.498	22.174.613.502	196.033.609.088
33	70.645.161.971	16%	17.657.818.228	19.847.812.000	22.350.081.000	23,20%	7.862.125.027	14.487.955.973	30.366.965.743
TOTAL	453.382.848.733	100%	122.539.433.254	96.330.439.000	96.330.439.000	100%	47.039.359.165	49.291.079.835	234.242.679.479

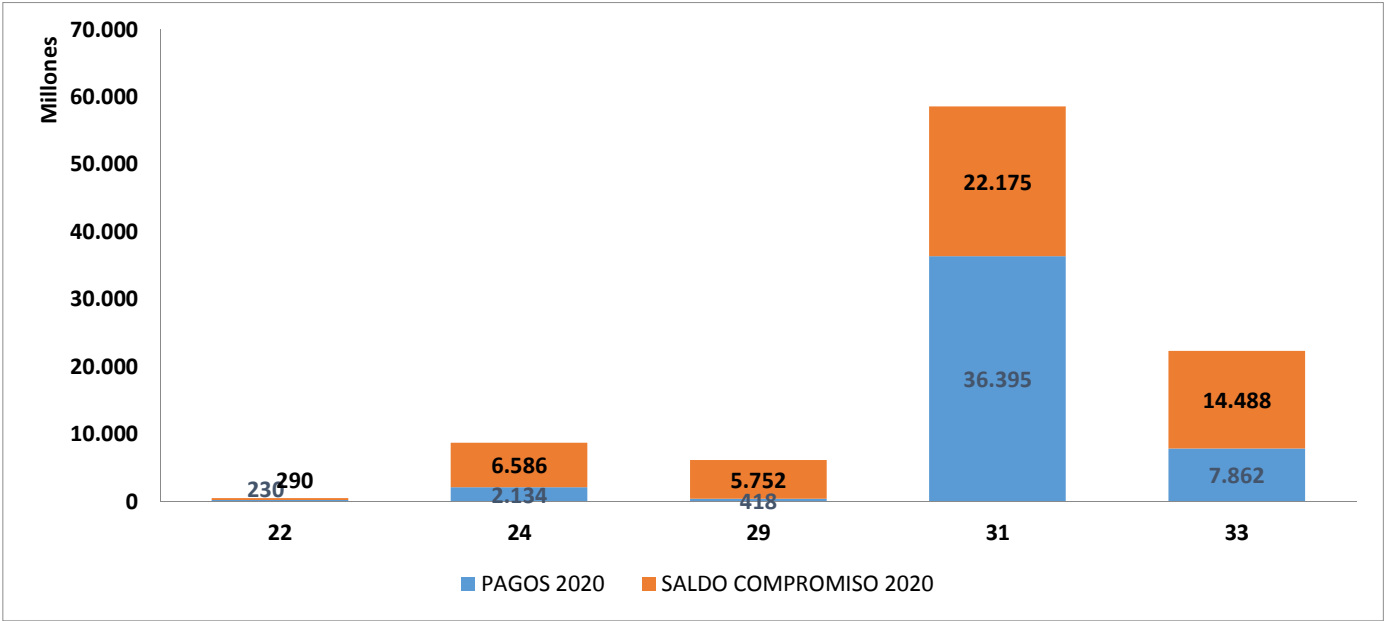

NOTA PARA CONTROL DE FONDOS DEL SUBTITULO 30 SE CREO PROGRAMA 50

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE OSORNO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA	7.805.646.000	6.570.711.562	0	0	0	1.234.934.438	RE	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33)	820.000.000	704.106.657	47.021.488	47.021.488	0	68.871.855	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.370.081.000	1.245.597.880	1.857.540.510	1.735.477.862	122.062.648	4.266.942.610	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.295.526.000	1.000.146.478	1.497.845.430	1.497.845.430	0	797.534.092	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	232.520.067	390.133.135	387.482.042	2.651.093	504.387.798	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	76.160.000	0	7.497.000	7.497.000	0	68.663.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	0	645.639.466	645.639.466	0	3.498.546.534	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR NORTE, OSORNO	1.815.521.000	0	111.972.723	111.972.723	0	1.703.548.277	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	268.356.322	0	268.356.322	268.356.322	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	26.722.517.322	9.753.082.644	4.826.006.074	4.701.292.333	124.713.741	12.143.428.604		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. MOYANO,	167.403.000	0	10.000.000	0	10.000.000	157.403.000	RS	En Licitacion
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	988.704.000	0	10.000.000	0	10.000.000	978.704.000	RS	En Licitacion
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSO	562.400.000	47.479.757	10.000.000	0	10.000.000	504.920.243	RS	En Licitacion
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO, COMUNA DE OSORNO	650.792.000	0	10.000.000	0	10.000.000	640.792.000	RS	En Licitacion
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.369.299.000	47.479.757	40.000.000	0	40.000.000	2.281.819.243		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	50.000.000	0	50.000.000	143.804.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	193.804.000	0	50.000.000	0	50.000.000	143.804.000		
						TOTAL COMUNA DE OSORNO	29.285.620.322	9.800.562.401	4.916.006.074	4.701.292.333	214.713.741	14.569.051.847		
						COMUNA DE PUERTO OCTAY								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO	19.780.000	7.512.000	12.268.000	0	12.268.000	0	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30478036	REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY	1.296.750.373	987.598.930	305.012.869	305.012.869	0	4.138.574	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40013401	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES COMUNA DE PUERTO OCT	460.788.000	77.420.517	382.329.810	380.329.810	2.000.000	1.037.673	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	287.318.524	0	287.318.524	287.318.524	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.064.636.897	1.072.531.447	986.929.203	972.661.203	14.268.000	5.176.247		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0		
						TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.402.343.897	1.072.531.447	1.324.636.203	972.661.203	351.975.000	5.176.247		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134930	CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE	1.005.841.000	917.630.386	74.552.614	74.552.614	0	13.658.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	16.859.700	16.219.730	639.970	0	639.970	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	4.148.000	0	4.148.000	16.382.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	7.800.000	1.700.000	0	1.700.000	10.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	481.879.563	32.639.590	32.639.590	0	15.419.847	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	19.363.000	12.832.500	6.530.500	0	6.530.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	500.000.000	0	204.435.150	204.435.150	0	295.564.850	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	196.602.675	3.397.325	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.316.642.700	1.440.972.179	524.645.824	508.230.029	16.415.795	351.024.697		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR (C33)	694.291.000	0	0	0	0	694.291.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO (C33)	625.991.000	0	0	0	0	625.991.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	0	0	0	516.681.732	RS*	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	7.703.978	0	7.703.978	690.255.022	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	10.000.000	0	10.000.000	4.107.790.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016563	REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA PURRANQUE (C33)	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.731.712.732	0	96.703.978	0	96.703.978	6.635.008.754		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013127	ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO GESTION DE TRANSITO PURRANQUE Y CORTE ALTO	135.500.000	0	0	0	0	135.500.000	RS	Terminado - Financiamiento Sectorial
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	172.431.000	0	172.431.000	0	172.431.000	0	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	307.931.000	0	172.431.000	0	172.431.000	135.500.000		
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.356.286.432	1.440.972.179	793.780.802	508.230.029	285.550.773	7.121.533.451		
						COMUNA DE PUYEHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30067012	REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS	3.101.704.930	3.077.979.670	0	0	0	23.725.260	RS(IN)	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40007052	REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE	26.527.000	15.510.000	11.017.000	1.441.000	9.576.000	0	RS	En Ejecución
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE(C33)	378.086.000	0	9.973.350	1.800.000	8.173.350	368.112.650	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	260.000.000	0	260.000.000	255.390.702	4.609.298	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.766.317.930	3.093.489.670	280.990.350	258.631.702	22.358.648	391.837.910		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	276.551.379	0	90.233.379	0	90.233.379	186.318.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	19.839.684	0	19.839.684	0	19.839.684	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS (C33)	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	RS*	En Licitación
	31	N	FDL	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	RS	En Licitación
	31	N	SS	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	315.923.000	0	100.000.000	0	100.000.000	215.923.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	747.314.063	0	345.073.063	0	345.073.063	402.241.000		
						TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	4.513.631.993	3.093.489.670	626.063.413	258.631.702	367.431.711	794.078.910		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE RIO NEGRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30284622	REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO	731.185.907	668.131.467	628.593	628.593	0	62.425.847	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO (C33)	397.780.901	357.639.153	10.522.218	10.522.218	0	29.619.530	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO, COMUNA RIO NEGRO	175.662.361	154.554.067	21.108.293	16.886.636	4.221.657	1	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF CHIFIN	34.340.000	0	25.000.000	23.870.000	1.130.000	9.340.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	150.000.000	0	150.000.000	99.316.136	50.683.864	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.488.969.169	1.180.324.687	207.259.104	151.223.583	56.035.521	101.385.378		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	39.198.600	0	39.198.600	0	39.198.600	0	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO	593.858.000	0	0	0	0	593.858.000	RS	En Licitación
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	0	0	0	0	569.080.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.202.136.600	0	39.198.600	0	39.198.600	1.162.938.000		
						TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.691.105.769	1.180.324.687	246.457.704	151.223.583	95.234.121	1.264.323.378		
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO	3.749.709.000	3.204.904.217	11.683.051	905.248	10.777.803	533.121.732	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	10.024.577	0	10.024.577	2.550.558.639	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	182.173.933	17.826.067	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.536.937.000	3.231.549.001	221.707.628	183.079.181	38.628.447	3.083.680.371		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
S	31	N	FDL	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	50.000.000	0	50.000.000	551.714.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	601.714.000	0	50.000.000	0	50.000.000	551.714.000		
						TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	7.138.651.000	3.231.549.001	271.707.628	183.079.181	88.628.447	3.635.394.371		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE SAN PABLO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	3.414.573.000	0	2.392.524.034	2.004.588.030	387.936.004	1.022.048.966	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	94.584.430	105.415.570	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.639.473.000	11.729.500	2.605.694.534	2.099.172.460	506.522.074	1.022.048.966		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUC	278.515.442	0	0	0	0	278.515.442	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUC	117.572.149	0	0	0	0	117.572.149	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	396.087.591	0	0	0	0	396.087.591		
						TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	4.035.560.591	11.729.500	2.605.694.534	2.099.172.460	506.522.074	1.418.136.557		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30086815	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO	15.318.985.549	4.736.606.083	0	0	0	10.582.379.466	RE	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY	1.452.174.000	1.344.511.915	0	0	0	107.662.085	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	5.486.962.838	1.018.393.862	1.018.393.862	0	304.258.300	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30448275	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33)	404.079.018	388.107.468	15.971.550	8.621.550	7.350.000	0	RS*	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126279	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO	1.947.625.000	1.942.600.773	5.024.227	0	5.024.227	0	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	3.542.559.000	46.836.000	0	0	0	3.495.723.000	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDA	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE OSORNO	363.763.000	49.084	100.921.155	92.404.000	8.517.155	262.792.761	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT OSORNO	5.579.270.000	0	1.600.000.000	1.410.931.874	189.068.126	3.979.270.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40015603	HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE	103.016.000	59.234.303	31.415.732	31.415.732	0	12.365.965	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	30465788	AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO	329.071.800	0	0	0	0	329.071.800	RS	En Ejecución
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30402378	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO	32.260.000	0	21.716.611	21.716.611	0	10.543.389	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.882.418.367	14.004.908.464	2.793.443.137	2.583.483.629	209.959.508	19.084.066.766		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.149.442	0	52.149.442	0	52.149.442	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	52.149.442	0	52.149.442	0	52.149.442	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30324573	CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU	1.496.798.000	0	0	0	0	1.496.798.000	RS	Convenio en Confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395473	CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33)	1.688.957.000	0	0	0	0	1.688.957.000	RS*	Terminada Cambia Unidad Financiera
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.185.755.000	0	0	0	0	3.185.755.000		
						TOTAL PROVINCIALES	39.120.322.809	14.004.908.464	2.845.592.579	2.583.483.629	262.108.950	22.269.821.766		
						TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	98.543.522.813	33.836.067.349	13.629.938.937	11.457.774.120	2.172.164.817	51.077.516.527		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30080460	CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT	394.331.499	357.098.349	37.233.150	37.233.150	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000		10.000.000	0	10.000.000	39.462.000	RS	En Ejecución
	31	L	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC. VILLA LOS PINOS ALTOS	448.223.000	0	250.546.000	190.602.158	59.943.842	197.677.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE QUEPE Y AVDA. JUAN SOLER MANFREDINI	525.598.000	0	325.977.393	249.876.439	76.100.954	199.620.607	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.304.377.035	4.050.000	1.290.760.218	754.409.362	536.350.856	7.009.566.817	RS	En Ejecución
	31	A	RSD	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	385.858.000	0	385.858.000	385.858.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	725.380.000	234.779.699	127.584.373	127.584.373	0	363.015.928	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	169.194.956	30.805.044	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	11.033.229.534	595.928.048	2.627.959.134	1.914.758.438	713.200.696	7.809.342.352		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO	23.524.000	5.964.000	10.000.000	0	10.000.000	7.560.000	RS	Liquidado
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	0	10.000.000	6.150.000	3.850.000	12.645.000	RS	Liquidado
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30270222	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO	22.000.000	5.964.000	10.000.000	0	10.000.000	6.036.000	RS	Liquidado
	31	L	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.686.063.000	1.007.486	573.429.000	0	573.429.000	2.111.626.514	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	10.000.000	0	10.000.000	919.015.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.452.000	0	10.000.000	0	10.000.000	435.452.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS	5.496.302.000	0	10.000.000	0	10.000.000	5.486.302.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.625.001.000	12.935.486	633.429.000	6.150.000	627.279.000	8.978.636.514		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	10.000.000	0	10.000.000	630.818.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	640.818.000	0	10.000.000	0	10.000.000	630.818.000		
						TOTAL COMUNA DE P. MONTT	21.299.048.534	608.863.534	3.271.388.134	1.920.908.438	1.350.479.696	17.418.796.866		
						COMUNA DE CALBUCO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.207.370.892	54.930.468	54.930.468	0	26.932.532	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	9.889.982.000	169.015.232	850.000.000	700.737.675	149.262.325	8.870.966.768	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30326322	REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO	281.984.000	224.490.200	35.000.000	24.490.200	10.509.800	22.493.800	RS	En Ejecución
	31	L	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	388.423.000	0	388.423.000	388.423.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.165.268.000	0	50.387.617	50.387.617	0	1.114.880.383	RS	En Ejecución
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33)	110.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	77.000.000	RS*	En Ejecución
	31	N	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	217.962.000	0	217.962.000	217.962.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	729.845.000	0	169.091.164	169.091.164	0	560.753.836	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015774	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SAN ANDRES Y LOS TULIPANES	365.318.000	0	185.000.000	142.445.310	42.554.690	180.318.000	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015770	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES	437.544.000	0	48.882.142	46.943.599	1.938.543	388.661.858	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	155.744.794	44.255.206	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.075.559.892	1.600.876.324	2.232.676.391	1.984.155.827	248.520.564	11.242.007.177		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	134.986.422	0	134.986.422	206.720.578	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	885.435.000	0	11.754.400	0	11.754.400	873.680.600	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.227.142.000	0	146.740.822	0	146.740.822	1.080.401.178		
						TOTAL COMUNA DE CALBUCO	16.302.701.892	1.600.876.324	2.379.417.213	1.984.155.827	395.261.386	12.322.408.355		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D		PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE COCHAMO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A		LIBRE	DISEÑO	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	23.800.000	14.500.000	9.300.000	0	9.300.000	0	RS	Rescliada Cambia de Etapa
	31	A		LIBRE	DISEÑO	30328431	CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE	40.280.000	20.740.000	13.160.000	13.160.000	0	6.380.000	RS	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE COCHAMO	1.321.664.194	0	20.620.000	13.184.010	7.435.990	1.301.044.194	RS	En Ejecución
	31	L		LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	15.000.000	0	15.000.000	91.672.600	RS	En Ejecución
	31	L		PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE LLAGUEPE	606.455.904	0	422.019.000	271.476.052	150.542.948	184.436.904	RS	En Ejecución
	33	N		FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	201.896.139	0	201.896.139	201.896.139	0	0	RS**	En Ejecución
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.323.526.237	57.997.400	681.995.139	499.716.201	182.278.938	1.583.533.698		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L		LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA LLANADA GRANDE	122.370.000	0	10.000.000	0	10.000.000	112.370.000	RS	Licitación Adjudicada
ASC	31	L		ENERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GU	868.161.000	0	384.550.000	0	384.550.000	483.611.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	N		LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMO	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	15.000.000	RS	En Licitación
	31	N		ENERGIZACION	EJECUCION	30428675	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMO	617.579.000	0	483.611.000	0	483.611.000	133.968.000	RS	En Licitación
	31	N		LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO	42.500.000	0	10.000.000	0	10.000.000	32.500.000	RS	En Licitación Adjudicada
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.675.610.000	0	898.161.000	0	898.161.000	777.449.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N		LIBRE	EJECUCION	30428523	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO NORTE, COCHAMO	473.976.000	0	0	0	0	473.976.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N		LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS	Convenio en Tramite
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	973.976.000	0	0	0	0	973.976.000		
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	4.973.112.237	57.997.400	1.580.156.139	499.716.201	1.080.439.938	3.334.958.698		
							COMUNA DE FRESIA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A		LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	201.443.501	109.314.514	109.314.514	0	227.561.050	RE	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	957.303.978	260.067.616	260.067.616	0	100.345.406	RS	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA	590.808.430	335.213.608	72.430.113	63.815.489	8.614.624	183.164.709	RS	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION APR EL MAÑO	490.790.000	376.365.503	1.994.384	0	1.994.384	112.430.113	RS	En Liquidación
	31	L		LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	0	236.127.265	236.127.265	0	538.072.735	RS	En Ejecución
	31	N		LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES FRESIA (EL RINCON - RIO LLICO - TEODORO SCHAFER)	239.183.000	0	114.640.798	114.640.798	0	124.542.202	RS	En Ejecución
	31	L		LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33)	866.629.000	0	63.249.918	63.249.918	0	803.379.082	RS*	En Ejecución
	33	N		FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	164.085.808	35.914.192	0	RS**	En Ejecución
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.017.646.495	1.870.326.590	1.057.824.608	1.011.301.408	46.523.200	2.089.495.297		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L		LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	3.000.000	0	3.000.000	916.116.000	RS	Licitación Desierta
	29	L		LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33)	534.844.000	0	0	0	0	534.844.000	RS*	Licitación Adjudicada
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.453.960.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.450.960.000		
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.471.606.495	1.870.326.590	1.060.824.608	1.011.301.408	49.523.200	3.540.455.297		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE FRUTILLAR								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30465246	CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE	163.185.391	163.185.391	0	0	0	0	RS	Terminada
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30077934	CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR	1.461.360.000	1.218.124.258	1.000.000	0	1.000.000	242.235.742	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	105.198.517	82.911.875	53.498.189	29.413.686	40.892.608	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	830.345.185	5.200.000.000	4.900.173.572	299.826.428	615.197.888	RS	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40005972	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTIL	410.792.000	0	230.650.044	230.650.044	0	180.141.956	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.039.883.464	2.316.853.351	5.644.561.919	5.184.321.805	460.240.114	1.078.468.194		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR	218.397.000	0	10.000.000	0	10.000.000	208.397.000	RS	Licitacion Desierta
	31	L	SS	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR	449.572.000	0	227.500.000	0	227.500.000	222.072.000	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	10.000.000	0	10.000.000	415.742.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION RED APR SECTOR CASMA, FRUTILLAR	322.319.000	0	10.000.000	0	10.000.000	312.319.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.416.030.000	0	257.500.000	0	257.500.000	1.158.530.000		
						TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.455.913.464	2.316.853.351	5.902.061.919	5.184.321.805	717.740.114	2.236.998.194		
						COMUNA DE LLANQUIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.497.342.318	3.488.289.637	9.052.681	9.052.681	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40007476	CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE	385.181.000	340.526.632	25.000.000	19.301.186	5.698.814	19.654.368	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	0	37.481.869	21.900.000	15.581.869	44.918.131	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.094.923.318	3.828.816.269	201.534.550	50.253.867	151.280.683	64.572.499		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	678.000	0	678.000	238.105.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	238.783.000	0	678.000	0	678.000	238.105.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016314	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33)	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000		
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000		
						TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.780.156.318	3.828.816.269	202.212.550	50.253.867	151.958.683	1.749.127.499		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	12.963.000	16.356.000	9.541.000	6.815.000	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30465403	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS	27.413.000	10.036.840	15.055.260	15.055.260	0	2.320.900	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY	1.114.527.000	262.693.000	55.000.000	9.360.000	45.640.000	796.834.000	RS(IN)	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40009545	CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33)	526.563.000	525.729.390	833.610	0	833.610	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30422722	CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	653.685.000	150.000.000	114.159.062	114.159.062	0	389.525.938	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS	207.019.010	99.601.553	31.455.270	31.455.270	0	75.962.187	RS	En Liquidación
	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40011698	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES, LOS MUERMOS	115.072.000	0	115.072.000	115.072.000	0	0	RS	Terminada Financieramente
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30463128	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MONTT BARRIO COMERCIAL	37.500.000	24.899.112	12.600.888	9.100.000	3.500.888	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40011005	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO (C33)	351.704.000	73.464.012	278.239.988	277.871.399	368.589	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	0	91.741.178	91.741.178	0	45.908.822	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	890.770.000	0	50.000.000	44.057.271	5.942.729	840.770.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	155.528.796	44.471.204	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.291.222.010	1.159.386.907	980.513.256	872.941.236	107.572.020	2.151.321.847		
						TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	4.291.222.010	1.159.386.907	980.513.256	872.941.236	107.572.020	2.151.321.847		
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	259.031.774	15.017.563	9.484.776	5.532.787	0	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	30485255	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAL	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS	Terminado Financieramente
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	185.287.387	14.712.613	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	621.555.337	259.031.774	362.523.563	342.278.163	20.245.400	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN TEN	834.246.000	0	20.000.000	0	20.000.000	814.246.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ	137.618.000	0	20.000.000	0	20.000.000	117.618.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE	451.210.000	0	20.000.000	0	20.000.000	431.210.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED (C33)	902.195.624	0	376.980.000	0	376.980.000	525.215.624	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.325.269.624	0	436.980.000	0	436.980.000	1.888.289.624		
						TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.946.824.961	259.031.774	799.503.563	342.278.163	457.225.400	1.888.289.624		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D		PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUERTO VARAS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RE	En Liquidacion / En Reevaluacion	
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005578	MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS	258.669.418	195.904.175	60.017.117	60.017.117	0	2.748.126	RS	En Ejecución	
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40001254	MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS	248.242.534	228.806.813	5.636.526	5.636.526	0	13.799.195	RS	En Ejecución	
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30066636	REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA	2.826.817.000	2.256.883.403	1.500.000	0	1.500.000	568.433.597	RS	En Ejecución	
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005278	CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33)	980.817.000	610.418.300	235.999.547	205.288.253	30.711.294	134.399.153	RS*	En Ejecución	
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	85.912.424	0	0	0	0	85.912.424	RS*	Resciliación	
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	400.069.218	80.298.900	0	0	0	319.770.318	RS*	Resciliación	
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	1.237.007.000	4.375.000	315.619.365	315.619.365	0	917.012.635	RS	En Ejecución	
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA	246.000.000	25.043.042	108.043.661	108.043.661	0	112.913.297	RS	En Ejecución	
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	169.970.725	30.029.275	0	RS**	En Ejecución	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.230.470.594	4.478.111.500	926.816.216	864.575.647	62.240.569	3.825.542.878		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	RS*	En Licitación	
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	25.000.000	0	25.000.000	681.257.000	RS	En Licitación	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	906.257.000	0	25.000.000	0	25.000.000	881.257.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	0	0	0	87.200.000	RS	Resciliacion Cambio UT	
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS (C33)	818.000.000	0	0	0	0	818.000.000	RS*	Convenio en Tramite	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	905.200.000	0	0	0	0	905.200.000		
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	11.041.927.594	4.478.111.500	951.816.216	864.575.647	87.240.569	5.611.999.878		
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	7.077.521.000	6.727.964.072	339.841.505	148.223.899	191.617.606	9.715.423	RS	En Ejecución	
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133755	CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33)	9.774.474.000	7.927.334.204	666.796.091	344.452.799	322.343.292	1.180.343.705	RS*	En Ejecución	
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE PTO. MONTT	435.343.000	49.084	73.790.000	73.790.000	0	361.503.916	RS	En Ejecución	
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	3.678.102.000	417.402.781	1.818.079.863	1.439.913.347	378.166.516	1.442.619.356	RS	En Ejecución	
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU	2.050.780.000	0	75.764.155	75.764.155	0	1.975.015.845	RS	En Ejecución	
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014647	MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUER	328.934.956	0	328.934.956	278.934.956	50.000.000	0	RS	En Ejecución	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.345.154.956	15.072.750.141	3.303.206.570	2.361.079.156	942.127.414	4.969.198.245		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
H	31	L	LIBRE	DISEÑO	30437675	CONSTRUCCION INTERTERRAZAS PUERTO MONTT, ETAPA I	511.250.000	0	10.000.000	0	10.000.000	501.250.000	RS	En Licitación	
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	9.000.000	50.000.000	0	50.000.000	2.245.827.000	RE	En Licitación	
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATOS PROVINCIA DE LLA	105.867.000	0	0	0	0	105.867.000	RS*	En Licitación 2022	
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO	2.851.491.706	177.066.265	0	0	0	2.674.425.441	RS	En Licitación	
	29	N	RSD	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	252.187.000	0	0	0	0	252.187.000	RS*	En Licitación	
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	252.189.000	0	0	0	0	252.189.000	RS*	En Licitación	
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PERIODICA CAMINOS VECINALES CALBUCO Y MAULLIN 2020-2021(C33)	900.500.000	0	0	0	0	900.500.000	RS*	En Licitación	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.178.311.706	186.066.265	60.000.000	0	60.000.000	6.932.245.441		
							INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS*	Convenio en Confección 2023	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000		
							TOTAL PROVINCIALES	31.023.466.662	15.258.816.406	3.363.206.570	2.361.079.156	1.002.127.414	12.401.443.686		
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	114.585.980.167	31.439.080.055	20.491.100.168	15.091.531.748	5.399.568.420	62.655.799.944		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE ANCUD														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	126.194.543	34.113.956	29.525.431	4.588.525	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	30.300.000	40.400.000	40.400.000	0	30.800.000	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012136	HABILITACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KM 26 Y 27, COMUA DE ANCUD	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	202.509.245	0	202.509.245	202.509.245	0	0	RS**	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30083781	DIAGNOSTICO FORTIFICACIONES DE ANCUD	9.375.000	0	9.375.000	0	9.375.000	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE A	659.095.000	256.882.357	292.619.714	292.619.714	0	109.592.929	RS	En Ejecución
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	563.580.000	0	485.455.833	485.455.833	0	78.124.167	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	661.606.000	642.350.200	19.034.800	2.415.197	16.619.603	221.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION RED APR PUMANZANO, ANCUD	842.254.000	0	648.640.823	648.640.823	0	193.613.177	RS	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CA	406.672.000	0	266.164.906	266.164.906	0	140.507.094	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40001823	AMPLIACION SALA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS	225.228.000	0	161.004.422	161.004.422	0	64.223.578	RS	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							4.021.533.744	1.055.727.100	2.348.724.699	2.318.141.571	30.583.128	617.081.945		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	N	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO	1.787.342.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1.687.342.000	RS	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							1.787.342.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1.687.342.000		
TOTAL COMUNA DE ANCUD							5.808.875.744	1.055.727.100	2.448.724.699	2.318.141.571	130.583.128	2.304.423.945		
COMUNA DE CASTRO														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485135	CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33)	457.733.000	435.946.053	13.009.452	0	13.009.452	8.777.495	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	336.933.000	191.276.297	72.168.027	56.290.043	15.877.984	73.488.676	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40003369	CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33)	550.000.000	285.558.353	194.701.240	194.701.240	0	69.740.407	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076663	CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33)	564.532.000	447.235.824	117.296.176	110.115.115	7.181.061	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	600.518.000	203.793.037	240.990.257	240.990.257	0	155.734.706	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	219.759.892	2.550.000.000	2.259.781.414	290.218.586	1.009.596.108	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014732	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y URBANOS SECTOR TEN TEN Y LA CHACRAN (C33)	158.000.000	0	145.036.081	145.036.081	0	12.963.919	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							6.597.072.000	1.783.569.456	3.483.201.233	3.006.914.150	476.287.083	1.330.301.311		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA	139.625.000	0	10.000.000	0	10.000.000	129.625.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	579.220.600	0	579.220.600	0	579.220.600	0	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	10.000.000	0	10.000.000	184.318.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	68.425.000	0	68.425.000	0	68.425.000	0	RS*	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							981.588.600	0	667.645.600	0	667.645.600	313.943.000		
TOTAL COMUNA DE CASTRO							7.578.660.600	1.783.569.456	4.150.846.833	3.006.914.150	1.143.932.683	1.644.244.311		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	23.958.165	0	23.958.165	308.955.788	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	53.730.074	61.389.015	59.180.314	2.208.701	428.144.911	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006762	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33)	588.576.000	520.377.383	0	0	0	68.198.617	RS*	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33)	120.000.000	110.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	401.541.190	40.925.312	40.925.312	0	48.144.153	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	54.026.000	30.600.000	21.799.279	21.799.279	0	1.626.721	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	35.568.000	5.000.000	745.682	4.254.318	32.792.000	RS	En Ejecución
	33	A	SS	EJECUCION	30091901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO	516.359.747	499.967.747	16.392.000	16.391.703	297	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	62.399.451	106.355.544	0	106.355.544	2.681.814.005	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	190.000.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	173.632.756	26.367.244	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.281.161.402	2.025.665.892	495.819.315	312.675.046	183.144.269	3.759.676.195		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014051	ADQUISICION DE CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHONCHI URBANO (C33)	191.256.800	0	191.256.800	0	191.256.800	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	191.256.800	0	191.256.800	0	191.256.800	0		
						TOTAL COMUNA DE CHONCHI	6.472.418.202	2.025.665.892	687.076.115	312.675.046	374.401.069	3.759.676.195		
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI	571.440.000	493.221.484	36.666.831	36.666.831	0	41.551.685	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	226.796.203	0	226.796.203	226.796.203	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	798.236.203	493.221.484	263.463.034	263.463.034	0	41.551.685		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	157.191.500	60.074.206	0	60.074.206	1.339.009.294	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.556.275.000	157.191.500	60.074.206	0	60.074.206	1.339.009.294		
						TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.354.511.203	650.412.984	323.537.240	263.463.034	60.074.206	1.380.560.979		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN	466.092.000	63.846.643	152.718.043	141.402.482	11.315.561	249.527.314	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE	93.394.000	55.016.650	38.377.350	38.377.350	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	353.680.553	3.807.631	3.529.297	278.334	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	320.000.000	110.000.000	193.206.488	176.337.052	16.869.436	16.793.512	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	0	14.086.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	18.541.310	511.250.000	302.336.471	208.913.529	280.074.690	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	0	209.570.787	209.570.787	0	151.497.213	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	296.113.396	0	296.113.396	296.113.396	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.725.020.580	607.997.656	1.419.130.195	1.167.666.835	251.463.360	697.892.729		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	15.000.000	0	15.000.000	380.089.000	RS	En Licitación
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN	859.173.000	0	15.000.000	0	15.000.000	844.173.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.254.262.000	0	30.000.000	0	30.000.000	1.224.262.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000		
						TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	4.726.118.580	607.997.656	1.449.130.195	1.167.666.835	281.463.360	2.668.990.729		
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.618.173.447	20.000.000	0	20.000.000	833.927.890	RE	En Estudio Revaluación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006078	CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON	666.831.000	664.441.452	2.389.548	0	2.389.548	0	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	283.189.409	0	283.189.409	283.189.409	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.422.121.746	3.282.614.899	305.578.957	283.189.409	22.389.548	833.927.890		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF PUQUELDON	791.188.000	0	20.874.839	0	20.874.839	770.313.161	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	20.874.839	0	20.874.839	770.313.161		
						TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	5.213.309.746	3.282.614.899	326.453.796	283.189.409	43.264.387	1.604.241.051		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30078798	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN	487.098.000	459.236.777	27.813.223	22.344.966	5.468.257	48.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30480757	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33)	361.002.000	312.229.753	48.772.247	47.376.361	1.395.886	0	RS*	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	0	950.000.000	616.718.082	333.281.918	400.912.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	297.388.491	0	297.388.491	297.388.491	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.496.400.491	771.466.530	1.323.973.961	983.827.900	340.146.061	400.960.000		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI	801.023.000	0	5.000.000	0	5.000.000	796.023.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	801.023.000	0	5.000.000	0	5.000.000	796.023.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	167.671.000	0	167.671.000	0	167.671.000	0	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	19.444.600	0	19.444.600	0	19.444.600	0	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014326	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION AERODROMO (C33)	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	314.986.600	0	187.115.600	0	187.115.600	127.871.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.612.410.091	771.466.530	1.516.089.561	983.827.900	532.261.661	1.324.854.000		
						COMUNA DE QUELLON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO	2.531.139.000	2.121.102.141	179.711.650	179.711.650	0	230.325.209	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.667.420.000	745.531	50.000.000	0	50.000.000	1.616.674.469	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30125850	CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON	302.702.000	232.173.278	62.039.496	62.039.496	0	8.489.226	RS	En Ejecución
	31	N	FDL	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	508.302.000	0	150.000.000	149.311.908	688.092	358.302.000	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40000178	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	0	18.000.000	18.000.000	0	28.350.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	171.883.206	28.116.794	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.255.913.000	2.354.020.950	659.751.146	580.946.260	78.804.886	2.242.140.904		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30488426	CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	2.882.500	7.206.250	0	7.206.250	18.736.250	RS	Licitación Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	378.420.000	0	378.420.000	0	378.420.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	205.275.000	0	205.275.000	0	205.275.000	0	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	5.000.000	0	5.000.000	710.825.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	835.261.000	34.373.680	5.000.000	0	5.000.000	795.887.320	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.163.606.000	37.256.180	600.901.250	0	600.901.250	1.525.448.570		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA (C33)	187.309.000	0	0	0	0	187.309.000	RE*	En Reevaluacion
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	187.309.000	0	0	0	0	187.309.000		
						TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.606.828.000	2.391.277.130	1.260.652.396	580.946.260	679.706.136	3.954.898.474		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE QUEMCHI														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33)	547.411.000	253.005.532	13.887.137	0	13.887.137	280.518.331	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33)	477.979.805	358.482.829	13.887.137	0	13.887.137	105.609.839	RS*	En Liquidación
	31	A	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33)	499.000.000	124.500.000	374.500.000	0	374.500.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI (SALDO)	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS	ARI
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	508.103.000	0	27.256.500	27.256.500	0	480.846.500	RS	En Ejecución
S	31	L	FDL	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	508.103.000	0	150.000.000	150.000.000	0	358.103.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	140.004.985	59.995.015	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							4.126.654.805	1.959.994.133	779.530.774	317.261.485	462.269.289	1.387.129.898		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RE	124.725.185	0	124.725.185	0	124.725.185	0	RS*	En Licitación
	29	N	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RE	145.597.000	0	145.597.000	0	145.597.000	0	RS*	En Licitación
	31	N	FDL	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE (C33)	600.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	450.000.000	RS*	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							870.322.185	0	420.322.185	0	420.322.185	450.000.000		
INICIATIVAS NUEVAS														
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000	RS	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							167.348.000	0	0	0	0	167.348.000		
TOTAL COMUNA DE QUEMCHI							5.164.324.990	1.959.994.133	1.199.852.959	317.261.485	882.591.474	2.004.477.898		
COMUNA DE QUINCHAO														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC	829.058.000	730.000	35.000.000	0	35.000.000	793.328.000	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33)	367.393.000	0	147.391.383	147.391.383	0	220.001.617	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	157.671.635	42.328.365	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							1.396.451.000	730.000	382.391.383	305.063.018	77.328.365	1.013.329.617		
INICIATIVAS NUEVAS														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007527	ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES	162.546.000	139.216.000	0	0	0	23.330.000	RS	Convenio en Confección
	31	N	FDL	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ISLA MEULIN, QUINCHAO	155.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	55.000.000	RS	Convenio en Confección
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							317.546.000	139.216.000	100.000.000	0	100.000.000	78.330.000		
TOTAL COMUNA DE QUINCHAO							1.713.997.000	139.946.000	482.391.383	305.063.018	177.328.365	1.091.659.617		
PROVINCIALES														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA	1.528.367.000	527.224.353	14.847.608	14.847.608	0	986.295.039	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.016.128.000	82.700.000	1.602.590.841	0	1.602.590.841	330.837.159	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33)	1.298.249.800	798.004.491	42.043.034	0	42.043.034	458.202.275	RS*	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							4.842.744.800	1.407.928.844	1.659.481.483	14.847.608	1.644.633.875	1.775.334.473		
INICIATIVAS NUEVAS														
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	RS	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000		
TOTAL PROVINCIALES							9.297.587.800	1.407.928.844	1.659.481.483	14.847.608	1.644.633.875	6.230.177.473		
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE							59.549.041.956	16.076.600.624	15.504.236.660	9.553.996.316	5.950.240.344	27.968.204.672		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHAITEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	72.307.000	53.675.240	53.675.240	0	11.824.760	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	23.100.000	166.557.000	148.450.000	18.107.000	301.745.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	259.720.320	0	259.720.320	259.720.320	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	888.929.320	95.407.000	479.952.560	461.845.560	18.107.000	313.569.760		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO (C33)	534.255.000	0	269.042.762	0	269.042.762	265.212.238	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	534.255.000	0	269.042.762	0	269.042.762	265.212.238		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITEN	301.405.000	0	301.405.000	0	301.405.000	0	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	301.405.000	0	301.405.000	0	301.405.000	0		
						TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.724.589.320	95.407.000	1.050.400.322	461.845.560	588.554.762	578.781.998		
						COMUNA DE FUTALEUFU								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	118.268.328	0	118.268.328	0	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.900.581.000	3.439.918.627	460.662.373	0	460.662.373	0	RS(RE)	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU	703.415.000	563.024.010	34.834.406	34.834.406	0	105.556.584	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	40006627	REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33)	281.260.005	196.693.686	84.566.319	84.566.319	0	0	RS*	Terminado
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33)	126.058.000	0	50.000.000	20.952.000	29.048.000	76.058.000	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	144.509.794	55.490.206	0	RS**	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	74.000.000	19.000.000	0	19.000.000	25.160.000	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.273.698.383	8.099.592.373	967.331.426	284.862.519	682.468.907	206.774.584		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	38.279.732	0	34.928.000	0	34.928.000	3.351.732	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	17.102.368	0	12.562.000	0	12.562.000	4.540.368	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	51.401.000	0	51.401.000	0	51.401.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	106.783.100	0	98.891.000	0	98.891.000	7.892.100		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE HUALAIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S-PV	31	A	PV	EJECUCION	30311722	REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN	647.737.730	553.325.273	94.412.457	77.444.509	16.967.948	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33)	231.709.000	217.737.229	6.728.348	0	6.728.348	7.243.423	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33)	364.878.000	356.421.271	8.456.729	0	8.456.729	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO	657.583.000	0	210.573.893	210.573.893	0	447.009.107	RS	En Ejecución
AS	31	L	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA	474.773.000	0	67.269.195	67.269.195	0	407.503.805	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	142.611.509	0	142.611.509	0	142.611.509	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.519.292.239	1.127.483.773	530.052.131	355.287.597	174.764.534	861.756.335		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO	33.986.000	0	10.000.000	0	10.000.000	23.986.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO	33.986.000	0	10.000.000	0	10.000.000	23.986.000	RS	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	67.972.000	0	20.000.000	0	20.000.000	47.972.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30471865	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33)	101.104.000	0	0	0	0	101.104.000		RS vencido - debe revaluar
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	156.403.836	0	156.403.836	0	156.403.836	0	RS*	Convenio en Confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	308.862.071	0	308.862.071	0	308.862.071	0	RS*	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	566.369.907	0	465.265.907	0	465.265.907	101.104.000		
						TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	3.153.634.146	1.127.483.773	1.015.318.038	355.287.597	660.030.441	1.010.832.335		
						COMUNA DE PALENA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	503.235.568	1.350.000.000	1.153.153.521	196.846.479	718.365.432	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30116040	CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL	43.998.000	35.173.080	8.824.920	0	8.824.920	0	RS	En Liquidación
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS	Terminado
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33)	68.106.000	47.522.650	13.923.131	13.923.131	0	6.660.219	RS*	En Ejecución
PV	31	N	PV	PREFACTIBILIDA	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	814.000.000	0	233.284.932	39.500.000	193.784.932	580.715.068	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	179.859.328	20.140.672	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.898.008.000	585.931.298	2.006.335.983	1.586.738.980	419.597.003	1.305.740.719		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	622.243.006	86.215.994	0	86.215.994	544.968.000	RS(RE)	En Licitación
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33)	130.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	103.000.000	RS*	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.383.427.000	622.243.006	113.215.994	0	113.215.994	647.968.000		
						TOTAL COMUNA DE PALENA	5.281.435.000	1.208.174.304	2.119.551.977	1.586.738.980	532.812.997	1.953.708.719		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	9.788.091.000	133.735.539	3.258.000.000	9.643.497	3.248.356.503	6.396.355.461	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33)	4.990.418.000	4.853.909.931	136.508.069	0	136.508.069	0	RS*	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	977.479.734	1.422.520.266	1.279.460.793	143.059.473	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30447539	DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33)	140.366.668	140.366.668	0	0	0	0	RS*	Terminado
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	77.930.465	29.955.535	0	29.955.535	0	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	379.678.401	18.361.599	0	18.361.599	0	RS*	En Ejecución
S-PV	31	L	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	0	4.158.237.821	133.432.507	4.024.805.314	12.142.076.179	RS	En Ejecución
PV	31	N	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	10.017.216	3.813.751.821	206.504.857	3.607.246.964	24.876.072.963	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.824.957.668	6.573.117.954	12.837.335.111	1.629.041.654	11.208.293.457	43.414.504.603		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480167	ADQUISICION LANCHAS POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33)	237.746.000	0	0	0	0	237.746.000		RS Vencido
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30398377	ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33)	33.689.000	0	0	0	0	33.689.000		RS Vencido
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.439.926.000	0	0	0	0	1.439.926.000		
						TOTAL PROVINCIALES	64.264.883.668	6.573.117.954	12.837.335.111	1.629.041.654	11.208.293.457	44.854.430.603		
						TOTAL PROVINCIA DE PALENA	83.805.023.617	17.103.775.404	18.088.827.874	4.317.776.310	13.771.051.564	48.612.420.339		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						REGIONALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.185.189.000	3.008.590.769	13.358.810	13.358.810	0	163.239.421	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	387.114.086	19.279.420	144.711.465	69.464.483	75.246.982	223.123.201	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	668.312.499	334.455.949	273.238.130	263.956.130	9.282.000	60.618.420	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	3.212.779.000	0	3.212.779.000	1.385.169.978	1.827.609.022	0	RS***	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30460140	CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33)	3.712.267.936	3.549.833.203	157.984.521	157.984.521	0	4.450.212	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN Z	661.135.000	0	661.135.000	0	661.135.000	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PRIVADO	2.495.654.000	0	2.495.654.000	749.013.980	1.746.640.020	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	2.350.784.000	0	2.350.784.000	0	2.350.784.000	0	RS***	En Ejecución
	33	A	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA REPOSICION 07 CARROS MULTIPROPOSITO, 02 ESPECIALIDAD Y 01 CARRO A	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	13.900.000	200.000.000	175.730.750	24.269.250	136.100.000	RS*	En Ejecución
	33	A	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	271.300.000	2.335.615.000	0	RS**	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021 (C33)	2.028.090.000	0	1.350.000.000	1.076.598.790	273.401.210	678.090.000	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	933.842.442	0	933.842.442	0	933.842.442	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	25.092.082.963	6.926.059.341	16.900.402.368	4.162.577.442	12.737.824.926	1.265.621.254		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA REG. DE LOS LAGOS,	613.500.000	0	30.675.000	0	30.675.000	582.825.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADMINISTRACIO	996.652.000	0	0	0	0	996.652.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMATICA Y DIGITAL POLICIAL LOS LA	539.595.000	0	0	0	0	539.595.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION DE LOS LAGOS(C33)	531.990.000	0	0	0	0	531.990.000	RS*	En Licitación
	31	N	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIO NORTE Y PIR	206.226.000	0	86.226.000	0	86.226.000	120.000.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES UNIDADES Y DESTACAMENTO DE LA REGION DE LOS LA	1.301.999.993	0	1.301.999.993	0	1.301.999.993	0	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS	3.350.500.000	0	40.000.000	0	40.000.000	3.310.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.540.462.993	0	1.458.900.993	0	1.458.900.993	6.081.562.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	0	0	5.484.512.000	RS	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL IPS - CHILEATIENDE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	RS*	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LC	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Convenio en confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DET. DE BRECHAS A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	0	0	0	241.133.000	RS	Base en Licitación
	22	N	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33)	413.944.000	0	200.000.000	0	200.000.000	213.944.000	RS*	Convenio en confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.464.589.000	0	250.000.000	0	250.000.000	6.214.589.000		
						TOTAL REGIONAL	39.097.134.956	6.926.059.341	18.609.303.361	4.162.577.442	14.446.725.919	13.561.772.254		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
PRESUPUESTO PROGRAMAS						FOMENTO								
						PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
R	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.500.000.000	486.631.000	20.381.696	466.249.304	13.369.000	RS**	En Ejecución
R	33	N	LIBRE	CORFO	40033084	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO PATAGONIA COSTA	2.082.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.080.000.000	RS**	Tramite en SUBDERE-DIPRES
R	33	N	LIBRE	CORFO	40031184	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUST	699.800.000	0	2.000.000	0	2.000.000	697.800.000	RS**	Tramite en SUBDERE-DIPRES
R	33	N	LIBRE	SEREMI AGRICU	40015235	REACTIVACION TECNICO COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS REGION DE LOS	398.180.000	0	3.000.000	0	3.000.000	395.180.000	RS**	Tramite en SUBDERE-DIPRES
R	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIACIONES ASOCIATIVOS	500.000.000	0	469.200.000	0	469.200.000	30.800.000	RS**	Tramite en SUBDERE-DIPRES
R	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	422.776.000	0	422.776.000	77.224.000	RS**	Tramite en SUBDERE-DIPRES
R	33	N	LIBRE	FUND. CENTRO	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE EMPREN	1.500.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	RS**	Tramite en SUBDERE-DIPRES
R	33	A	LIBRE	FUNCHI	40025247	RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE MICROEMPRESAS FAMILIARES	1.000.000.000	52.765.000	947.235.000	947.235.000	0	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FOSIS	40025197	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR INFORMAL REGION DE LOS LAGOS	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	1.296.000	748.704.000	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FUNDACION ART	40025326	RECUPERACION ECONOMICA DE LA ARTESANIA TRADICIONAL DE LA REGION DE LOS LAGOS	250.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	151.571.000	0	0	0	76.823.750	RS**	En Ejecución
						TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	10.911.398.750	2.714.336.000	4.072.842.000	1.208.912.696	2.863.929.304	4.121.196.750		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
AS	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40019477	TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYMES	1.000.000.000	880.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019474	PROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA MUJERES EMP. SECTOR ALGUERO	120.000.000	7.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019475	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CAPACITACION Y RECONVERSION LABORAL PARA ALGUERO	150.000.000	13.000.000	137.000.000	137.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019379	PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEMERSALES	300.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD (S)	505.000.000	20.000.000	18.250.000	8.867.830	9.382.170	466.750.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019469	REPOSICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	150.000.000	20.000.000	130.000.000	850.000	129.150.000	0	RS**	En Ejecución
	33	N	RSD	SEREMI DE MED	40023036	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TORNO A	235.000.000	0	205.000.000	0	205.000.000	30.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPREDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS (S)	130.000.000	10.000.000	110.000.000	2.000.000	108.000.000	10.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION APOYO A LA REINSERCCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD (S)	200.000.000	3.999.977	0	0	0	196.000.023	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SEREMI VIVIEND	40019485	TRANSF. MEJOR. DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	20.000.000	0	0	0	1.280.000.000	RS**	En Ejecución
						TOTAL ACUERDO SOCIAL	4.090.000.000	1.173.999.977	933.250.000	481.717.830	451.532.170	1.982.750.023		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
ASC	33	A	LIBRE	FUDEA-SERNATU	40022229	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	322.577.000	100.000.000	222.577.000	742.733.861	RS**	En Ejecución
						TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	434.689.139	322.577.000	100.000.000	222.577.000	742.733.861		
						PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
PV	33	A	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA	203.000.000	184.613.000	501.000	0	501.000	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341329	TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC	309.000.000	301.181.000	7.719.000	6.961.000	758.000	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA	190.000.000	189.316.581	0	0	0	683.419	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30341175	PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV	600.000.000	296.299.083	1.600.000	1.138.214	461.786	302.100.917	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30341173	TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECU	450.000.000	294.207.260	50.000.000	0	50.000.000	105.792.740	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC	530.000.000	296.632.948	135.000.000	0	135.000.000	98.367.052	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	126.296.000	37.906.000	595.404	37.310.596	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	30.782.000	9.349.000	8.799.748	549.252	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SERNATUR	30337226	TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE	1.275.000.000	1.249.784.000	23.000.000	1.135.240	21.864.760	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE BIEN	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	325.273.000	102.823.000	6.230.014	96.592.986	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL PATAGONIA VERDE	4.751.500.000	3.601.752.679	367.898.000	24.859.620	343.038.380	514.576.321		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
PROGRAMAS DE ARRASTRE														
	33	A	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN	202.400.000	37.349.999	80.000.000	0	80.000.000	85.050.001	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	40014803	PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA	764.464.240	219.937.838	287.431.000	0	287.431.000	257.095.402	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30378428	PROGRAMA SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA PARA LA CONSOLIDACION DE LA TERCERA	500.000.192	479.084.192	20.916.000	0	20.916.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30433775	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS	500.000.192	495.707.192	4.293.000	0	4.293.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	481.749.364	16.000.000	264.077	15.735.923	64.778.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS	400.000.000	181.514.893	80.000.000	0	80.000.000	138.485.107	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	2.006.500.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE	624.828.757	317.817.757	235.053.000	7.460.000	227.593.000	71.958.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN	2.212.769.231	308.004.725	409.096.000	3.000.000	406.096.000	1.495.668.506	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	25.051.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30440729	PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES	326.826.504	308.425.504	0	0	0	18.401.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	184.999.928	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAPESCA	30343724	PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016	1.579.035.233	1.336.907.233	215.851.000	200.350.938	15.500.062	26.277.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL	900.000.000	630.041.157	57.524.000	0	57.524.000	212.434.843	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	51.125.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	COMISION NACIONAL DE DESARROLLO	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.184.780.439	539.729.000	268.681.684	271.047.316	275.490.561	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	140.492.250	32.338.000	1.500.000	30.838.000	18.787.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE BIENESTAR SOCIAL	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	269.146.592	305.000.000	96.196.926	208.803.074	625.853.408	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FUNCHI	40016769	TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR	1.000.000.000	580.625.000	419.375.000	50.000.000	369.375.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES	230.000.000	228.800.000	1.200.000	0	1.200.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPA	233.158.000	226.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.158.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULT	327.800.000	90.000.000	236.470.000	0	236.470.000	1.330.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERV. SALUD OS	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAG. PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, Provincia	200.000.000	84.385.968	80.794.000	8.759.458	72.034.542	34.820.032	RS**	En Ejecución
PROGRAMAS DE ARRASTRE							17.955.405.474	9.233.072.686	3.125.070.000	640.213.083	2.484.856.917	5.597.262.788		
PROGRAMAS NUEVOS														
	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40026513	PROGRAMA DE REACTIVACION Y CAPACITACION INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCU	49.960.000	0	0	0	0	49.960.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA DE PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	0	20.000.000	0	20.000.000	302.800.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	COMISION DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION DE LO	2.040.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	1.995.000.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Y POSICIONAMIENTO PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVEN	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO, ULTIMA	14.980.000.000	0	19.314.000	0	19.314.000	14.960.686.000	RS**	En Ejecución
	33	N	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.101.081.000	0	1.101.081.000	0	1.101.081.000	0	RS**	En Ejecución
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							18.593.841.000	0	1.185.395.000	0	1.185.395.000	17.408.446.000		
TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO							57.802.145.224	17.157.850.481	10.007.032.000	2.455.703.229	7.551.328.771	30.366.965.743		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 02 2021							453.382.848.733	122.539.433.254	96.330.439.000	47.039.359.165	49.291.079.835	234.242.679.479		
PROGRAMAS FET														
	30	N	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS NIVEL PREFIA	359.099.000	0	30.000.000	0	30.000.000	329.099.000	RS**	En Ejecución
ASC-R	30	N	LIBRE	INDAP	40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PA	800.000.000	0	614.902.000	0	614.902.000	185.098.000	RS**	En Ejecución
ASC-R	30	N	LIBRE	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	493.962.000	0	493.962.000	6.038.000	RS**	En Ejecución
	30	N	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	0	507.000.000	0	507.000.000	779.000.000	RS**	En Ejecución
	30	N	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZA	1.300.000.000	0	399.038.000	0	399.038.000	900.962.000	RS**	En Ejecución
TOTAL PROGRAMAS FET							4.245.099.000	0	2.044.902.000	0	2.044.902.000	2.200.197.000		
PROGRAMAS FET														
ASC	33	N	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSF. FINAN. DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGIO	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	En Tramite CGR
AS	24	N	LIBRE	SENAMA	40024008	PREVEN. PROGR. MEJOR. INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES (S)	474.000.000	0	474.000.000	0	474.000.000	0	RS**	Recursos Transferidos
AS	24	N	LIBRE	SENAMA	40015477	PREVENCION PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS REGION DE LOS LAGOS (S)	456.000.000	0	456.000.000	0	456.000.000	0	RS**	Recursos Transferidos
TOTAL PROGRAMAS FET							1.178.000.000	0	1.178.000.000	0	1.178.000.000	0		

PLAN
S=CONVENIO DE SALUD
H=CONVENIO CIUDADES MAS HUMANAS
P=PATAGONIA VERDE
AS=ACUERDO SOCIAL
ASC=ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO
R=PROGRAMA DE REACTIVACION

RATE
RS=RECOMENDACION TECNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACION TECNICA CIRCULAR 31
RS**=RECOMENDACION POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACION POR SUBSIDIO
RE=REVALUACION
R=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
