





**GOBIERNO  
REGIONAL DE  
LOS LAGOS**  
*Acción de Futuro*

## ESTADO SITUACION FNDR 02 - OCTUBRE 2021 DEVENGADO




## Marco Decretado FNDR - 02 al 31 Octubre 2021

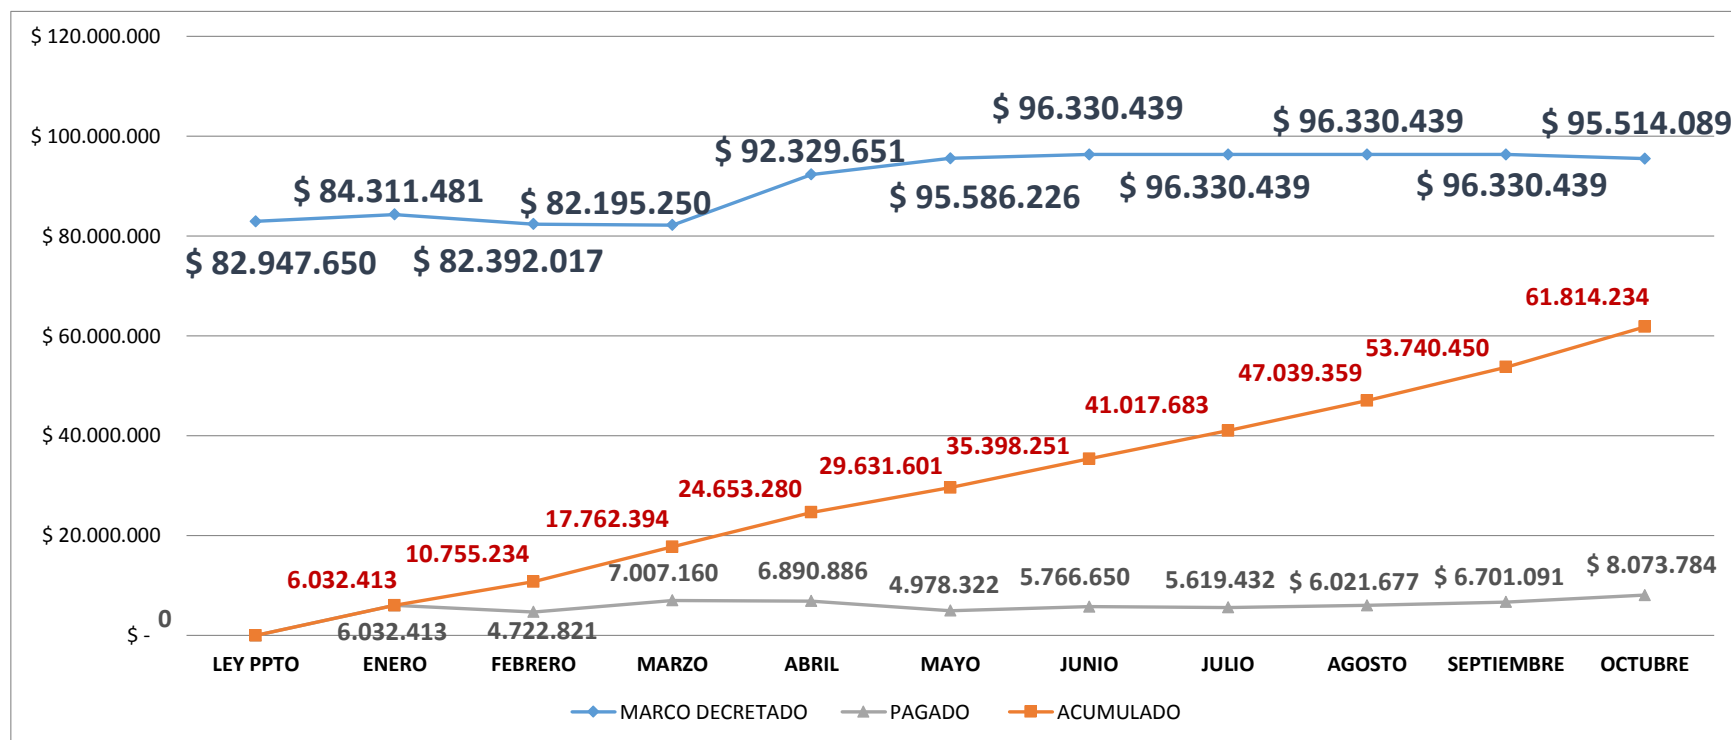

## Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02


### Devengado al 31 Octubre 2021 - %

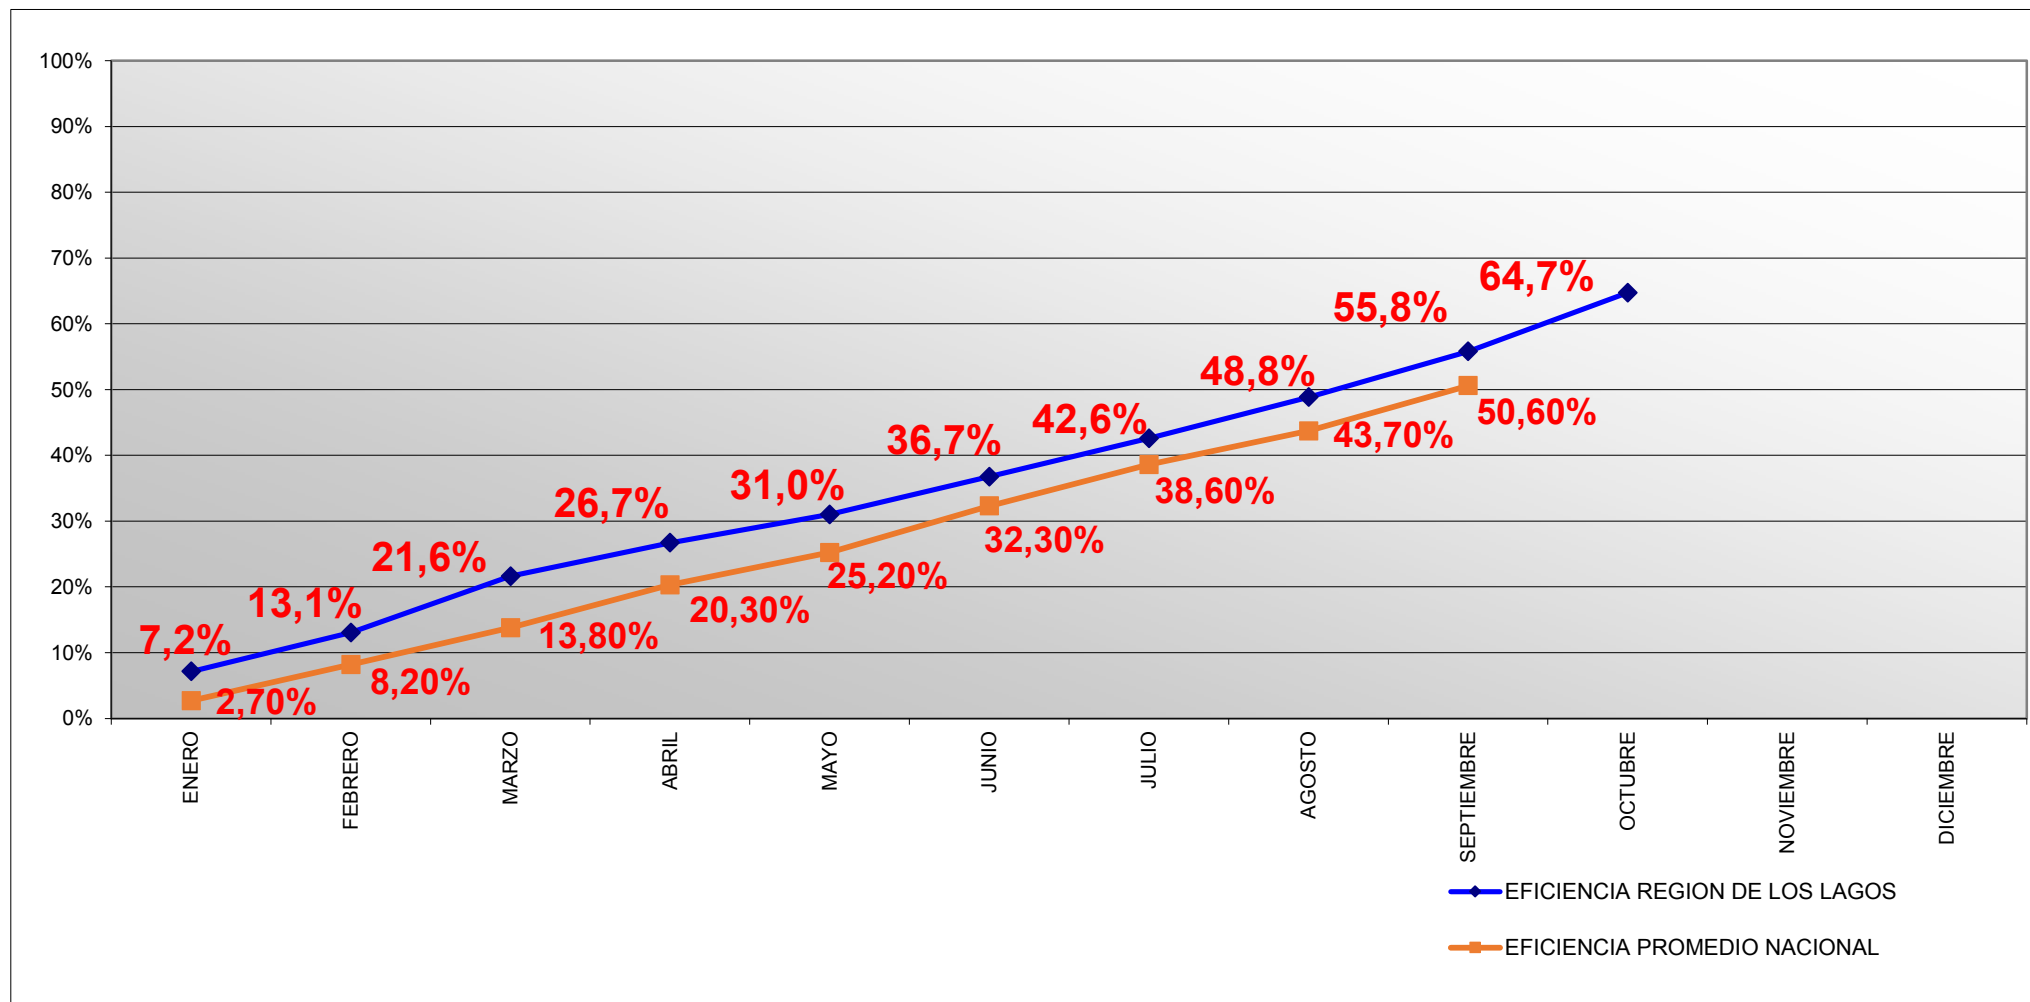



# Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre 2021 – %

	COSTO TOTAL		FNDR 2021						
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO	99.205.654.005	22%	33.837.097.349	15.135.454.383	16%	14.329.869.974	805.584.409	94,68%	50.233.102.273
LLANQUIHUE	114.675.440.872	25%	31.439.080.055	21.697.908.079	23%	18.924.465.429	2.773.442.650	87,22%	61.538.452.738
CHIOLOE	59.075.103.493	13%	16.076.600.624	15.176.255.142	16%	11.368.874.223	3.807.380.919	74,91%	27.822.247.727
PALENA	83.693.290.050	19%	17.103.775.404	17.414.332.836	18%	6.332.377.157	11.081.955.679	36,36%	49.175.181.810
REGIONAL	37.867.618.529	8%	6.926.059.341	16.480.893.560	17%	6.001.829.736	10.479.063.824	36,42%	14.460.665.628
FOMENTO	57.749.193.224	13%	17.157.850.481	9.609.245.000	10%	4.856.817.501	4.752.427.499	50,54%	30.590.420.743
TOTAL	452.266.300.173	100%	122.540.463.254	95.514.089.000	100%	61.814.234.020	33.699.854.980		233.820.070.919

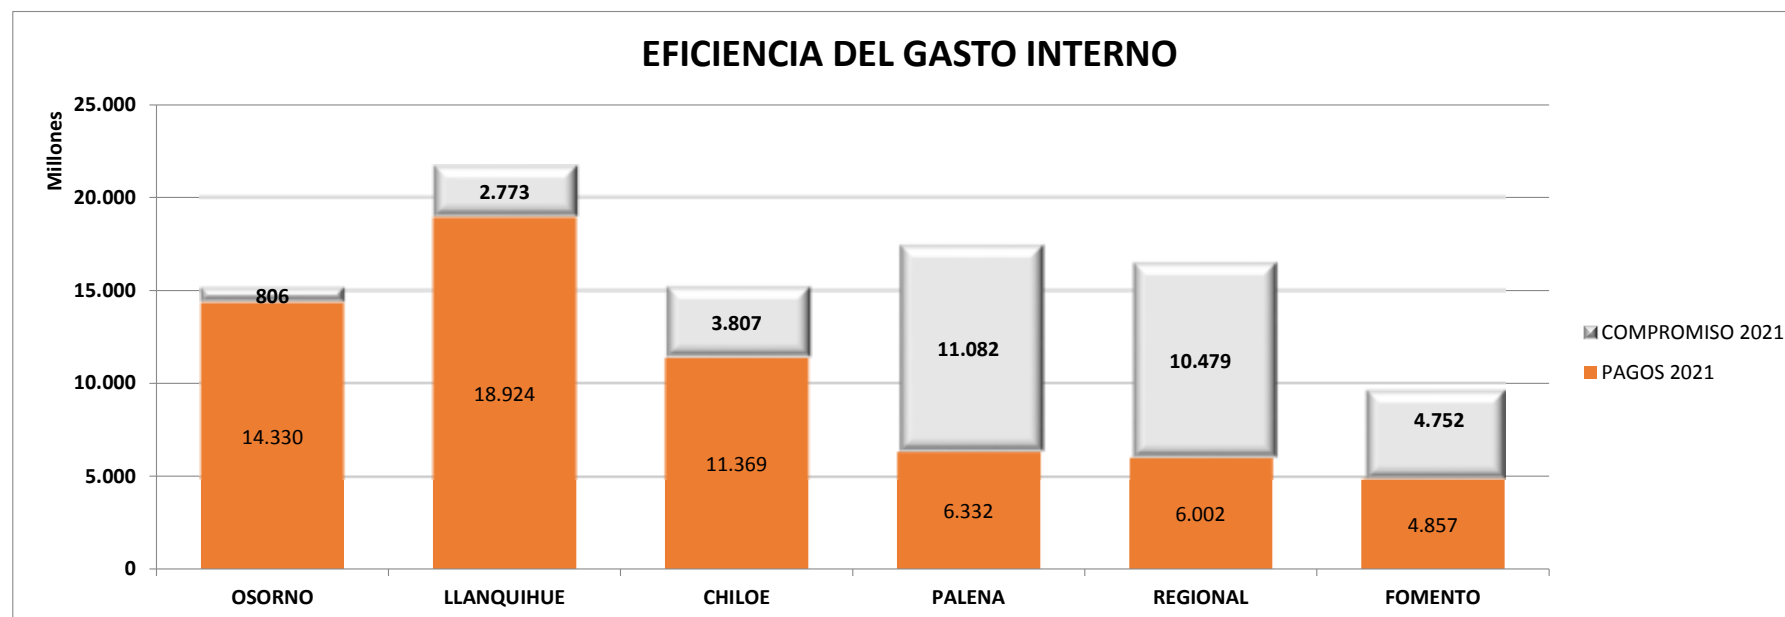




## Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

### Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre 2021 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO	14	39.363.650.827	40%	14.004.908.464	3.521.964.515	23%	3.023.365.305	498.599.210	85,84%	21.836.777.848
OSORNO	14	29.285.620.322	30%	9.800.562.401	6.230.509.067	41%	6.180.509.067	50.000.000	99,20%	13.254.548.854
PTO. OCTAY	5	2.417.978.614	2%	1.072.531.447	991.333.593	7%	991.333.593	0	100,00%	354.113.574
PURRANQUE	17	9.247.038.240	9%	1.442.002.179	752.116.383	5%	673.116.383	79.000.000	89,50%	7.052.919.678
PUYEHUE	9	4.456.706.935	4%	3.093.489.670	662.624.145	4%	546.638.645	115.985.500	82,50%	700.593.120
RIO NEGRO	8	2.580.592.270	3%	1.180.324.687	207.710.052	1%	168.905.430	38.804.622	81,32%	1.192.557.531
SAN JUAN DE LA COSTA	5	7.845.023.626	8%	3.231.549.001	235.096.133	2%	225.071.556	10.024.577	95,74%	4.378.378.492
SAN PABLO	5	4.009.043.171	4%	11.729.500	2.534.100.495	17%	2.520.929.995	13.170.500	99,48%	1.463.213.176
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>99.205.654.005</b>	<b>100%</b>	<b>33.837.097.349</b>	<b>15.135.454.383</b>	<b>100%</b>	<b>14.329.869.974</b>	<b>805.584.409</b>	<b>94,68%</b>	<b>50.233.102.273</b>

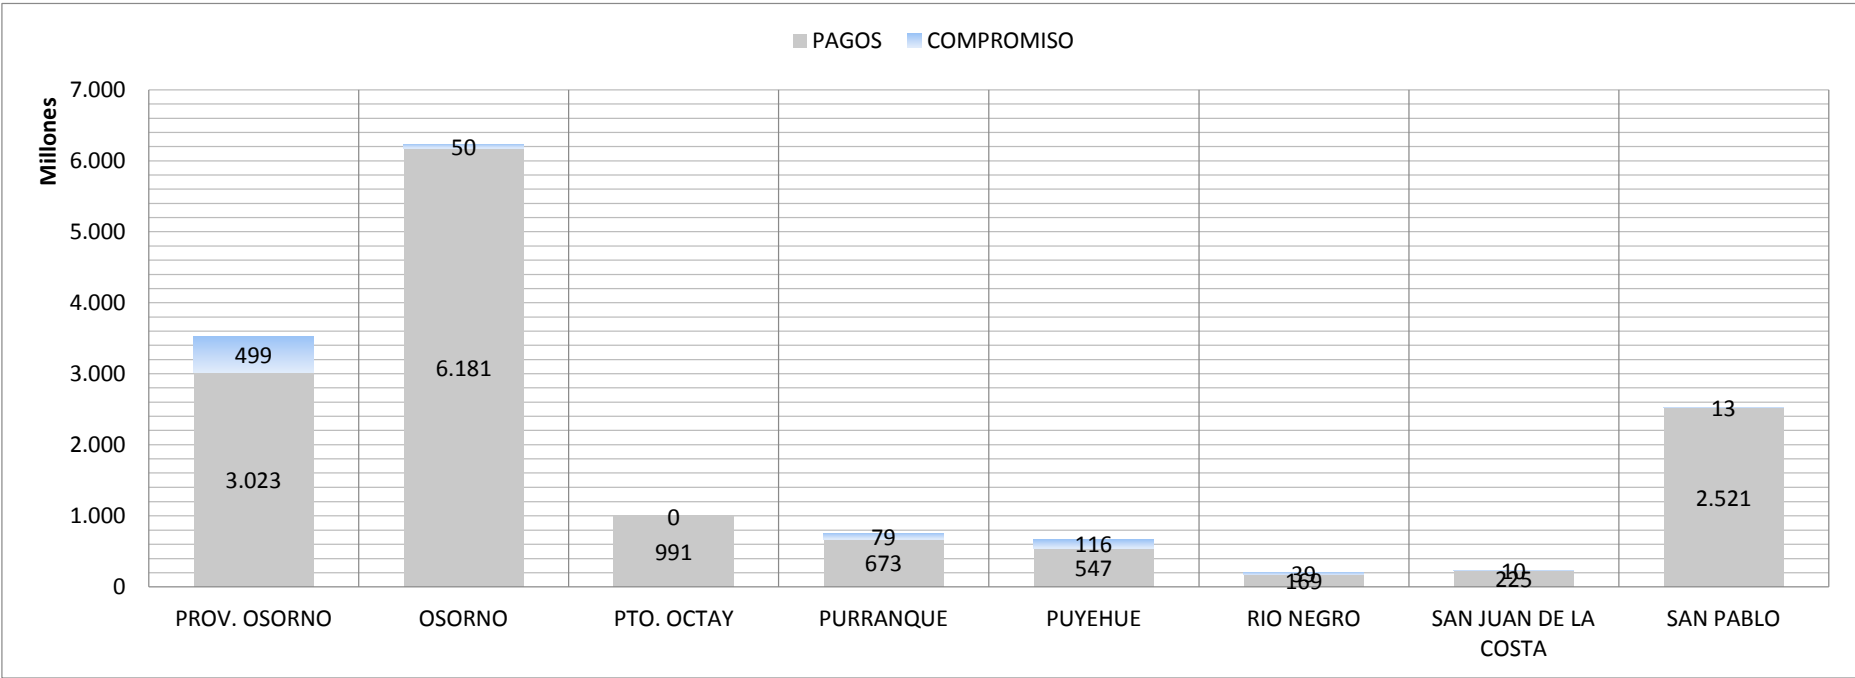






## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

### Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE	12	30.973.466.662	27%	15.258.816.406	3.346.389.790	15%	2.836.707.169	509.682.621	84,77%	12.368.260.466
CALBUCO	13	16.258.446.686	14%	1.600.876.324	3.563.765.558	16%	3.412.279.136	151.486.422	95,75%	11.093.804.804
COCHAMO	10	4.966.732.237	4%	57.997.400	1.538.420.149	7%	632.582.694	905.837.455	41,12%	3.370.314.688
FRESIA	11	6.435.692.303	6%	1.870.326.590	1.533.479.522	7%	1.394.864.898	138.614.624	90,96%	3.031.886.191
FRUTILLAR	10	10.082.677.722	9%	2.316.853.351	5.886.131.575	27%	5.583.775.681	302.355.894	94,86%	1.879.692.796
LLANQUIHUE	6	5.641.863.450	5%	3.828.816.269	72.896.050	0%	67.314.181	5.581.869	92,34%	1.740.151.131
LOS MUERMOS	12	3.856.022.669	3%	1.159.386.907	1.047.698.573	5%	1.037.382.685	10.315.888	99,02%	1.648.937.189
MAULLIN	7	2.932.112.348	3%	259.031.774	347.810.950	2%	342.278.163	5.532.787	98,41%	2.325.269.624
P. MONTT	19	23.156.945.203	20%	608.863.534	3.183.680.149	15%	2.470.356.353	713.323.796	77,59%	19.364.401.520
P.VARAS	14	10.371.481.592	9%	4.478.111.500	1.177.635.763	5%	1.146.924.469	30.711.294	97,39%	4.715.734.329
TOTAL	114	114.675.440.872	100%	31.439.080.055	21.697.908.079	100%	18.924.465.429	2.773.442.650	87,22%	61.538.452.738

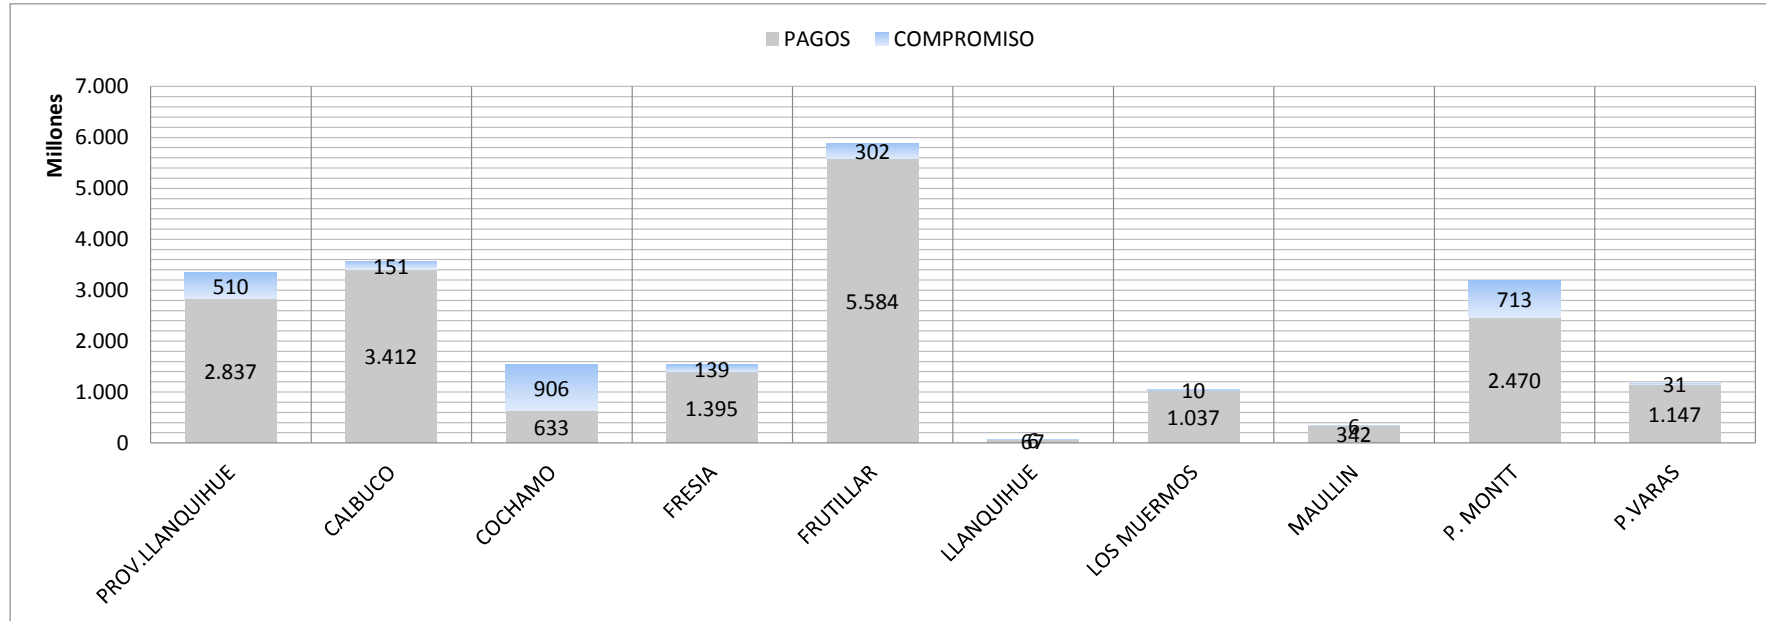




# Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

## Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre 2021 - %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE	4	9.297.587.800	16%	1.407.928.844	1.773.022.199	12%	375.689.316	1.397.332.883	21,19%	6.116.636.757
ANCUD	13	5.808.875.744	10%	1.055.727.100	2.639.340.336	17%	2.629.965.336	9.375.000	99,64%	2.113.808.308
CASTRO	14	7.501.055.747	13%	1.783.569.456	4.088.983.652	27%	3.278.374.224	810.609.428	80,18%	1.628.502.639
CHONCHI	12	6.446.050.661	11%	2.025.665.892	537.855.386	4%	334.389.885	203.465.501	62,17%	3.882.529.383
CURACO DE VÉLEZ	3	2.354.511.203	4%	650.412.984	263.463.034	2%	263.463.034	0	100,00%	1.440.635.185
DALCAHUE	11	4.726.118.580	8%	607.997.656	1.617.856.073	11%	1.429.243.037	188.613.036	88,34%	2.500.264.851
PUQUELDON	4	5.244.327.095	9%	3.282.614.899	316.596.306	2%	314.206.758	2.389.548	99,25%	1.645.115.890
QUEILEN	8	3.612.410.091	6%	771.466.530	1.222.578.075	8%	1.115.783.110	106.794.965	91,26%	1.618.365.486
QUELLON	14	7.671.464.882	13%	2.391.277.130	1.241.164.259	8%	607.968.583	633.195.676	48,98%	4.039.023.493
QUEMCHI	11	4.714.388.990	8%	1.959.994.133	1.143.688.739	8%	688.083.857	455.604.882	60,16%	1.610.706.118
QUINCHAO	5	1.698.312.700	3%	139.946.000	331.707.083	2%	331.707.083	0	100,00%	1.226.659.617
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>59.075.103.493</b>	<b>100%</b>	<b>16.076.600.624</b>	<b>15.176.255.142</b>	<b>100%</b>	<b>11.368.874.223</b>	<b>3.807.380.919</b>	<b>74,91%</b>	<b>27.822.247.727</b>

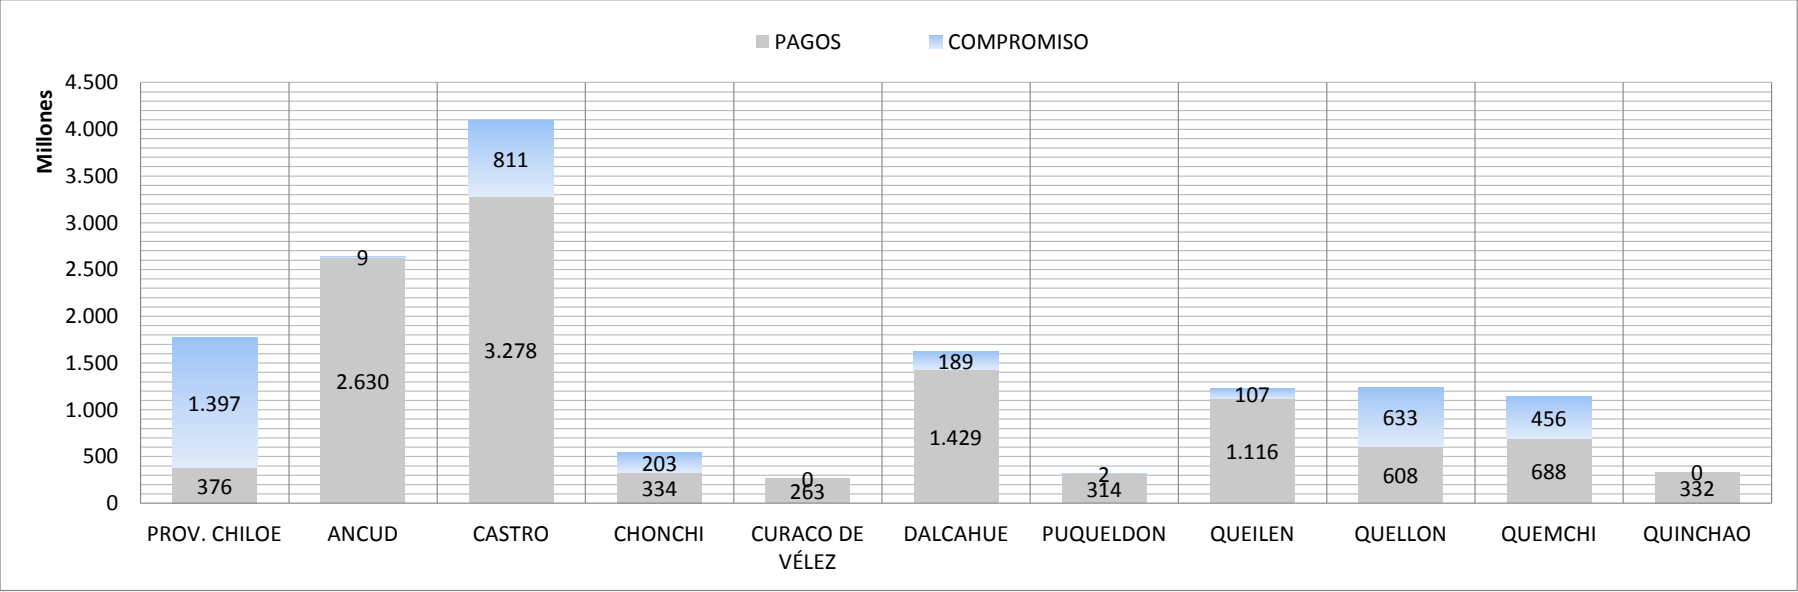



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR -02 Devengado al 31 Octubre 2021 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					SALDO AÑOS FUTURO
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	
PROV. PALENA	12	64.264.883.668	77%	6.573.117.954	12.837.335.111	74%	3.126.217.879	9.711.117.232	24,35%	44.854.430.603
CHAITEN	5	1.734.127.770	2%	95.407.000	681.384.010	4%	471.384.010	210.000.000	69,18%	957.336.760
FUTALEUFU	10	9.367.218.187	11%	8.099.592.373	1.022.295.447	6%	380.553.577	641.741.870	37,23%	245.330.367
HUALAIHUE	11	3.053.410.097	4%	1.127.483.773	764.264.815	4%	548.994.084	215.270.731	71,83%	1.161.661.509
PALENA	8	5.273.650.328	6%	1.208.174.304	2.109.053.453	12%	1.805.227.607	303.825.846	85,59%	1.956.422.571
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>83.693.290.050</b>	<b>100%</b>	<b>17.103.775.404</b>	<b>17.414.332.836</b>	<b>100%</b>	<b>6.332.377.157</b>	<b>11.081.955.679</b>	<b>36,36%</b>	<b>49.175.181.810</b>

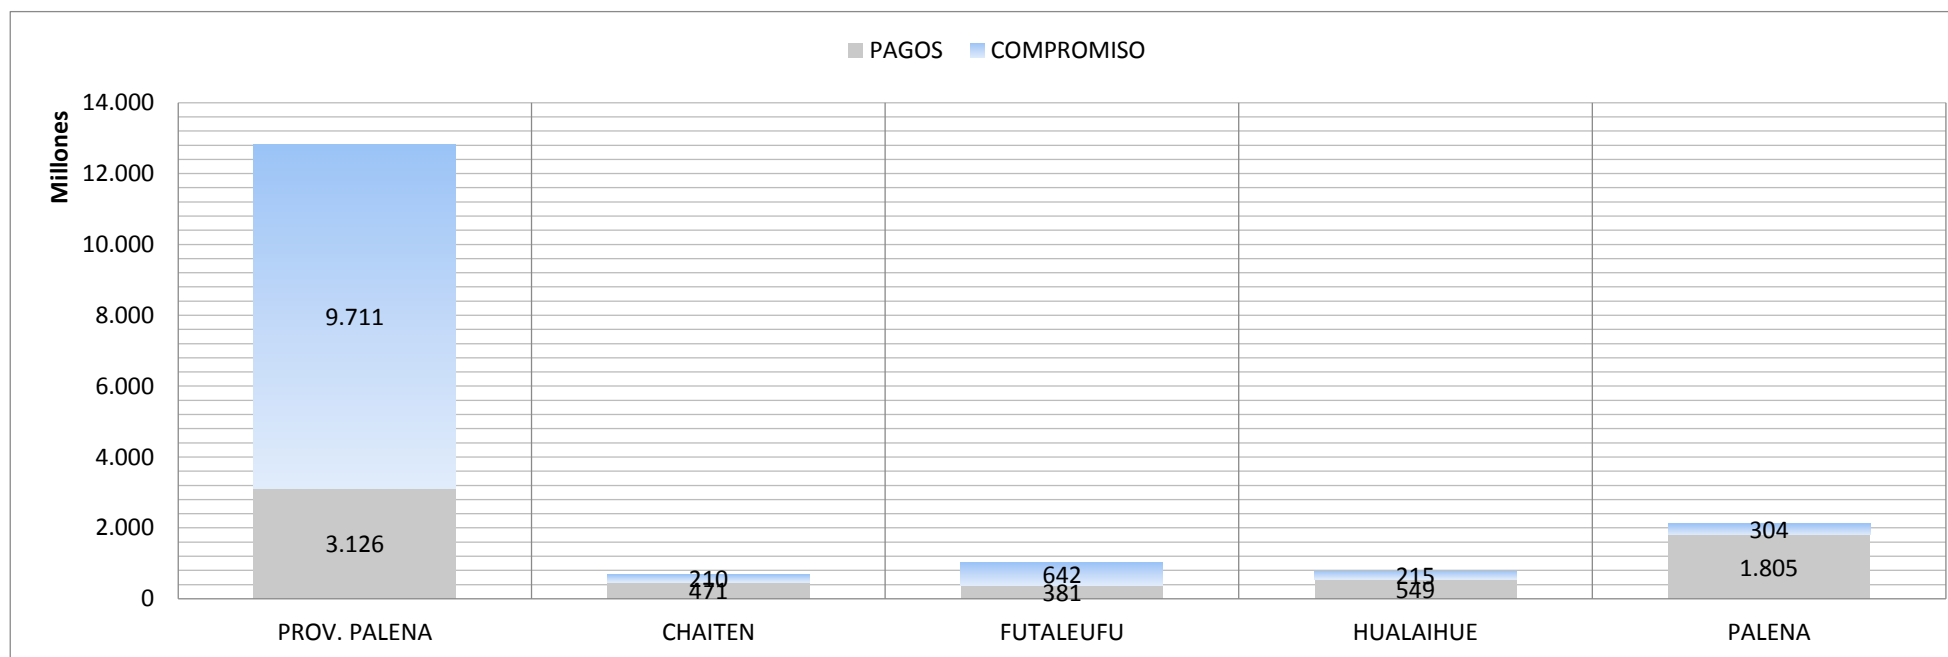



## Eficiencia Presupuestaria Por Provision


### Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre 2021 - %

PROVISIÓN
LIBRE
PATAGONIA VERDE
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION
FONDO DE INFRAESTRURA EDUCACIONAL
RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO
FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SERVICIO SANITARIO
FONDO DESARROLLO LOCAL
FONDO APOYO REGIONAL
PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
<b>TOTAL</b>


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2021			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
61.268.549.000	62.299.582.903	65,23%	1.031.033.903
15.253.396.000	14.515.308.972	15,20%	-738.087.028
6.519.742.000	6.519.742.000	6,83%	0
4.433.057.000	4.433.057.000	4,64%	0
511.250.000	511.250.000	0,54%	0
1.262.810.000	1.262.810.000	1,32%	0
248.089.000	248.089.000	0,26%	0
1.224.452.000	931.505.422	0,98%	-292.946.578
661.854.000	661.853.703	0,69%	-297
900.546.000	900.546.000	0,94%	0
2.606.915.000	2.606.915.000	2,73%	0
623.429.000	623.429.000	0,65%	0
<b>95.514.089.000</b>	<b>95.514.089.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

COMPROMISO V/S PAGOS 2021			
COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	% DIST. DE LOS PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
62.299.582.903	46.289.031.046	74,30%	16.010.551.857
14.515.308.972	3.566.628.440	24,57%	10.948.680.532
6.519.742.000	5.782.917.985	88,70%	736.824.015
4.433.057.000	2.783.817.243	62,80%	1.649.239.757
511.250.000	353.592.900	69,16%	157.657.100
1.262.810.000	919.878.000	72,84%	342.932.000
248.089.000	0	0,00%	248.089.000
931.505.422	394.612.545	42,36%	536.892.877
661.853.703	661.853.703	100,00%	0
900.546.000	790.602.158	87,79%	109.943.842
2.606.915.000	271.300.000	10,41%	2.335.615.000
623.429.000	0	0,00%	623.429.000
<b>95.514.089.000</b>	<b>61.814.234.020</b>		<b>33.699.854.980</b>

#### Marco Decretado Versus Compromiso

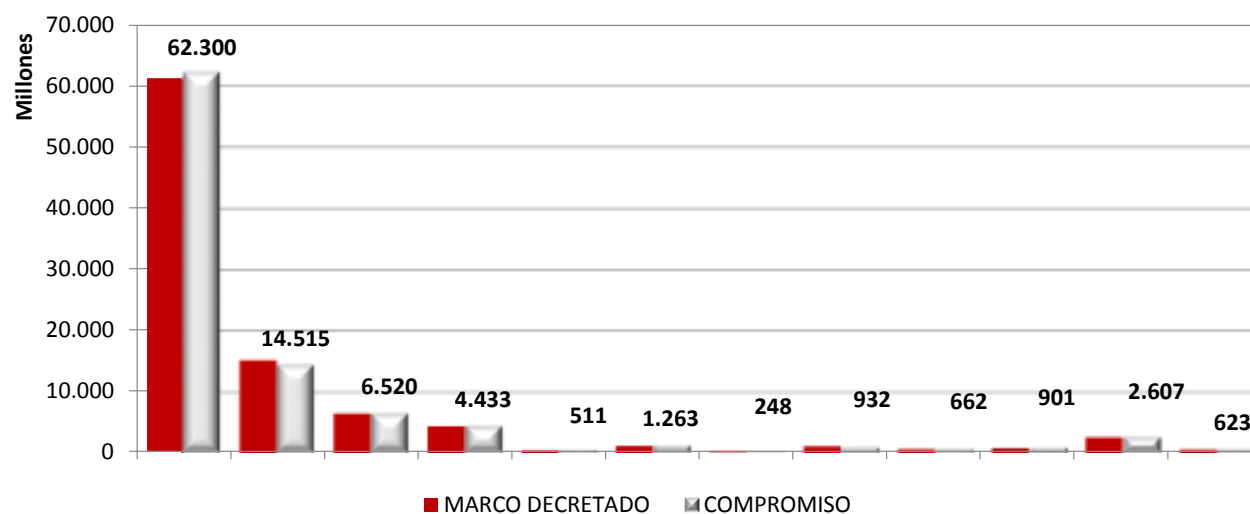


#### Compromiso Versus Pagos 2021

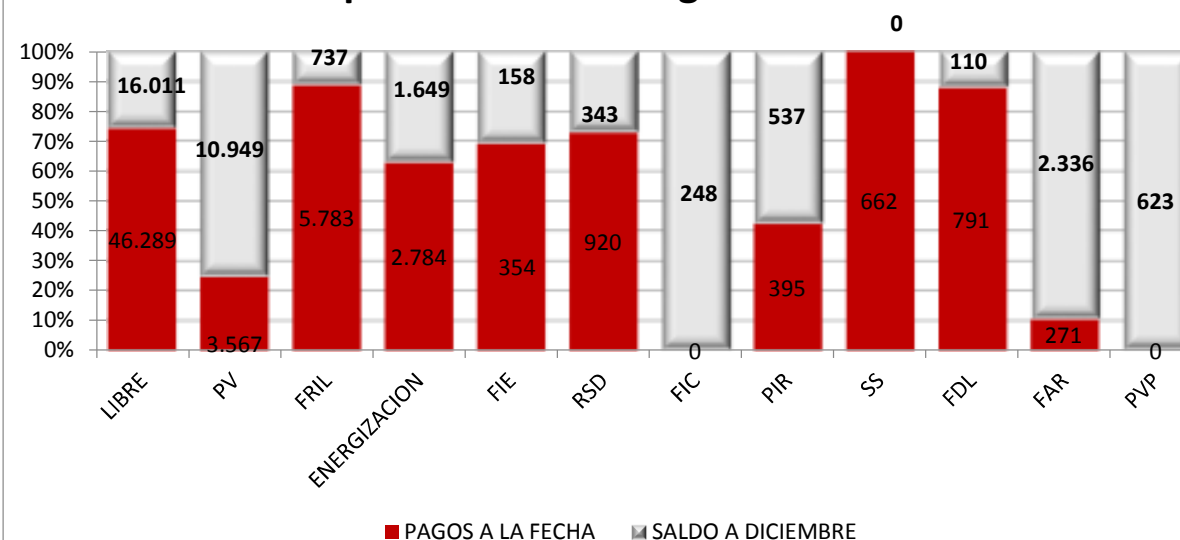

## Eficiencia Presupuestaria Por Sector Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre 2021 - %


SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
	COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO AÑOS FUTUROS
TRANSPORTE	102.998.428.662	22,77%	32.779.562.516	19.733.395.388	21%	9.494.363.773	10.239.031.615	50.485.470.758
VIVIENDA	44.938.557.768	9,94%	5.120.023.938	11.843.711.317	12%	10.859.673.013	984.038.304	27.974.822.513
EDUCACION Y CULTURA	73.070.467.884	16,16%	23.251.568.374	12.777.349.853	13%	11.521.478.576	1.255.871.277	37.041.549.657
SALUD	58.419.655.705	12,92%	11.561.922.845	8.614.707.323	9%	3.425.084.446	5.189.622.877	38.243.025.537
MULTISECTORIAL	64.599.224.911	14,28%	13.597.423.949	17.218.116.200	18%	10.786.191.444	6.431.924.756	33.704.922.762
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19.414.213.602	4,29%	4.602.957.235	4.846.474.090	5%	4.377.977.240	468.496.850	9.964.782.277
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.328.145.354	5,82%	7.334.863.234	5.028.633.420	5%	1.803.977.159	3.224.656.261	13.964.648.700
JUSTICIA	76.160.000	0,02%	0	7.497.000	0%	7.497.000	0	68.663.000
DEPORTE	19.844.344.095	4,39%	8.599.013.899	2.294.394.082	2%	1.718.318.501	576.075.581	8.950.936.114
SILVOAGROPECUARIO	14.396.380.347	3,18%	6.849.381.447	1.503.555.000	2%	796.235.093	707.319.907	5.850.024.900
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TU	18.886.392.845	4,18%	7.323.079.660	6.097.977.132	6%	3.267.949.237	2.830.027.895	5.345.840.053
ENERGIA	6.496.529.000	1,44%	0	4.500.326.195	5%	2.851.086.438	1.649.239.757	1.996.202.805
PESCA	2.797.800.000	0,62%	1.520.666.157	1.047.952.000	1%	904.402.100	143.549.900	229.181.843
<b>TOTAL</b>	<b>452.266.300.173</b>	<b>100%</b>	<b>122.540.463.254</b>	<b>95.514.089.000</b>	<b>100%</b>	<b>61.814.234.020</b>	<b>33.699.854.980</b>	<b>233.820.070.919</b>

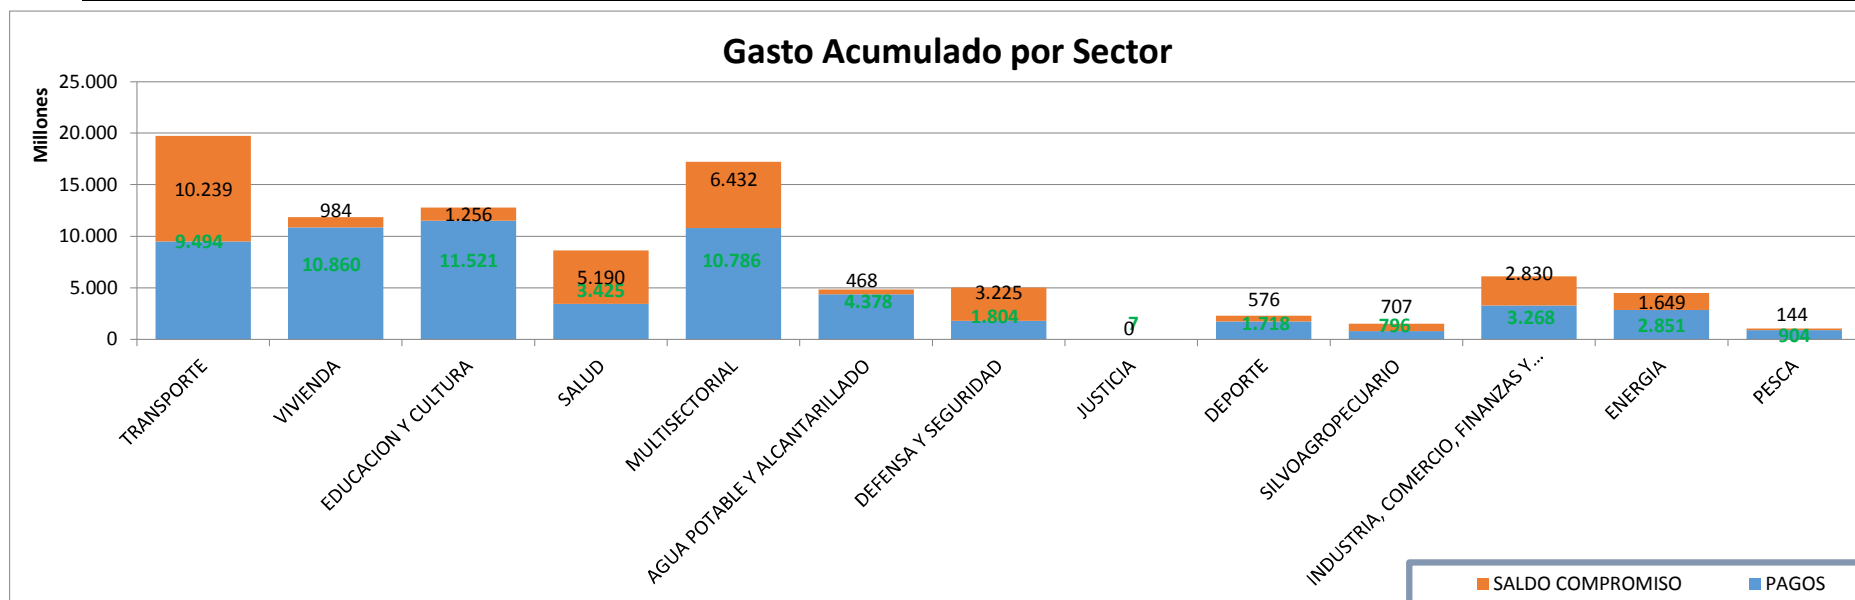



## Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR - 02 Devengado al 31 Octubre 2021 - %

COSTO TOTAL			FNDR 2021						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO PROXIMOS AÑOS
22	1.250.002.000	0%	123.900.000	432.773.000	396.820.250	0,42%	284.275.000	112.545.250	729.281.750
24	7.687.854.000	2%	0	8.720.352.000	7.687.854.000	8,05%	3.555.877.823	4.131.976.177	0
29	15.668.610.623	3%	1.227.552.821	6.170.012.000	3.745.712.752	3,92%	676.091.111	3.069.621.641	10.695.345.050
31	357.767.623.876	79%	103.531.192.205	58.999.524.000	62.431.408.295	65,36%	46.370.562.897	16.060.845.398	191.805.023.376
33	69.892.209.674	15%	17.657.818.228	21.191.428.000	21.252.293.703	22,25%	10.927.427.189	10.324.866.514	30.590.420.743
<b>TOTAL</b>	<b>452.266.300.173</b>	<b>100%</b>	<b>122.540.463.254</b>	<b>95.514.089.000</b>	<b>95.514.089.000</b>	<b>100%</b>	<b>61.814.234.020</b>	<b>33.699.854.980</b>	<b>233.820.070.919</b>

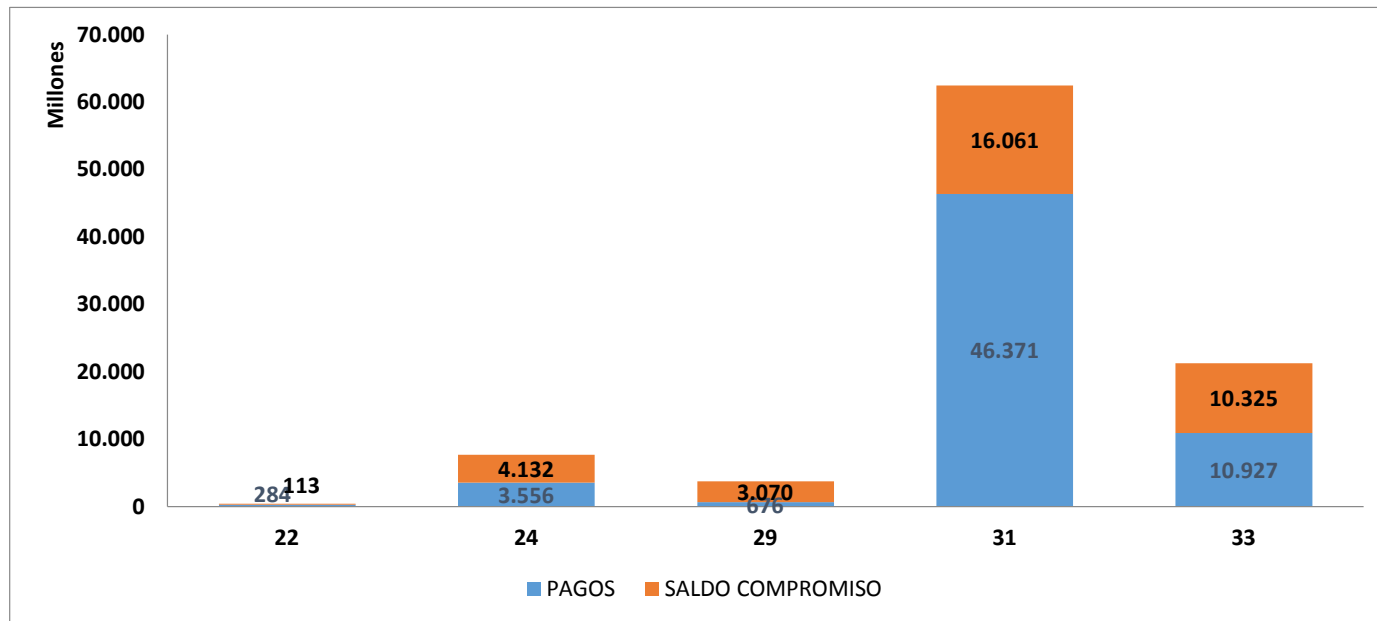

NOTA PARA CONTROL DE FONDOS DEL SUBTITULO 30 SE CREO PROGRAMA 50

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D		PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE OSORNO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA	7.805.646.000	6.570.711.562	0	0	0	1.234.934.438	RE	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33)	820.000.000	704.106.657	58.909.588	58.909.588	0	56.983.755	RS*	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.370.081.000	1.245.597.880	2.074.258.436	2.074.258.436	0	4.050.224.684	RS	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.295.526.000	1.000.146.478	1.767.940.050	1.767.940.050	0	527.439.472	RS	En Ejecución
	31	A		LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	232.520.067	441.322.358	441.322.358	0	453.198.575	RS	En Ejecución
	31	A		LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	76.160.000	0	7.497.000	7.497.000	0	68.663.000	RS	En Ejecución
	31	L		LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	0	1.106.935.111	1.106.935.111	0	3.037.250.889	RS	En Ejecución
	31	N		LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR NORTE, OSORNO	1.815.521.000	0	455.290.202	455.290.202	0	1.360.230.798	RS	En Ejecución
	33	N		FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	268.356.322	0	268.356.322	268.356.322	0	0	RS**	En Ejecución
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	26.722.517.322	9.753.082.644	6.180.509.067	6.180.509.067	0	10.788.925.611		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N		LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. MOYANO	167.403.000	0	0	0	0	167.403.000	RS	En Licitación
	31	N		LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	988.704.000	0	0	0	0	988.704.000	RS	En Licitación
	31	N		LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSO	562.400.000	47.479.757	0	0	0	514.920.243	RS	En Licitación
	31	L		LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO, COMUNA DE OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS	En Licitación
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.369.299.000	47.479.757	0	0	0	2.321.819.243		
							INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N		PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	50.000.000	0	50.000.000	143.804.000	RS	Convenio en Tramite
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	193.804.000	0	50.000.000	0	50.000.000	143.804.000		
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	29.285.620.322	9.800.562.401	6.230.509.067	6.180.509.067	50.000.000	13.254.548.854		
							COMUNA DE PUERTO OCTAY								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A		LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO	19.780.000	7.512.000	0	0	0	12.268.000	RS	En Liquidación
	31	A		LIBRE	EJECUCION	30478036	REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY	1.296.750.373	987.598.930	305.012.869	305.012.869	0	4.138.574	RS	En Ejecución
	31	L		LIBRE	EJECUCION	40013401	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES COMUNA DE PUERTO OCT	459.750.327	77.420.517	382.329.810	382.329.810	0	0	RS*	Terminado
	33	N		FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	303.990.914	0	303.990.914	303.990.914	0	0	RS**	En Ejecución
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.080.271.614	1.072.531.447	991.333.593	991.333.593	0	16.406.574		
							INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N		LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	RS*	Resolución en CGR para Toma Razon
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000		
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.417.978.614	1.072.531.447	991.333.593	991.333.593	0	354.113.574		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134930	CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE	992.183.000	917.630.386	74.552.614	74.552.614	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	16.859.700	16.219.730	0	0	0	639.970	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	0	0	0	20.530.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	481.879.563	32.639.590	32.639.590	0	15.419.847	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	19.363.000	13.862.500	5.500.500	5.500.500	0	0	RS	Terminado
	31	L	FDL	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	350.000.000	0	158.813.871	158.813.871	0	191.186.129	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	251.609.808	0	251.609.808	251.609.808	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.342.894.508	1.442.002.179	673.116.383	673.116.383	0	227.775.946		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR (C33)	694.291.000	0	0	0	0	694.291.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO (C33)	625.991.000	0	0	0	0	625.991.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	0	0	0	516.681.732	RS*	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	0	0	0	697.959.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	0	0	0	4.117.790.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016563	REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA PURRANQUE (C33)	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	RS*	Adjudicado
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.731.712.732	0	79.000.000	0	79.000.000	6.652.712.732		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013127	ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO GESTION DE TRANSITO PURRANQUE Y CORTE ALTO	0	0	0	0	0	0	RS	Cambia Fuente Financiamiento
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	172.431.000	0	0	0	0	172.431.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	172.431.000	0	0	0	0	172.431.000		
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.247.038.240	1.442.002.179	752.116.383	673.116.383	79.000.000	7.052.919.678		
						COMUNA DE PUYEHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30067012	REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS	3.077.979.670	3.077.979.670	0	0	0	0	RS	Terminado
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40007052	REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE	16.951.000	15.510.000	1.441.000	1.441.000	0	0	RS	Terminado
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE(C33)	378.086.000	0	289.806.943	289.806.943	0	88.279.057	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	255.390.702	0	255.390.702	255.390.702	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.728.407.372	3.093.489.670	546.638.645	546.638.645	0	88.279.057		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	276.551.379	0	0	0	0	276.551.379	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	19.839.684	0	0	0	0	19.839.684	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS (C33)	65.985.500	0	65.985.500	0	65.985.500	0	RS*	Adjudicado
	31	N	FDL	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	315.923.000	0	0	0	0	315.923.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	728.299.563	0	115.985.500	0	115.985.500	612.314.063		
						TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	4.456.706.935	3.093.489.670	662.624.145	546.638.645	115.985.500	700.593.120		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE RIO NEGRO														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30284622	REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO	686.441.907	668.131.467	18.310.440	18.310.440	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO (C33)	397.780.901	357.639.153	10.522.218	10.522.218	0	29.619.530	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO, COMUNA RIO NEGRO	175.662.361	154.554.067	21.108.293	16.886.636	4.221.657	1	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF CHIFIN	23.870.000	0	23.870.000	23.870.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	99.316.136	0	99.316.136	99.316.136	0	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							1.383.071.305	1.180.324.687	173.127.087	168.905.430	4.221.657	29.619.531		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	0	34.582.965	0	34.582.965	0	RS*	Adjudicado
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO	593.858.000	0	0	0	0	593.858.000	RS	En Licitación
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	0	0	0	0	569.080.000	RS	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							1.197.520.965	0	34.582.965	0	34.582.965	1.162.938.000		
TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO							2.580.592.270	1.180.324.687	207.710.052	168.905.430	38.804.622	1.192.557.531		
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO	3.749.709.000	3.204.904.217	905.248	905.248	0	543.899.535	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	10.024.577	0	10.024.577	2.550.558.639	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	224.166.308	0	224.166.308	224.166.308	0	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							6.561.103.308	3.231.549.001	235.096.133	225.071.556	10.024.577	3.094.458.174		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	0	0	0	601.714.000	RS	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							601.714.000	0	0	0	0	601.714.000		
INICIATIVAS NUEVAS														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMIONES Y PUENTES, SAN JUAN DE LA	682.206.318	0	0	0	0	682.206.318	RS*	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							682.206.318	0	0	0	0	682.206.318		
TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							7.845.023.626	3.231.549.001	235.096.133	225.071.556	10.024.577	4.378.378.492		



PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE SAN PABLO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	3.414.573.000	0	2.347.447.415	2.347.447.415	0	1.067.125.585	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	173.482.580	0	173.482.580	173.482.580	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.612.955.580	11.729.500	2.534.100.495	2.520.929.995	13.170.500	1.067.125.585		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUC	278.515.442	0	0	0	0	278.515.442	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUC	117.572.149	0	0	0	0	117.572.149	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	396.087.591	0	0	0	0	396.087.591		
						TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	4.009.043.171	11.729.500	2.534.100.495	2.520.929.995	13.170.500	1.463.213.176		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30086815	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO	15.318.985.549	4.736.606.083	0	0	0	10.582.379.466	RE	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY	1.344.511.915	1.344.511.915	0	0	0	0	RS	Cambia Fuente Financiamiento
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	5.486.962.838	1.018.393.862	1.018.393.862	0	304.258.300	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30448275	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33)	396.729.018	388.107.468	8.621.550	8.621.550	0	0	RS*	Terminado
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126279	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO	1.942.600.773	1.942.600.773	0	0	0	0	RS	Terminado
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	3.542.559.000	46.836.000	0	0	0	3.495.723.000	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDA	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE OSORNO	363.763.000	49.084	229.933.222	92.404.000	137.529.222	133.780.694	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT OSORNO	5.579.270.000	0	1.848.856.432	1.841.506.432	7.350.000	3.730.413.568	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40015603	HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE	90.650.035	59.234.303	31.415.732	31.415.732	0	0	RS	Terminado
	31	N	LIBRE	DISEÑO	30465788	AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO	329.071.800	0	0	0	0	329.071.800	RS	Terminado
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30402378	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO	31.024.000	0	31.024.000	31.023.729	271	0	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.748.780.090	14.004.908.464	3.168.244.798	3.023.365.305	144.879.493	18.575.626.828		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	0	52.135.637	0	52.135.637	0	RS*	Adjudicado
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	52.135.637	0	52.135.637	0	52.135.637	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30324573	CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU	1.496.798.000	0	0	0	0	1.496.798.000	RS	Cambia Fuente Financiamiento
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	0	301.584.080	0	301.584.080	75.396.020	RS*	Resolución en CGR para Toma Razon
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395473	CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33)	1.688.957.000	0	0	0	0	1.688.957.000	RS*	Cambia Fuente Financiamiento
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.562.735.100	0	301.584.080	0	301.584.080	3.261.151.020		
						TOTAL PROVINCIALES	39.363.650.827	14.004.908.464	3.521.964.515	3.023.365.305	498.599.210	21.836.777.848		
						TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	99.205.654.005	33.837.097.349	15.135.454.383	14.329.869.974	805.584.409	50.233.102.273		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30080460	CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT	394.331.499	357.098.349	37.233.150	37.233.150	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000		0	0	0	49.462.000	RS	En Ejecución
	31	L	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC. VILLA LOS PINOS ALTOS	448.223.000	0	250.546.000	190.602.158	59.943.842	197.677.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE QUEPE Y AVDA. JUAN SOLER MANFREDINI	525.598.000	0	359.206.395	283.105.441	76.100.954	166.391.605	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.406.628.940	4.050.000	1.112.875.353	1.112.875.353	0	7.289.703.587	RS	En Ejecución
	31	A	RSD	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	385.858.000	0	385.858.000	385.858.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	725.380.000	234.779.699	279.621.487	279.621.487	0	210.978.814	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	0	10.000.000	6.150.000	3.850.000	12.645.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	174.910.764	0	174.910.764	174.910.764	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	11.133.037.203	595.928.048	2.610.251.149	2.470.356.353	139.894.796	7.926.858.006		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO	5.964.000	5.964.000	0	0	0	0	RS	Terminado - Resciliado
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30270222	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO	5.964.000	5.964.000	0	0	0	0	RS	Terminado - Resciliado
	31	L	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.686.063.000	1.007.486	573.429.000	0	573.429.000	2.111.626.514	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	0	0	0	929.015.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.452.000	0	0	0	0	445.452.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS	5.496.302.000	0	0	0	0	5.496.302.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.568.760.000	12.935.486	573.429.000	0	573.429.000	8.982.395.514		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTAR RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	658.594.000	0	0	0	0	658.594.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	0	0	0	658.592.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40020984	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SARGAZO, PUERTO MONTT	497.144.000	0	0	0	0	497.144.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	640.818.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.455.148.000	0	0	0	0	2.455.148.000		
						TOTAL COMUNA DE P. MONTT	23.156.945.203	608.863.534	3.183.680.149	2.470.356.353	713.323.796	19.364.401.520		
						COMUNA DE CALBUCO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.207.370.892	54.930.468	54.930.468	0	26.932.532	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	9.889.982.000	169.015.232	1.236.513.739	1.236.513.739	0	8.484.453.029	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30326322	REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO	281.984.000	224.490.200	57.143.800	57.143.800	0	350.000	RS	En Ejecución
	31	L	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	388.423.000	0	388.423.000	388.423.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.165.268.000	0	228.147.062	228.147.062	0	937.120.938	RS	En Ejecución
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33)	110.000.000	0	49.500.000	33.000.000	16.500.000	60.500.000	RS*	En Ejecución
	31	N	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	445.462.000	0	445.462.000	445.462.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	502.345.000	0	408.741.612	408.741.612	0	93.603.388	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015774	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SAN ANDRES Y LOS TULIPANES	365.318.000	0	267.137.781	267.137.781	0	98.180.219	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015770	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES	437.544.000	0	137.034.880	137.034.880	0	300.509.120	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	155.744.794	0	155.744.794	155.744.794	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.031.304.686	1.600.876.324	3.428.779.136	3.412.279.136	16.500.000	10.001.649.226		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	134.986.422	0	134.986.422	206.720.578	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	885.435.000	0	0	0	0	885.435.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.227.142.000	0	134.986.422	0	134.986.422	1.092.155.578		
						TOTAL COMUNA DE CALBUCO	16.258.446.686	1.600.876.324	3.563.765.558	3.412.279.136	151.486.422	11.093.804.804		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE COCHAMO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	23.800.000	14.500.000	0	0	0	9.300.000	RS	Resciliada Cambia de Etapa
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30328431	CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE	33.900.000	20.740.000	13.160.000	13.160.000	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE COCHAMO	1.321.664.194	0	13.184.010	13.184.010	0	1.308.480.184	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	0	0	0	106.672.600	RS	En Ejecución
	31	L	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE LLAGUEPE	606.455.904	0	422.019.000	394.612.545	27.406.455	184.436.904	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA LLANADA GRANDE	122.370.000	0	10.000.000	5.900.000	4.100.000	112.370.000	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO	42.500.000	0	10.000.000	3.830.000	6.170.000	32.500.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	201.896.139	0	201.896.139	201.896.139	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.482.016.237	57.997.400	670.259.149	632.582.694	37.676.455	1.753.759.688		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	L	ENERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GU	868.161.000	0	384.550.000	0	384.550.000	483.611.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	RS	En Licitación
	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	30428675	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMO	617.579.000	0	483.611.000	0	483.611.000	133.968.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.510.740.000	0	868.161.000	0	868.161.000	642.579.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30428523	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO NORTE, COCHAMO	473.976.000	0	0	0	0	473.976.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	973.976.000	0	0	0	0	973.976.000		
						TOTAL COMUNA DE COCHAMO	4.966.732.237	57.997.400	1.538.420.149	632.582.694	905.837.455	3.370.314.688		
						COMUNA DE FRESIA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	488.319.065	201.443.501	72.440.562	72.440.562	0	214.435.002	RE	En Ejecución
S	31	A	FDL	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	RE	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	957.303.978	275.088.782	275.088.782	0	85.324.240	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA	590.808.430	335.213.608	72.430.113	63.815.489	8.614.624	183.164.709	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION APR EL MAÑO	490.790.000	376.365.503	0	0	0	114.424.497	RS	En Liquidación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	0	317.892.534	317.892.534	0	456.307.466	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES FRESIA (EL RINCON - RIO LLICO - TEODORO SCHAFER)	239.183.000	0	225.097.683	145.097.683	80.000.000	14.085.317	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33)	866.629.000	0	356.444.040	306.444.040	50.000.000	510.184.960	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	164.085.808	0	164.085.808	164.085.808	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.981.732.303	1.870.326.590	1.533.479.522	1.394.864.898	138.614.624	1.577.926.191		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	0	0	0	919.116.000	RS	Licitación Desierta
	29	L	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33)	534.844.000	0	0	0	0	534.844.000	RS*	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.453.960.000	0	0	0	0	1.453.960.000		
						TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.435.692.303	1.870.326.590	1.533.479.522	1.394.864.898	138.614.624	3.031.886.191		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE FRUTILLAR								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30465246	CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE	163.185.391	163.185.391	0	0	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30077934	CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR	1.218.124.258	1.218.124.258	0	0	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	105.198.517	82.911.875	53.498.189	29.413.686	40.892.608	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	830.345.185	5.450.000.000	5.177.057.792	272.942.208	365.197.888	RS	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40005972	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	410.792.000	0	353.219.700	353.219.700	0	57.572.300	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.666.647.722	2.316.853.351	5.886.131.575	5.583.775.681	302.355.894	463.662.796		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILÓPEZ, FRUTILLAR	218.397.000	0	0	0	0	218.397.000	RS	Licitación Desierta
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR	449.572.000	0	0	0	0	449.572.000	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	0	0	0	425.742.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION RED APR SECTOR CASMA, FRUTILLAR	322.319.000	0	0	0	0	322.319.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.416.030.000	0	0	0	0	1.416.030.000		
						TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.082.677.722	2.316.853.351	5.886.131.575	5.583.775.681	302.355.894	1.879.692.796		
						COMUNA DE LLANQUIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.501.229.330	3.488.289.637	12.939.693	12.939.693	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40007476	CONSTRUCCION APR COLEGIAL ESPERANZA, LLANQUIHUE	373.001.120	340.526.632	32.474.488	32.474.488	0	0	RS	Terminado
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	0	27.481.869	21.900.000	5.581.869	54.918.131	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.956.630.450	3.828.816.269	72.896.050	67.314.181	5.581.869	54.918.131		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	0	0	0	238.783.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	238.783.000	0	0	0	0	238.783.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016314	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33)	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000		
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000		
						TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.641.863.450	3.828.816.269	72.896.050	67.314.181	5.581.869	1.740.151.131		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	12.963.000	16.356.000	9.541.000	6.815.000	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30465403	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS	27.413.000	10.036.840	15.055.260	15.055.260	0	2.320.900	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY	1.114.527.000	262.693.000	9.360.000	9.360.000	0	842.474.000	RS(IN)	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40009545	CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33)	525.729.390	525.729.390	0	0	0	0	RS*	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30422722	CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	264.159.062	150.000.000	114.159.062	114.159.062	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS	207.019.010	99.601.553	50.876.070	50.876.070	0	56.541.387	RS	En Ejecución
	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40011698	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES, LOS MUERMOS	115.072.000	0	115.072.000	115.072.000	0	0	RS	Terminado Financieramente
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30463128	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MONTT BARRIO COMERCIAL	37.500.000	24.899.112	12.600.888	9.100.000	3.500.888	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40011005	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO (C33)	351.335.411	73.464.012	277.871.399	277.871.399	0	0	RS*	Terminado
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	0	91.741.178	91.741.178	0	45.908.822	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	890.770.000	0	189.077.920	189.077.920	0	701.692.080	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	155.528.796	0	155.528.796	155.528.796	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.856.022.669	1.159.386.907	1.047.698.573	1.037.382.685	10.315.888	1.648.937.189		
						TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	3.856.022.669	1.159.386.907	1.047.698.573	1.037.382.685	10.315.888	1.648.937.189		
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	259.031.774	15.017.563	9.484.776	5.532.787	0	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	30485255	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAL	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS	Terminado Financieramente
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	185.287.387	0	185.287.387	185.287.387	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	606.842.724	259.031.774	347.810.950	342.278.163	5.532.787	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN TEN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED (C33)	902.195.624	0	0	0	0	902.195.624	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.325.269.624	0	0	0	0	2.325.269.624		
						TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.932.112.348	259.031.774	347.810.950	342.278.163	5.532.787	2.325.269.624		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO VARAS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RE	En Liquidacion / En Reevaluacion
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005578	MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS	255.921.292	195.904.175	60.017.117	60.017.117	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40001254	MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS	234.443.339	228.806.813	5.636.526	5.636.526	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30066636	REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA	2.256.883.403	2.256.883.403	0	0	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005278	CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33)	815.706.553	610.418.300	205.288.253	205.288.253	0	0	RS*	Terminado
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	85.912.424	0	0	0	0	85.912.424	RS*	Resciliación
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	400.069.218	80.298.900	0	0	0	319.770.318	RS*	Resciliación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	1.237.007.000	4.375.000	427.484.631	427.484.631	0	805.147.369	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA	246.000.000	25.043.042	198.063.873	167.352.579	30.711.294	22.893.085	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	281.145.363	0	281.145.363	281.145.363	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.560.024.592	4.478.111.500	1.177.635.763	1.146.924.469	30.711.294	2.904.277.329		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	0	0	0	706.257.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	906.257.000	0	0	0	0	906.257.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	0	0	0	87.200.000	RS	Resciliacion Cambio UT
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS (C33)	818.000.000	0	0	0	0	818.000.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	905.200.000	0	0	0	0	905.200.000		
						TOTAL COMUNA DE P.VARAS	10.371.481.592	4.478.111.500	1.177.635.763	1.146.924.469	30.711.294	4.715.734.329		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	7.077.521.000	6.727.964.072	339.841.505	156.393.616	183.447.889	9.715.423	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133755	CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33)	9.774.474.000	7.927.334.204	466.796.091	344.452.799	122.343.292	1.380.343.705	RS*	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE PTO. MONTT	435.343.000	49.084	264.379.800	264.379.800	0	170.914.116	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	3.678.102.000	417.402.781	1.920.673.283	1.716.781.843	203.891.440	1.340.025.936	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU	2.050.780.000	0	75.764.155	75.764.155	0	1.975.015.845	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014647	MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUER	278.934.956	0	278.934.956	278.934.956	0	0	RS	Terminado
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.295.154.956	15.072.750.141	3.346.389.790	2.836.707.169	509.682.621	4.876.015.025		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
H	31	L	LIBRE	DISEÑO	30437675	CONSTRUCCION INTERTERRAZAS PUERTO MONTT, ETAPA I	511.250.000	0	0	0	0	511.250.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	9.000.000	0	0	0	2.295.827.000	RE	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATOS PROVINCIA DE LLA	105.867.000	0	0	0	0	105.867.000	RS*	En Licitación 2022
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO	2.851.491.706	177.066.265	0	0	0	2.674.425.441	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	504.376.000	0	0	0	0	504.376.000	RS*	En Licitación
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PERIODICA CAMINOS VECINALES CALBUCO Y MAULLIN 2020-2021(C33)	900.500.000	0	0	0	0	900.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.178.311.706	186.066.265	0	0	0	6.992.245.441		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS*	Convenio en Confección 2023
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000		
						TOTAL PROVINCIALES	30.973.466.662	15.258.816.406	3.346.389.790	2.836.707.169	509.682.621	12.368.260.466		
						TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	114.675.440.872	31.439.080.055	21.697.908.079	18.924.465.429	2.773.442.650	61.538.452.738		



PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE ANCUD								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	126.194.543	29.525.431	29.525.431	0	4.588.525	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	30.300.000	40.400.000	40.400.000	0	30.800.000	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012136	HABILITACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KM 26 Y 27, COMUA DE ANCUD	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	202.509.245	0	202.509.245	202.509.245	0	0	RS**	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30083781	DIAGNOSTICO FORTIFICACIONES DE ANCUD	9.375.000	0	9.375.000	0	9.375.000	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE A	659.095.000	256.882.357	312.178.131	312.178.131	0	90.034.512	RS	En Ejecución
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	563.580.000	0	518.716.955	518.716.955	0	44.863.045	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	661.606.000	642.350.200	2.415.197	2.415.197	0	16.840.603	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION RED APR PUMANZANO, ANCUD	842.254.000	0	815.889.997	815.889.997	0	26.364.003	RS	En Ejecución
ASC	31	L	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CA	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	RS	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CA	206.672.000	0	153.942.383	153.942.383	0	52.729.617	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40001823	AMPLIACION SALA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS	225.228.000	0	164.981.997	164.981.997	0	60.246.003	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.021.533.744	1.055.727.100	2.639.340.336	2.629.965.336	9.375.000	326.466.308		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO	1.787.342.000	0	0	0	0	1.787.342.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.787.342.000	0	0	0	0	1.787.342.000		
						TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.808.875.744	1.055.727.100	2.639.340.336	2.629.965.336	9.375.000	2.113.808.308		
						COMUNA DE CASTRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485135	CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33)	457.733.000	435.946.053	0	0	0	21.786.947	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	336.933.000	191.276.297	72.168.027	56.290.043	15.877.984	73.488.676	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40003369	CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33)	550.000.000	285.558.353	194.701.240	194.701.240	0	69.740.407	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076663	CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33)	564.532.000	447.235.824	117.296.176	113.640.707	3.655.469	0	RS*	En Ejecución
	31	A	FDL	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	500.518.000	203.793.037	140.990.257	140.990.257	0	155.734.706	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	219.759.892	2.550.000.000	2.406.569.625	143.430.375	1.009.596.108	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014732	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y URBANOS SECTOR TEN TEN Y LA CHACRAN (C33)	158.000.000	0	157.953.319	157.953.319	0	46.681	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	72.395.147	0	72.395.147	72.395.147	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.519.467.147	1.783.569.456	3.405.504.166	3.242.540.338	162.963.828	1.330.393.525		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA	139.625.000	0	35.833.886	35.833.886	0	103.791.114	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	0	0	0	194.318.000	RS	En Licitación
	29	N	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	252.188.000	0	252.188.000	0	252.188.000	0	RS*	Adjudicado
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	327.032.600	0	327.032.600	0	327.032.600	0	RS*	Adjudicado
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	68.425.000	0	68.425.000	0	68.425.000	0	RS*	Adjudicado
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	981.588.600	0	683.479.486	35.833.886	647.645.600	298.109.114		
						TOTAL COMUNA DE CASTRO	7.501.055.747	1.783.569.456	4.088.983.652	3.278.374.224	810.609.428	1.628.502.639		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	0	0	0	332.913.953	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	53.730.074	61.389.015	59.180.314	2.208.701	428.144.911	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006762	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33)	588.576.000	520.377.383	0	0	0	68.198.617	RS*	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33)	120.000.000	110.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	401.541.190	40.925.312	40.925.312	0	48.144.153	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	54.026.000	30.600.000	21.799.279	21.799.279	0	1.626.721	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	35.568.000	745.682	745.682	0	37.046.318	RS	En Ejecución
	33	A	SS	EJECUCION	30091901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO	516.359.450	499.967.747	16.391.703	16.391.703	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	62.399.451	0	0	0	2.788.169.549	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	21.714.839	21.714.839	0	178.285.161	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	173.632.756	0	173.632.756	173.632.756	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.254.793.861	2.025.665.892	346.598.586	334.389.885	12.208.701	3.882.529.383		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014051	ADQUISICION DE CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHONCHI URBANO (C33)	191.256.800	0	191.256.800	0	191.256.800	0	RS*	Adjudicado
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	191.256.800	0	191.256.800	0	191.256.800	0		
						TOTAL COMUNA DE CHONCHI	6.446.050.661	2.025.665.892	537.855.386	334.389.885	203.465.501	3.882.529.383		
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI	571.440.000	493.221.484	36.666.831	36.666.831	0	41.551.685	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	226.796.203	0	226.796.203	226.796.203	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	798.236.203	493.221.484	263.463.034	263.463.034	0	41.551.685		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	157.191.500	0	0	0	1.399.083.500	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.556.275.000	157.191.500	0	0	0	1.399.083.500		
						TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.354.511.203	650.412.984	263.463.034	263.463.034	0	1.440.635.185		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN	466.092.000	63.846.643	270.841.265	270.841.265	0	131.404.092	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE	93.394.000	55.016.650	38.377.350	38.377.350	0	0	RS	Terminado
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	353.680.553	3.529.297	3.529.297	0	278.334	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	320.000.000	110.000.000	193.206.488	176.337.052	16.869.436	16.793.512	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	0	14.086.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	18.541.310	511.250.000	353.592.900	157.657.100	280.074.690	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	0	290.451.777	290.451.777	0	70.616.223	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	296.113.396	0	296.113.396	296.113.396	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.725.020.580	607.997.656	1.617.856.073	1.429.243.037	188.613.036	499.166.851		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	0	0	0	395.089.000	RS	En Licitación
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN	859.173.000	0	0	0	0	859.173.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.254.262.000	0	0	0	0	1.254.262.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000		
						TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	4.726.118.580	607.997.656	1.617.856.073	1.429.243.037	188.613.036	2.500.264.851		
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.618.173.447	0	0	0	853.927.890	RE	En Estudio Revaluación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006078	CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON	666.831.000	664.441.452	2.389.548	0	2.389.548	0	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	314.206.758	0	314.206.758	314.206.758	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.453.139.095	3.282.614.899	316.596.306	314.206.758	2.389.548	853.927.890		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF PUQUELDON	791.188.000	0	0	0	0	791.188.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	0	0	0	791.188.000		
						TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	5.244.327.095	3.282.614.899	316.596.306	314.206.758	2.389.548	1.645.115.890		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30078798	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN	487.098.000	459.236.777	27.813.223	22.344.966	5.468.257	48.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30480757	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33)	361.002.000	312.229.753	47.376.361	47.376.361	0	1.395.886	RS*	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	0	850.000.000	748.673.292	101.326.708	500.912.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	297.388.491	0	297.388.491	297.388.491	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.496.400.491	771.466.530	1.222.578.075	1.115.783.110	106.794.965	502.355.886		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI	801.023.000	0	0	0	0	801.023.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	801.023.000	0	0	0	0	801.023.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	167.671.000	0	0	0	0	167.671.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	19.444.600	0	0	0	0	19.444.600	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014326	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION AERODROMO (C33)	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	314.986.600	0	0	0	0	314.986.600		
						TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.612.410.091	771.466.530	1.222.578.075	1.115.783.110	106.794.965	1.618.365.486		
						COMUNA DE QUELLON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO	2.531.139.000	2.121.102.141	179.711.650	179.711.650	0	230.325.209	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.667.420.000	745.531	50.000.000	0	50.000.000	1.616.674.469	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30125850	CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON	302.702.000	232.173.278	62.039.496	62.039.496	0	8.489.226	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	358.302.000	0	26.334.231	26.334.231	0	331.967.769	RS	En Ejecución
	31	N	FDL	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40000178	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	0	18.000.000	18.000.000	0	28.350.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	171.883.206	0	171.883.206	171.883.206	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.227.796.206	2.354.020.950	657.968.583	607.968.583	50.000.000	2.215.806.673		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30488426	CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	2.882.500	0	0	0	25.942.500	RS	Licitación Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	377.920.676	0	377.920.676	0	377.920.676	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	205.275.000	0	205.275.000	0	205.275.000	0	RS*	Adjudicado
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	0	0	0	715.825.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	835.261.000	34.373.680	0	0	0	800.887.320	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.163.106.676	37.256.180	583.195.676	0	583.195.676	1.542.654.820		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	0	0	0	93.253.000	RS	Convenio en Confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA (C33)	187.309.000	0	0	0	0	187.309.000	RE*	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	280.562.000	0	0	0	0	280.562.000		
						TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.671.464.882	2.391.277.130	1.241.164.259	607.968.583	633.195.676	4.039.023.493		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEMCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33)	547.411.000	253.005.532	13.887.137	0	13.887.137	280.518.331	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33)	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*	En Liquidación
	31	A	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33)	499.000.000	124.500.000	374.500.000	0	374.500.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI (SALDO)	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS	ARI
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	358.103.000	0	76.812.417	76.812.417	0	281.290.583	RS	En Ejecución
S	31	L	FDL	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS	En Ejecución
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RE	124.725.185	0	124.725.185	57.507.440	67.217.745	0	RS*	Adjudicado
	29	N	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RE	145.597.000	0	145.597.000	145.597.000	0	0	RS*	Adjudicado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	258.167.000	0	258.167.000	258.167.000	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.947.040.990	1.959.994.133	1.143.688.739	688.083.857	455.604.882	843.358.118		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE (C33)	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.714.388.990	1.959.994.133	1.143.688.739	688.083.857	455.604.882	1.610.706.118		
						COMUNA DE QUINCHAO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC	829.058.000	730.000	0	0	0	828.328.000	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33)	367.393.000	0	147.391.383	147.391.383	0	220.001.617	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	184.315.700	0	184.315.700	184.315.700	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.380.766.700	730.000	331.707.083	331.707.083	0	1.048.329.617		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007527	ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES	162.546.000	139.216.000	0	0	0	23.330.000	RS	En Licitación 2022
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ISLA MEULIN, QUINCHAO	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	317.546.000	139.216.000	0	0	0	178.330.000		
						TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.698.312.700	139.946.000	331.707.083	331.707.083	0	1.226.659.617		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA	1.528.367.000	527.224.353	14.847.608	14.847.608	0	986.295.039	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.016.128.000	82.700.000	1.716.131.557	360.717.696	1.355.413.861	217.296.443	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33)	1.298.249.800	798.004.491	42.043.034	124.012	41.919.022	458.202.275	RS*	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.842.744.800	1.407.928.844	1.773.022.199	375.689.316	1.397.332.883	1.661.793.757		
						INICIATIVAS NUEVAS								
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000		
						TOTAL PROVINCIALES	9.297.587.800	1.407.928.844	1.773.022.199	375.689.316	1.397.332.883	6.116.636.757		
						TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	59.075.103.493	16.076.600.624	15.176.255.142	11.368.874.223	3.807.380.919	27.822.247.727		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHAITEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	72.307.000	53.675.240	53.675.240	0	11.824.760	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	23.100.000	148.450.000	148.450.000	0	319.852.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	269.258.770	0	269.258.770	269.258.770	0	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	898.467.770	95.407.000	471.384.010	471.384.010	0	331.676.760		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO (C33)	534.255.000	0	210.000.000	0	210.000.000	324.255.000	RS*	Adjudicado
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	534.255.000	0	210.000.000	0	210.000.000	324.255.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITEN	301.405.000	0	0	0	0	301.405.000	RS*	Resolución en CGR para Toma Razon
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	301.405.000	0	0	0	0	301.405.000		
						TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.734.127.770	95.407.000	681.384.010	471.384.010	210.000.000	957.336.760		
						COMUNA DE FUTALEUFU								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	118.268.328	0	118.268.328	0	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.900.581.000	3.439.918.627	460.662.373	0	460.662.373	0	RS(RE)	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU	703.415.000	563.024.010	34.834.406	34.834.406	0	105.556.584	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	40006627	REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33)	281.260.005	196.693.686	84.566.319	84.566.319	0	0	RS*	Terminado
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33)	126.058.000	0	31.428.000	20.952.000	10.476.000	94.630.000	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	186.736.704	0	186.736.704	186.736.704	0	0	RS**	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	74.000.000	19.000.000	0	19.000.000	25.160.000	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.260.435.087	8.099.592.373	935.496.130	327.089.429	608.406.701	225.346.584		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	38.279.732	0	27.587.133	0	27.587.133	10.692.599	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	17.102.368	0	11.083.348	9.798.148	1.285.200	6.019.020	RS*	Adjudicado
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	51.401.000	0	48.128.836	43.666.000	4.462.836	3.272.164	RS*	Adjudicado
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	106.783.100	0	86.799.317	53.464.148	33.335.169	19.983.783		
						TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.367.218.187	8.099.592.373	1.022.295.447	380.553.577	641.741.870	245.330.367		



PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE HUALAIHUE														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
S-PV	31	A	PV	EJECUCION	30311722	REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN	647.737.730	553.325.273	94.412.457	79.243.403	15.169.054	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33)	231.709.000	217.737.229	0	0	0	13.971.771	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33)	364.878.000	356.421.271	0	0	0	8.456.729	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO	657.583.000	0	360.094.026	360.094.026	0	297.488.974	RS	En Ejecución
AS	31	L	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA	474.773.000	0	67.269.195	67.269.195	0	407.503.805	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	42.387.460	0	42.387.460	42.387.460	0	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							2.419.068.190	1.127.483.773	564.163.138	548.994.084	15.169.054	727.421.279		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO	33.986.000	0	0	0	0	33.986.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO	33.986.000	0	0	0	0	33.986.000	RS	Licitación Adjudicada
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							67.972.000	0	0	0	0	67.972.000		
INICIATIVAS NUEVAS														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30471865	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33)	101.104.000	0	0	0	0	101.104.000		RS Vencido
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	156.403.836	0	112.008.125	0	112.008.125	44.395.711	RS*	Adjudicado
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	308.862.071	0	88.093.552	0	88.093.552	220.768.519	RS*	Adjudicado
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							566.369.907	0	200.101.677	0	200.101.677	366.268.230		
TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE							3.053.410.097	1.127.483.773	764.264.815	548.994.084	215.270.731	1.161.661.509		
COMUNA DE PALENA														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	503.235.568	1.359.286.148	1.359.286.148	0	709.079.284	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30116040	CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL	43.998.000	35.173.080	8.824.920	0	8.824.920	0	RS	En Liquidación
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS	Terminado
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33)	68.106.000	47.522.650	13.923.131	13.923.131	0	6.660.219	RS*	En Ejecución
PV	31	N	PV	PREFACTIBILIDA	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	814.000.000	0	233.284.932	39.500.000	193.784.932	580.715.068	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	192.215.328	0	192.215.328	192.215.328	0	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							3.890.223.328	585.931.298	2.007.837.459	1.805.227.607	202.609.852	1.296.454.571		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
PV	31	A	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	622.243.006	86.215.994	0	86.215.994	544.968.000	RS(RE)	En Licitación
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33)	130.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	115.000.000	RS*	Licitación Adjudicada
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							1.383.427.000	622.243.006	101.215.994	0	101.215.994	659.968.000		
TOTAL COMUNA DE PALENA							5.273.650.328	1.208.174.304	2.109.053.453	1.805.227.607	303.825.846	1.956.422.571		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	9.788.091.000	133.735.539	3.258.000.000	111.276.084	3.146.723.916	6.396.355.461	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33)	4.990.418.000	4.853.909.931	136.508.069	0	136.508.069	0	RS*	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	977.479.734	1.422.520.266	1.279.460.793	143.059.473	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30447539	DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33)	140.366.668	140.366.668	0	0	0	0	RS*	Terminado
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	77.930.465	29.955.535	1.278.465	28.677.070	0	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	379.678.401	18.361.599	257.126	18.104.473	0	RS*	En Ejecución
S-PV	31	L	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	0	4.158.237.821	978.665.117	3.179.572.704	12.142.076.179	RS	En Ejecución
PV	31	N	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	10.017.216	3.813.751.821	755.280.294	3.058.471.527	24.876.072.963	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.824.957.668	6.573.117.954	12.837.335.111	3.126.217.879	9.711.117.232	43.414.504.603		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480167	ADQUISICION LANCHAS POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33)	237.746.000	0	0	0	0	237.746.000		RS Vencido
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30398377	ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33)	33.689.000	0	0	0	0	33.689.000		RS Vencido
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.439.926.000	0	0	0	0	1.439.926.000		
						TOTAL PROVINCIALES	64.264.883.668	6.573.117.954	12.837.335.111	3.126.217.879	9.711.117.232	44.854.430.603		
						TOTAL PROVINCIA DE PALENA	83.693.290.050	17.103.775.404	17.414.332.836	6.332.377.157	11.081.955.679	49.175.181.810		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						REGIONALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.185.189.000	3.008.590.769	13.358.810	13.358.810	0	163.239.421	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	387.114.086	19.279.420	144.711.465	69.464.483	75.246.982	223.123.201	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	668.312.499	334.455.949	273.238.130	263.956.130	9.282.000	60.618.420	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	2.486.702.000	0	2.486.702.000	1.856.102.463	630.599.537	0	RS***	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30460140	CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33)	3.712.267.936	3.549.833.203	157.984.521	157.984.521	0	4.450.212	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN Z	425.907.000	0	425.907.000	275.427.780	150.479.220	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PRIVADO	3.906.002.000	0	3.906.002.000	1.424.347.580	2.481.654.420	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	17.736.000	0	17.736.000	0	17.736.000	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	851.507.000	0	851.507.000	0	851.507.000	0	RS***	En Ejecución
	33	A	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA REPOSICION 07 CARROS MULTIPROPOSITO, 02 ESPECIALIDAD Y 01 CARRO A	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	Resolucion en CGR
	22	A	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	13.900.000	290.892.250	230.323.000	60.569.250	45.207.750	RS*	En Ejecución
	33	A	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	271.300.000	2.335.615.000	0	RS**	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021 (C33)	2.028.090.000	0	1.596.845.102	1.439.564.969	157.280.133	431.244.898	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	736.824.015	0	736.824.015	0	736.824.015	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.862.566.536	6.926.059.341	16.008.623.293	6.001.829.736	10.006.793.557	927.883.902		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA REG. DE LOS LAGOS,	613.500.000	0	0	0	0	613.500.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADMINISTRACIO	996.652.000	0	0	0	0	996.652.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMATICA Y DIGITAL POLICIAL LOS LA	539.595.000	0	0	0	0	539.595.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION DE LOS LAGOS(C33)	531.990.000	0	0	0	0	531.990.000	RS*	En Licitación
	31	N	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIO NORTE Y PIR	206.226.000	0	0	0	0	206.226.000	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES UNIDADES Y DESTACAMENTO DE LA REGION DE LOS LA	1.301.999.993	0	422.270.267	0	422.270.267	879.729.726	RS*	Adjudicado
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS	3.350.500.000	0	0	0	0	3.350.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.540.462.993	0	422.270.267	0	422.270.267	7.118.192.726		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	0	0	5.484.512.000	RS	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL IPS - CHILEATIENDE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	RS*	Adjudicado
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LO	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Convenio en confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DET. DE BRECHAS A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	0	0	0	241.133.000	RS	Base en Licitación
	22	N	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33)	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*	Convenio en confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.464.589.000	0	50.000.000	0	50.000.000	6.414.589.000		
						TOTAL REGIONAL	37.867.618.529	6.926.059.341	16.480.893.560	6.001.829.736	10.479.063.824	14.460.665.628		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
PRESUPUESTO PROGRAMAS						FOMENTO								
						PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
R	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.500.000.000	486.631.000	462.521.361	24.109.639	13.369.000	RS**	En Ejecución
R	33	N	LIBRE	CORFO	40033084	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO PATAGONIA COSTA	2.082.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.080.000.000	RS**	Resolucion en CGR
R	33	N	LIBRE	CORFO	40031184	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUST	699.800.000	0	2.000.000	0	2.000.000	697.800.000	RS**	Resolucion en CGR
R	33	N	LIBRE	SEREMI AGRICU	40015235	REACTIVACION TECNICO COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS REGION DE LOS	398.180.000	0	3.000.000	0	3.000.000	395.180.000	RS**	Resolucion en CGR
R	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIACIONES ASOCIATIVOS	500.000.000	0	469.200.000	0	469.200.000	30.800.000	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	422.776.000	0	422.776.000	77.224.000	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	N	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTEABILIDAD DE LA	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	N	LIBRE	FUND. CENTRO	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE EMPREN	1.500.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	A	LIBRE	FUNCHI	40025247	RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE MICROEMPRESAS FAMILIARES	1.000.000.000	52.765.000	947.235.000	947.235.000	0	0	RS**	En Ejecución
R	33	N	LIBRE	FUND. CENTRO	40036381	CAPACITACIÓN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS AS	250.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	2.000.000	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	N	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION PRODUCCION DE ALGAS PELILLO	250.000.000	0	240.430.000	0	240.430.000	9.570.000	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	N	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUD	50.000.000	0	49.200.000	0	49.200.000	800.000	RS**	Tramite en DIPRES
R	33	A	LIBRE	FOSIS	40025197	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR INFORMAL REGION DE LOS LAGOS	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	743.846.000	6.154.000	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FUNDACION ART	40025326	RECUPERACION ECONOMICA DE LA ARTESANIA TRADICIONAL DE LA REGION DE LOS LAGOS	250.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	151.571.000	0	0	0	76.823.750	RS**	En Ejecución
						TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	11.761.398.750	2.714.336.000	4.910.472.000	2.393.602.361	2.516.869.639	4.133.566.750		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
AS	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40019477	TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYMES	1.000.000.000	880.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019474	PROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA MUJERES EMP. SECTOR ALGUERO	120.000.000	7.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019475	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CAPACITACION Y RECONVERSION LABORAL PARA ALGUERO	150.000.000	13.000.000	137.000.000	137.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019379	PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEMERSALES	300.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD (S)	505.000.000	20.000.000	18.250.000	14.867.830	3.382.170	466.750.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019469	REPOSICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES JEFA DE HOGAR	150.000.000	20.000.000	125.782.000	123.172.000	2.610.000	4.218.000	RS**	En Ejecución
	33	N	RSD	SEREMI DE MED	40023036	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TORNO A	235.000.000	0	90.744.000	0	90.744.000	30.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPREDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS (S)	130.000.000	10.000.000	113.117.000	78.200.000	34.917.000	6.883.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION APOYO A LA REINSERCCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD (S)	200.000.000	3.999.977	0	0	0	196.000.023	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SEREMI VIVIEND	40019485	TRANSF. MEJOR. DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	20.000.000	0	0	0	1.280.000.000	RS**	En Ejecución
						TOTAL ACUERDO SOCIAL	4.090.000.000	1.173.999.977	817.893.000	686.239.830	131.653.170	1.983.851.023		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
ASC	33	A	LIBRE	FUDEA-SERNATL	40022229	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	282.293.000	153.763.973	128.529.027	783.017.861	RS**	En Ejecución
						TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	434.689.139	282.293.000	153.763.973	128.529.027	783.017.861		
						PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
PV	33	A	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA	203.000.000	184.613.000	501.000	0	501.000	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341329	TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC	309.000.000	301.181.000	6.961.000	6.961.000	0	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA	190.000.000	189.316.581	0	0	0	683.419	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30341175	PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV	600.000.000	296.299.083	1.597.000	1.138.214	458.786	302.103.917	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30341173	TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECU	450.000.000	294.207.260	50.000.000	50.000.000	0	105.792.740	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRI	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC	530.000.000	296.632.948	133.000.000	46.400.000	86.600.000	100.367.052	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	126.296.000	37.906.000	11.310.511	26.595.489	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	30.782.000	8.983.000	8.799.748	183.252	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SERNATUR	30337226	TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE	1.275.000.000	1.249.784.000	23.000.000	1.135.240	21.864.760	0	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE BIEN	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	325.273.000	96.823.000	6.230.014	90.592.986	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL PATAGONIA VERDE	4.751.500.000	3.601.752.679	358.771.000	131.974.727	226.796.273	516.579.321		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
PROGRAMAS DE ARRASTRE														
	33	A	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN	202.400.000	37.349.999	40.792.000	0	40.792.000	124.258.001	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	40014803	PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA	764.464.240	219.937.838	287.431.000	0	287.431.000	257.095.402	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30378428	PROGRAMA SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA PARA LA CONSOLIDACION DE LA TERCERA	500.000.192	479.084.192	20.916.000	0	20.916.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30433775	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS	500.000.192	495.707.192	4.206.000	0	4.206.000	87.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	481.749.364	16.000.000	264.077	15.735.923	64.778.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS	400.000.000	181.514.893	78.162.000	15.600.000	62.562.000	140.323.107	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	2.006.500.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE	624.828.757	317.817.757	232.302.000	7.460.000	224.842.000	74.709.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN	2.212.769.231	308.004.725	385.886.000	26.772.686	359.113.314	1.518.878.506	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	25.051.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30440729	PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES	326.826.504	308.425.504	0	0	0	18.401.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	184.999.928	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAPESCA	30343724	PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016	1.579.035.233	1.336.907.233	211.351.000	200.350.938	11.000.062	30.777.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL	900.000.000	630.041.157	57.524.000	3.750.000	53.774.000	212.434.843	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	51.125.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	COMISION NACIONAL DE DESARROLLO	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.184.780.439	539.479.000	462.371.605	77.107.395	275.740.561	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	140.492.250	32.338.000	1.500.000	30.838.000	18.787.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE BIENESTAR SOCIAL	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	269.146.592	253.032.000	194.413.790	58.618.210	677.821.408	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FUNCHI	40016769	TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR	1.000.000.000	580.625.000	419.375.000	419.375.000	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES	230.000.000	228.800.000	1.200.000	0	1.200.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPA	233.158.000	226.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.158.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULT	327.800.000	90.000.000	221.053.000	131.277.100	89.775.900	16.747.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERV. SALUD OS	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAG. PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, Provincia	200.000.000	84.385.968	69.216.000	24.101.414	45.114.586	46.398.032	RS**	En Ejecución
PROGRAMAS DE ARRASTRE							17.955.405.474	9.233.072.686	2.974.263.000	1.491.236.610	1.483.026.390	5.748.069.788		
PROGRAMAS NUEVOS														
	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40026513	PROGRAMA DE REACTIVACION Y CAPACITACION INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCU	0	0	0	0	0	0	RS**	Terminado - Resciliado
	33	N	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA DE PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	0	9.423.000	0	9.423.000	313.377.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	COMISION DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION DE LO	2.040.000.000	0	4.600.000	0	4.600.000	2.035.400.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Y POSICIONAMIENTO PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVEN	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO, ULTIMA	14.980.000.000	0	3.441.000	0	3.441.000	14.976.559.000	RS**	En Ejecución
	33	N	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	248.089.000	0	248.089.000	0	248.089.000	0	RS**	En Ejecución
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							17.690.889.000	0	265.553.000	0	265.553.000	17.425.336.000		
TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO							57.749.193.224	17.157.850.481	9.609.245.000	4.856.817.501	4.752.427.499	30.590.420.743		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 02 2021							452.266.300.173	122.540.463.254	95.514.089.000	61.814.234.020	33.699.854.980	233.820.070.919		
PROGRAMAS FET														
	30	N	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS NIVEL PREFIA	359.099.000	0	30.000.000	0	30.000.000	329.099.000	RS**	En Ejecución
ASC-R	30	N	LIBRE	INDAP	40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PA	800.000.000	0	614.902.000	0	614.902.000	185.098.000	RS**	En Ejecución
ASC-R	30	N	LIBRE	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	493.962.000	211.430.000	282.532.000	6.038.000	RS**	En Ejecución
	30	N	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	0	507.000.000	0	507.000.000	779.000.000	RS**	En Ejecución
	30	N	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZA	1.300.000.000	0	399.038.000	0	399.038.000	900.962.000	RS**	En Ejecución
TOTAL PROGRAMAS FET							4.245.099.000	0	2.044.902.000	211.430.000	1.833.472.000	2.200.197.000		
TRANSFERENCIA CONSOLIDABLE														
ASC	33	N	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSF. FINANC. DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGIO	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	Desiste Financiamiento 2021
AS	24	N	LIBRE	SENAMA	40024008	PREVEN. PROGR. MEJOR. INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES (S)	474.000.000	0	474.000.000	474.000.000	0	0	RS**	Recursos Transferidos
AS	24	N	LIBRE	SENAMA	40015477	PREVENCION PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS REGION DE LOS LAGOS (S)	456.000.000	0	456.000.000	456.000.000	0	0	RS**	Recursos Transferidos
TOTAL TRANSFERENCIA CONSOLIDABLE							1.178.000.000	0	1.178.000.000	930.000.000	248.000.000	0		

PLAN  
S=CONVENIO DE SALUD  
H=CONVENIO CIUDADES MAS HUMANAS  
P=PATAGONIA VERDE  
AS=ACUERDO SOCIAL  
ASC=ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO  
R=PROGRAMA DE REACTIVACION

RATE  
RS=RECOMENDACION TECNICA FAVORABLE  
RS\*=RECOMENDACION TECNICA CIRCULAR 31  
RS\*\*=RECOMENDACION POR TRANSFERENCIA  
RS\*\*\*=RECOMENDACION POR SUBSIDIO  
RE=REVALUACION  
R=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
