

ESTADO DE SITUACIÓN

Ejecución Presupuestaria FNDR


Abril 2026

División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional de Los Lagos




www.goreloslagos.cl

MARCO PRESUPUESTARIO FNDR – Programa 02 2026

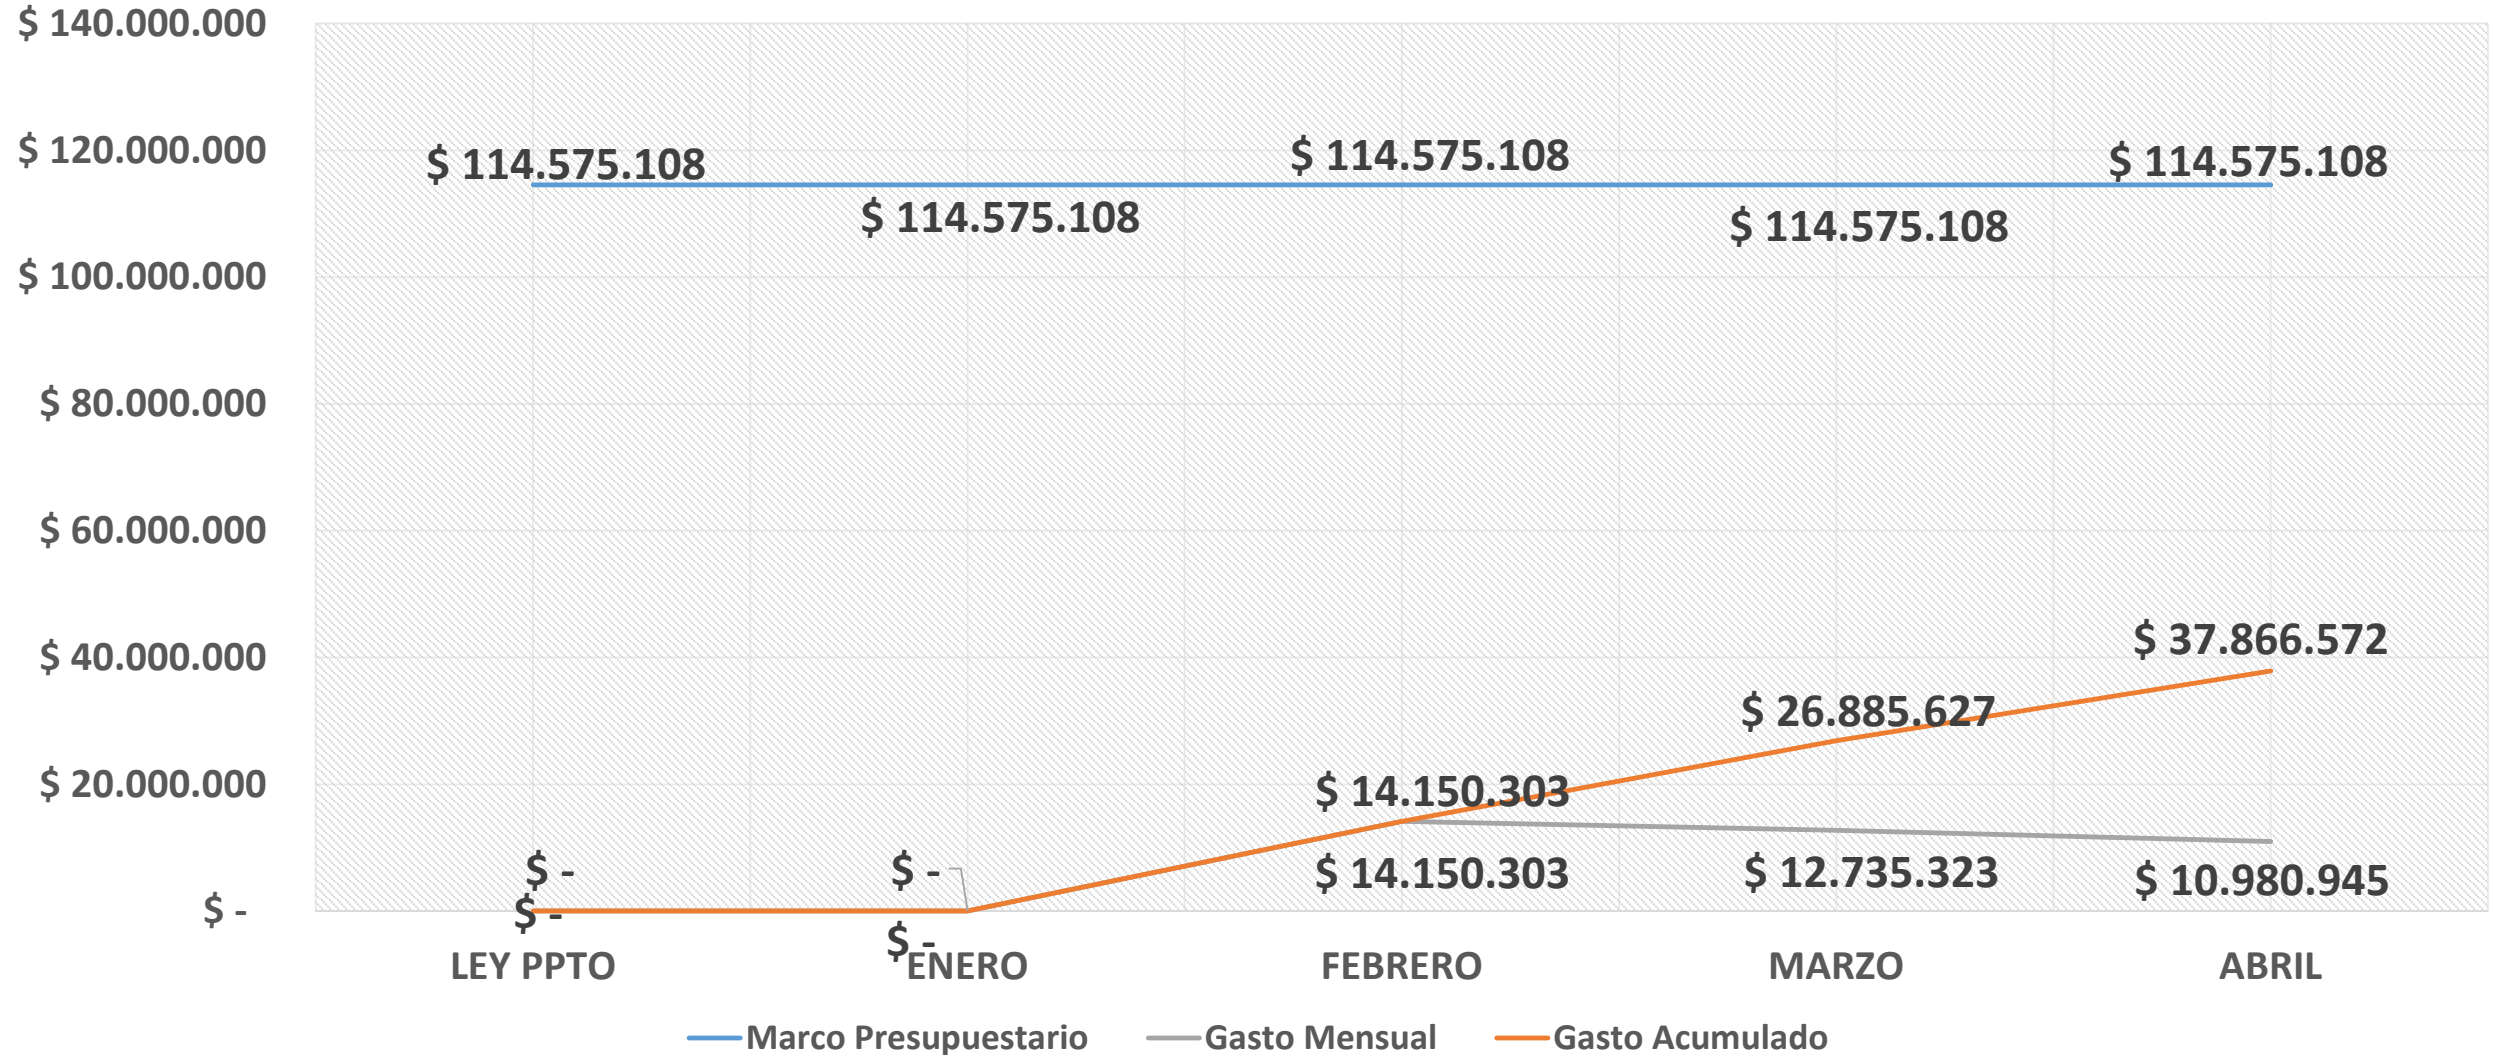


EFICIENCIA PRESUPUESTARIA FNDR

Programa 02 2026

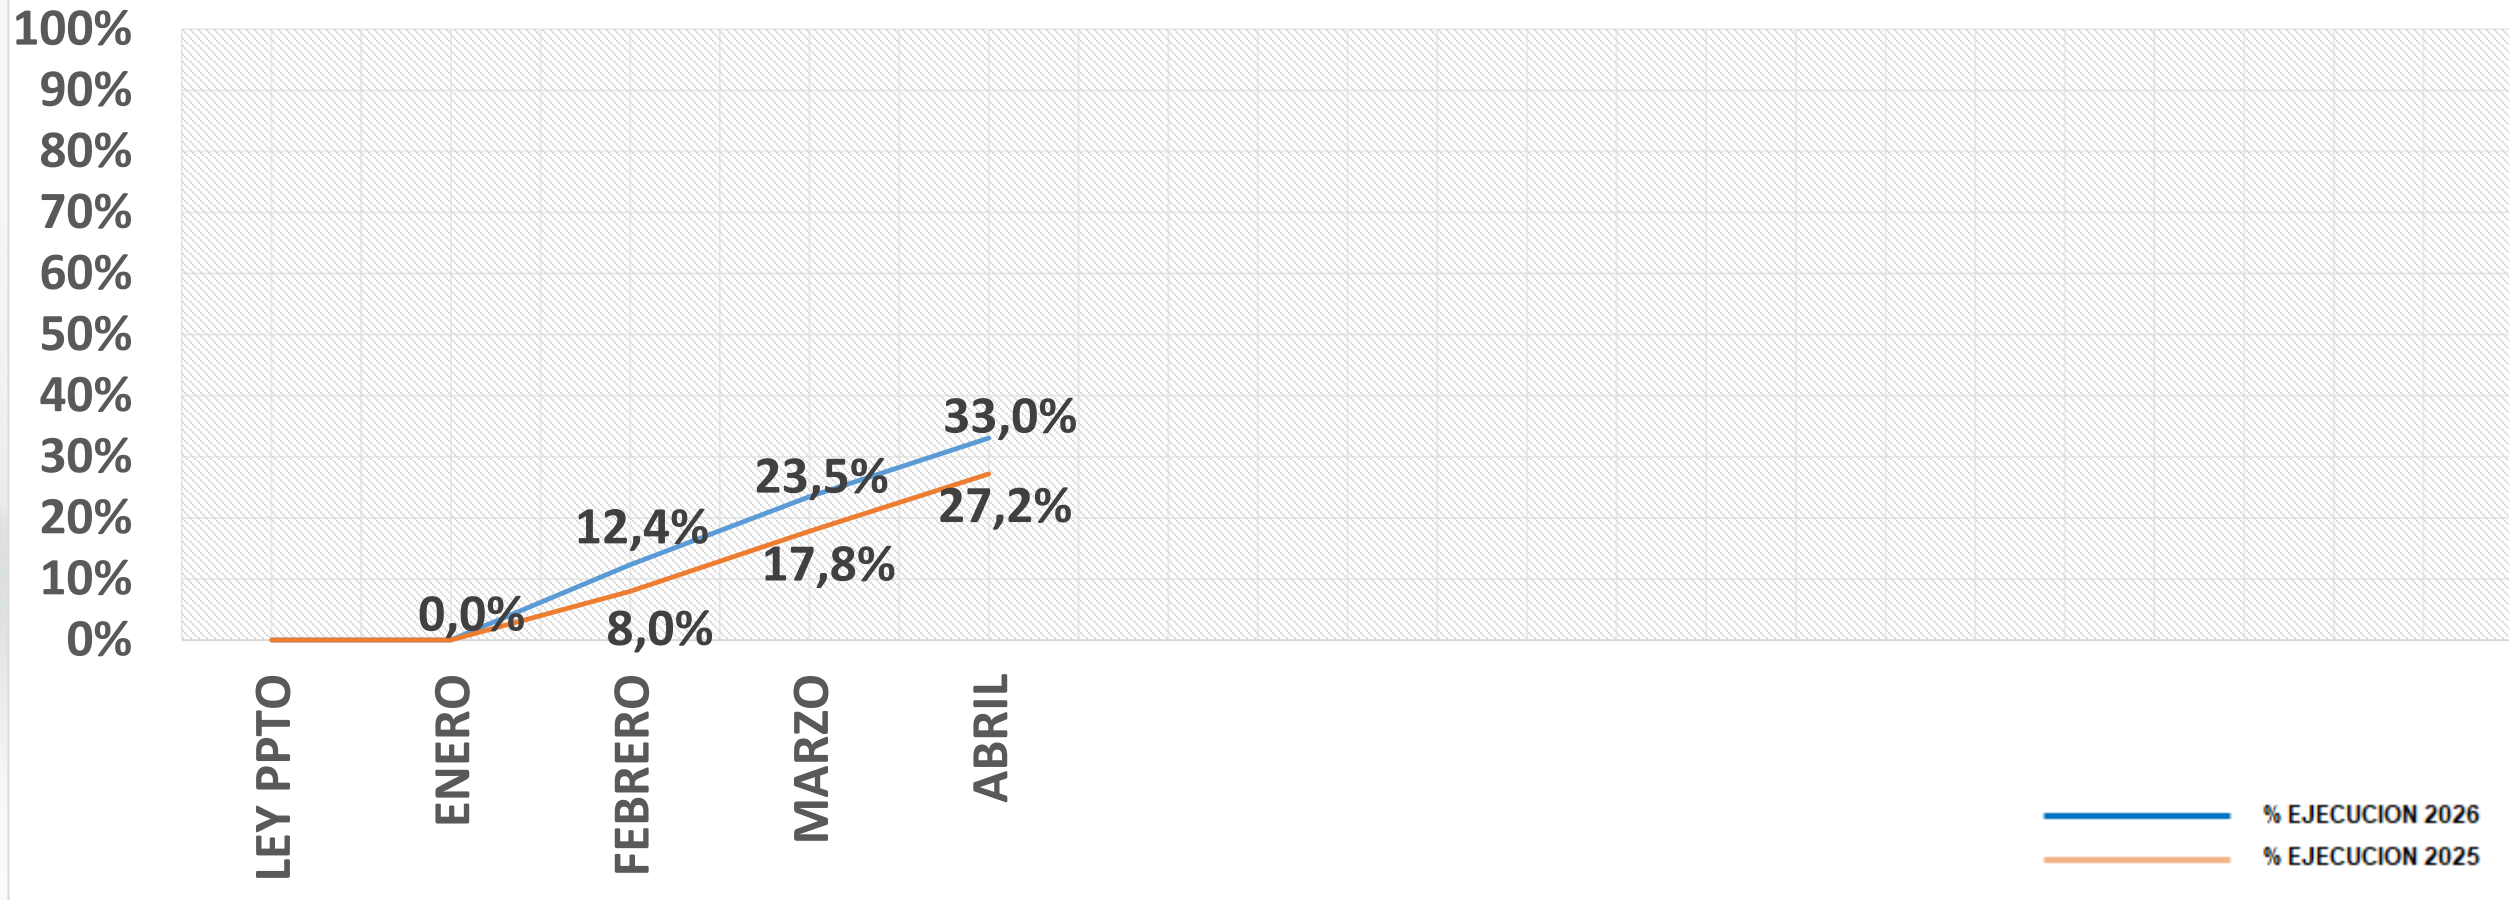


Eficiencia Presupuestaria por Provincia

al 30 Abril

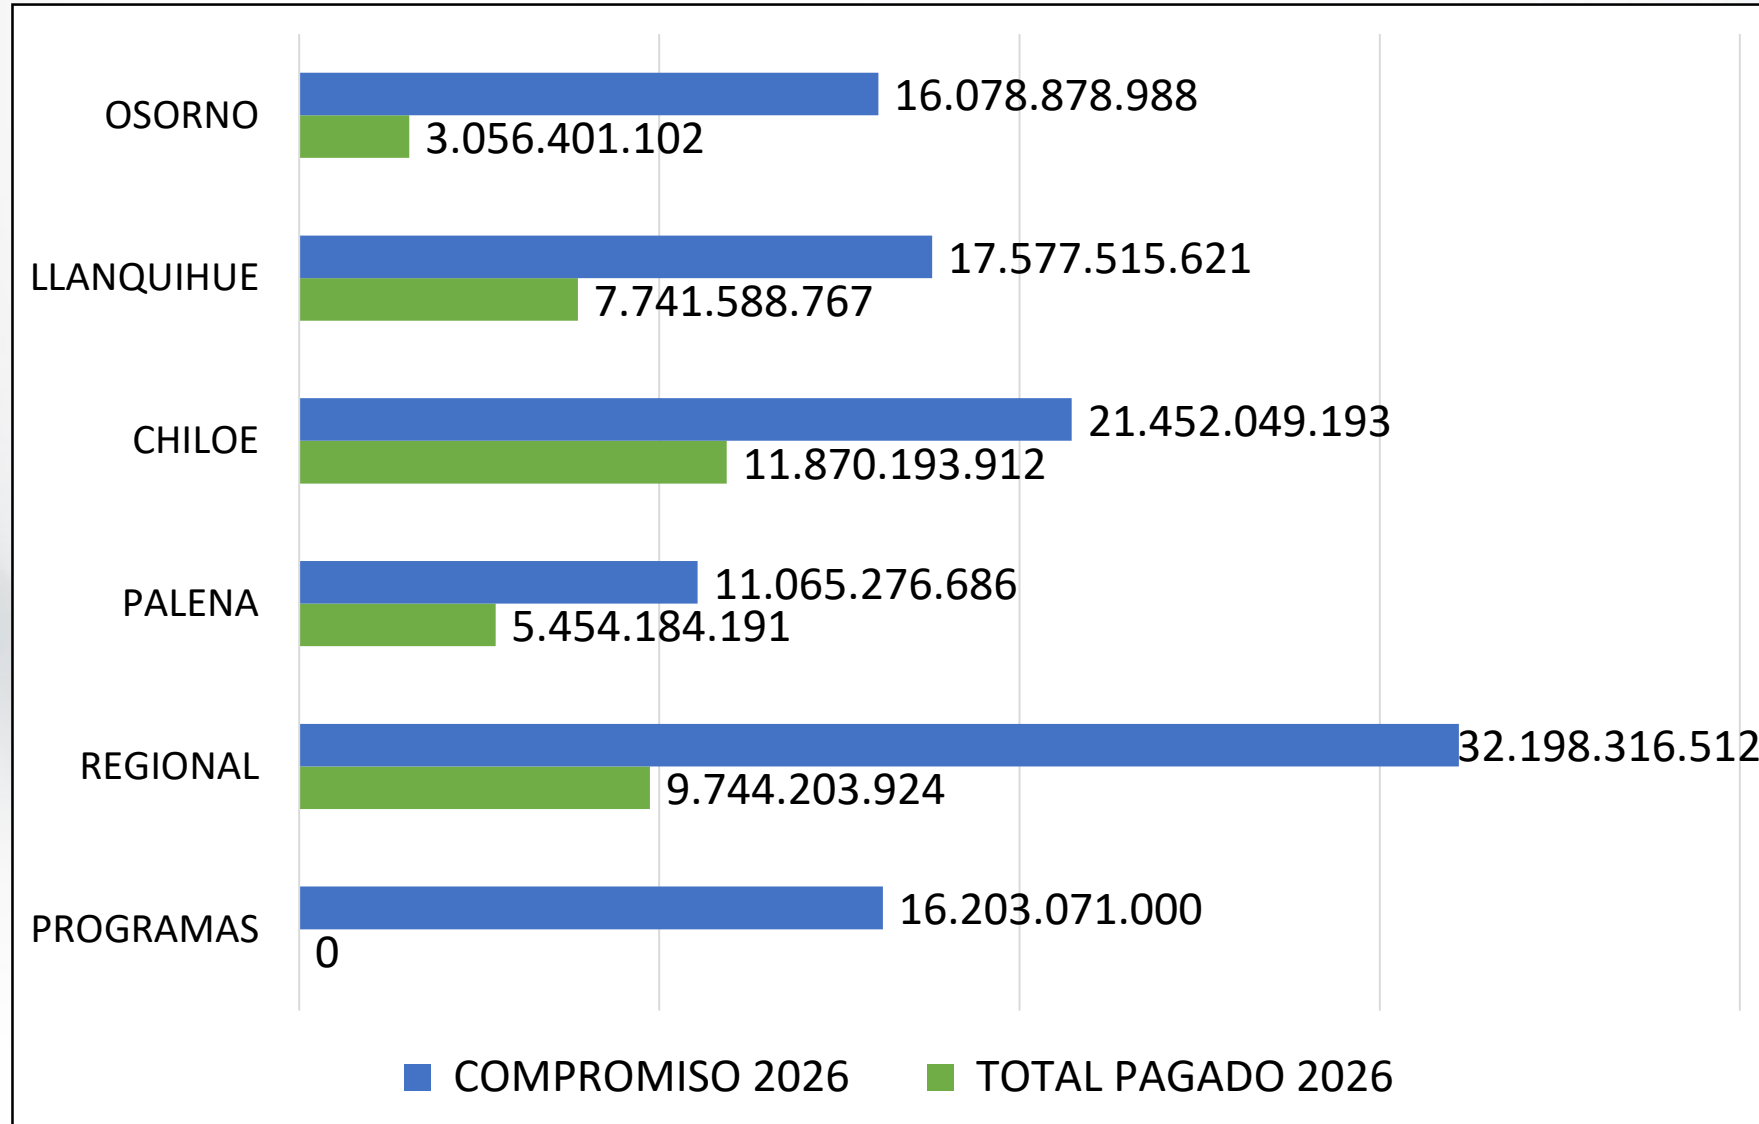

% Distribución por Provincia

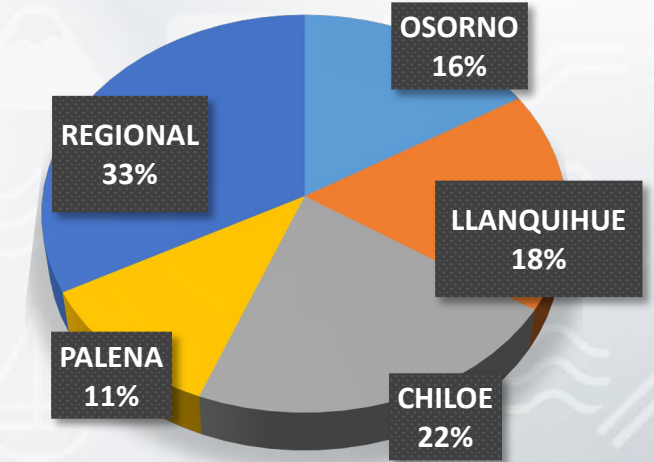

Resumen Ejecución por Provincia

PROVINCIA	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	19,01%	13.022.477.886
LLANQUIHUE	44,04%	9.835.926.854
CHILOE	55,33%	9.581.855.281
PALENA	49,29%	5.611.092.495
REGIONAL	30,26%	22.454.112.588
PPTO TERRITORIAL		60.505.465.104
PROGRAMAS	0,00%	16.203.071.000
TOTAL	33,05%	76.708.536.104

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROVINCIA



Detalle Provincia de Osorno

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	26	55.210.309.235	54%	28.584.693.652	8.126.675.755	51%	728.585.387	8,97%	7.398.090.368
PUERTO OCTAY	5	3.288.180.000	3%	266.506.973	888.755.107	6%	284.534.513	32,01%	604.220.594
PURRANQUE	6	6.592.068.000	6%	2.372.200.594	1.825.842.162	11%	738.217.355	40,43%	1.087.624.807
PUYEHUE	3	8.923.043.000	9%	623.540.695	153.867.605	1%	0	0,00%	153.867.605
RIO NEGRO	8	7.277.724.912	7%	3.649.719.245	1.810.795.942	11%	261.229.942	14,43%	1.549.566.000
SAN JUAN DE LA COSTA	6	9.025.036.482	9%	2.552.398.902	1.451.000.000	9%	305.899.010	21,08%	1.145.100.990
SAN PABLO	6	2.421.512.750	2%	52.851.234	746.470.716	5%	385.113.750	51,59%	361.356.966
PROVINCIA OSORNO	4	10.453.325.201	10%	5.362.729.887	1.075.471.701	7%	352.821.145	32,81%	722.650.556
TOTAL	64	103.191.199.580	100%	43.464.641.182	16.078.878.988	100%	3.056.401.102	19,01%	13.022.477.886

Detalle Provincia de Llanquihue

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PUERTO MONTT	21	43.801.090.984	31%	25.250.067.910	2.928.778.940	17%	816.521.313	28%	2.112.257.627
CALBUCO	7	24.294.696.839	17%	15.323.922.326	2.527.610.750	14%	844.800.986	33%	1.682.809.764
COCHAMO	11	12.190.572.418	9%	433.252.857	1.478.723.740	8%	454.749.961	31%	1.023.973.779
FRESIA	5	6.760.803.303	5%	1.396.135.315	955.811.185	5%	190.956.377	20%	764.854.808
FRUTILLAR	9	7.900.115.598	6%	1.018.490.915	3.488.314.688	20%	2.327.543.856	67%	1.160.770.832
LLANQUIHUE	2	778.151.000	1%	201.612.460	576.538.540	3%	381.387.011	66%	195.151.529
LOS MUERMOS	3	4.042.643.858	3%	556.757.937	250.000.000	1%	148.031.651	59%	101.968.349
MAULLIN	10	7.031.091.681	5%	6.248.174	1.407.405.476	8%	332.222.047	24%	1.075.183.429
PUERTO VARAS	11	14.807.332.009	10%	6.296.286.982	1.960.483.309	11%	1.345.783.705	69%	614.699.604
PROVINCIA LLANQUIHUE	7	21.783.472.508	15%	10.097.399.684	2.003.848.993	11%	899.591.860	45%	1.104.257.133
TOTAL	86	143.389.970.198	100%	60.580.174.560	17.577.515.621	100%	7.741.588.767	44%	9.835.926.854

Detalle Provincia de Chiloé

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
ANCUD	11	10.228.779.500	9%	4.117.579.407	2.102.036.515	10%	792.909.886	38%	1.309.126.629
CASTRO	5	19.490.791.000	16%	7.387.331.510	5.777.517.793	27%	4.308.011.610	75%	1.469.506.183
CHONCHI	11	15.088.930.367	13%	3.186.877.673	2.564.646.459	12%	1.455.657.144	57%	1.108.989.315
CURACO DE VELEZ	6	2.429.902.412	2%	438.653.115	1.239.463.301	6%	97.666.748	8%	1.141.796.553
DALCAHUE	10	11.466.234.060	10%	1.451.921.643	1.391.424.169	6%	353.122.760	25%	1.038.301.409
PUQUELDON	5	7.630.270.351	6%	3.471.097.721	1.779.899.127	8%	1.216.165.671	68%	563.733.456
QUEILEN	1	3.073.922.000	3%	1.045.300.291	50.000.000	0%	0	0%	50.000.000
QUELLON	5	2.292.531.146	2%	158.846.000	558.634.413	3%	0	0%	558.634.413
QUEMCHI	3	3.330.105.789	3%	1.485.286.866	766.921.134	4%	0	0%	766.921.134
QUINCHAO	5	8.408.152.000	7%	2.647.462.420	1.552.402.432	7%	692.471.769	45%	859.930.663
PROVINCIA CHILOE	6	36.285.189.266	30%	15.305.116.625	3.669.103.850	17%	2.954.188.324	81%	714.915.526
TOTAL	68	119.724.807.891	100%	40.695.473.271	21.452.049.193	100%	11.870.193.912	55%	9.581.855.281

Detalle Provincia de Palena

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
CHAITEN	3	10.810.929.000	8%	25.800.000	217.200.000	2%	0	0%	217.200.000
FUTALEUFU	6	2.738.764.817	2%	220.257.047	655.402.817	6%	391.451.674	60%	263.951.143
HUALAIHUE	8	4.880.080.000	4%	1.429.620.291	1.106.288.386	10%	373.650.739	34%	732.637.647
PALENA	5	6.838.770.000	5%	1.415.196.686	457.738.374	4%	2.100.000	0%	455.638.374
PROV. PALENA	5	102.648.720.000	80%	27.247.619.428	8.628.647.109	78%	4.686.981.778	54%	3.941.665.331
TOTAL	27	127.917.263.817	100%	30.338.493.452	11.065.276.686	100%	5.454.184.191	49%	5.611.092.495

Eficiencia por Provisión

Al 30 Abril

FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2026 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2026 - PROGRAMA 02			
		MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2026	PAGOS 2026	% EJECUCION	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	70.840.920.000	60.375.278.279	52,69%	10.465.641.721	60.375.278.279	20.624.482.049	34,16%	39.750.796.230
FATP	FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL	21.235.317.000	21.787.484.028	19,02%	-552.167.028	21.787.484.028	6.001.394.308	27,55%	15.786.089.720
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	7.384.215.483	6,44%	-7.384.215.483	7.384.215.483	4.220.669.120	57,16%	3.163.546.363
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	1.485.904.946	1,30%	-1.485.904.946	1.485.904.946	1.213.165.497	81,64%	272.739.449
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	8.000.000.000	6,98%	0	8.000.000.000	5.618.003.997	70,23%	2.381.996.003
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	482.138.273	0,42%	-482.138.273	482.138.273	173.355.802	35,96%	308.782.471
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	14.498.871.000	14.340.371.000	12,52%	158.500.000	14.340.371.000	0	0,00%	14.340.371.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	136.655.079	0,12%	-136.655.079	136.655.079	0	0,00%	136.655.079
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	385.947.977	0,34%	-385.947.977	385.947.977	0	0,00%	385.947.977
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	196.112.935	0,17%	-196.112.935	196.112.935	15.501.123	7,90%	180.611.812
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	1.000.000	0,00%	-1.000.000	1.000.000	0	0,00%	1.000.000
TOTAL	TOTAL	114.575.108.000	114.575.108.000	100%	0	114.575.108.000	37.866.571.896	33%	76.708.536.104

Eficiencia por Subtítulo

Al 30 Abril

PROGRAMA 02 - FNDR 2026

SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
22 Estudios e investigaciones	2.218.406.000	392.207.500	469.292.000	469.292.000	0,41%	0	0,00%	469.292.000
24 Transferencias Corrientes	22.344.908.870	2.026.022.000	17.513.287.000	17.513.287.000	15,29%	3.057.552.903	17,46%	14.455.734.097
26 Otros Gastos Corrientes	128.351.000	0	128.351.000	128.351.000	0,11%	120.399.710	93,81%	7.951.290
29 Activos no Financieros	24.267.740.347	5.529.299.633	11.356.612.000	11.356.612.000	9,91%	3.733.938.466	32,88%	7.622.673.534
31 Iniciativas de Inversión	502.188.800.139	170.435.508.081	53.368.432.000	53.368.432.000	46,58%	22.286.676.820	41,76%	31.081.755.180
33 Transferencias de Capital	68.846.444.838	7.760.205.405	31.739.134.000	31.739.134.000	27,70%	8.668.003.997	27,31%	23.071.130.003
	619.994.651.194	186.143.242.619	114.575.108.000	114.575.108.000	100%	37.866.571.896	33%	76.708.536.104

Eficiencia por Sector

Al 30 Abril

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
	COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	190.746.250.761	30,77%	46.612.552.431	23.773.684.921	21%	7.506.617.134	31,58%	16.267.067.787
SALUD	120.849.862.067	19,49%	38.867.194.368	16.822.634.416	15%	6.897.084.352	41,00%	9.925.550.064
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	103.124.069.583	16,63%	44.364.850.249	15.807.890.711	14%	5.864.250.993	37,10%	9.943.639.718
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	34.924.179.130	5,63%	21.648.131.762	672.203.928	1%	371.020.928	55,19%	301.183.000
RECURSOS HIDRICOS	24.259.272.938	3,91%	6.488.019.994	2.838.423.984	2%	693.461.091	24,43%	2.144.962.893
MULTISECTORIAL	51.740.328.263	8,35%	5.842.343.514	30.336.783.155	26%	6.709.938.615	22,12%	23.626.844.540
SEGURIDAD PUBLICA	21.151.856.649	3,41%	7.640.562.234	5.932.953.459	5%	3.860.624.560	65,07%	2.072.328.899
DEPORTES	31.244.826.379	5,04%	7.627.485.640	5.174.842.061	5%	2.439.051.963	47,13%	2.735.790.098
TURISMO Y COMERCIO	4.083.878.000	0,66%	1.681.338.819	1.647.621.000	1%	0	0,00%	1.647.621.000
ENERGIA	9.059.156.000	1,46%	125.778.069	5.095.927.115	4%	3.524.522.260	69,16%	1.571.404.855
PESCA	4.800.000.000	0,77%	604.099.000	1.512.300.000	1%	0	0,00%	1.512.300.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	14.836.728.546	2,39%	1.484.547.941	2.794.946.250	2%	0	0,00%	2.794.946.250
AGRICULTURA	5.869.551.878	0,95%	3.156.338.598	2.158.897.000	2%	0	0,00%	2.158.897.000
JUSTICIA	3.304.691.000	0,53%	0	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000
TOTAL	619.994.651.194	100%	186.143.242.619	114.575.108.000	100%	37.866.571.896	33%	76.708.536.104

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE OSORNO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/TERMINADOS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.880.905.650	7.880.905.650	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	22.210.242.780	5.657.190.512	0	5.853.377.524	10.699.674.744	RS	LIQUIDADO/PARA ADJUDICAR
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	699.055.000	47.479.757	0	50.000.000	601.575.243	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	112.067.112	15.501.123	64.707.959	17.028.929	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	329.270.698	0	79.000.000	102.979.302	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	930.411.000	502.435.848	420.658.016	427.975.152	0	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	5.000.000	3.270.092.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	0	361.091.750	283.573.250	RS*	LICITACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	304.640.000	0	0	304.640.000	0	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	1.012.364.034	0	114.676.966	0	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40039803	CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA DE BOMBEROS CANCURA, OSORNO	593.692.000	0	128.012.110	204.939.376	388.752.624	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.429.805.260	1.388.058.496	41.746.764	41.746.764	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.421.679.579	1.421.679.579	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	704.555.415	704.555.415	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	593.199.190	593.199.190	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	359.879.295	359.879.295	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	688.311.832	688.311.832	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	331.349.517	331.349.517	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.548.519.676	2.548.519.676	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.457.537.952	4.457.537.952	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	549.889.089	549.889.089	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042947	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE CHILLÁN , ENTRE AV. REPÚBLICA Y C.TEMUCO,OSORNO	1.456.900.000	0	122.667.374	122.667.374	1.334.232.626	RS	EJECUCION
TOTAL							52.912.425.235	28.584.693.652	728.585.387	7.629.822.865	16.697.908.718		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	429.057.000	0	0	100.000.000	329.057.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40059081	CONSERVACION FERIA PEDRO AGUIRRE CERDA OSORNO	507.089.000	0	0	321.987.890	185.101.110	RS*	ADJUDICACION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40062270	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIÓN JUAN DE DIOS GUAJARDO, OSORNO	204.510.000	0	0	50.000.000	154.510.000	RS*	ADJUDICACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40054690	REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA PAMPA SHILLING, OSORNO	43.865.000	0	0	23.865.000	20.000.000	RS	ADJUDICACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059784	REPOSICION CALLE PARALELA HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FRANCKE OSORNO	1.113.363.000	0	0	1.000.000	1.112.363.000	RS	CONVENIO
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							2.297.884.000	0	0	496.852.890	1.801.031.110		
TOTAL COMUNA DE OSORNO							55.210.309.235	28.584.693.652	728.585.387	8.126.675.755	18.498.939.828		
						COMUNA DE PUERTO OCTAY							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.158.223.000	21.934.080	0	300.000.000	836.288.920	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40051437	CONSERVACION DE 16 CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTORES RURALES, COMUNA DE PUERTO OCTAY	570.975.000	244.572.893	284.534.513	326.402.107	0	RS*	EJECUCION
TOTAL							1.729.198.000	266.506.973	284.534.513	626.402.107	836.288.920		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041628	ADQUISICION AMBULANCIA EMERGENCIA BASICA CECOSF CASCADAS, COMUNA PUERTO OCTAY	98.353.000	0	0	98.353.000	0	RS*	LICITACION DESIERTA
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1.197.961.000	0	0	50.000.000	1.147.961.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40075708	MEJORAMIENTO MULTICACHA TECHADA ESCUELA ALBERTO HURTADO COMUNDA DE PUERTO OCTAY	262.668.000	0	0	114.000.000	148.668.000	RS*	LICITACION
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							1.558.982.000	0	0	262.353.000	1.296.629.000		
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY							3.288.180.000	266.506.973	284.534.513	888.755.107	2.132.917.920		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PURRANQUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.593.749.000	865.213.301	134.313.597	250.000.000	478.535.699	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.176.646.000	1.056.428.269	0	80.000.000	40.217.731	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.232.931.000	0	5.692.746	618.544.000	614.387.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.170.070.000	450.559.024	598.211.012	662.298.162	57.212.814	RS	EJECUCION
TOTAL							5.173.396.000	2.372.200.594	738.217.355	1.610.842.162	1.190.353.244		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40047721	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS ANGELES, PURRANQUE	46.499.000	0	0	15.000.000	24.625.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40033259	REPOSICION CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PURRANQUE	1.372.173.000	0	0	200.000.000	1.172.173.000	RS	LICITACION
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							1.418.672.000	0	0	215.000.000	1.196.798.000		
TOTAL COMUNA DE PURRANQUE							6.592.068.000	2.372.200.594	738.217.355	1.825.842.162	2.387.151.244		
						COMUNA DE PUYEHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	585.020.395	0	48.867.605	0	RS*	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	38.520.300	0	55.000.000	102.851.700	RS	EJECUCION
TOTAL							830.260.000	623.540.695	0	103.867.605	102.851.700		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.092.783.000	0	0	50.000.000	8.042.783.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							8.092.783.000	0	0	50.000.000	8.042.783.000		
TOTAL COMUNA DE PUYEHUE							8.923.043.000	623.540.695	0	153.867.605	8.145.634.700		
						COMUNA DE RIO NEGRO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.147.632.000	1.054.667.638	25.409.121	54.251.065	38.713.297	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.003.769.912	999.242.248	1.220.604	4.527.664	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.299.153.000	1.054.987.961	0	240.292.625	3.872.414	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	21.312.000	0	519.689.986	562.842.014	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032117	CONSERVACION CAMINOS VECINALES DE ÑANCUÁN CHANCHAN, SAN FLORENTINO Y QUISQUELELFUN, RÍO NEGRO	1.065.206.000	519.509.398	234.600.217	545.696.602	0	RS*	EJECUCION
TOTAL							5.619.604.912	3.649.719.245	261.229.942	1.364.457.942	605.427.725		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052927	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR MILLACURA, COMUNA DE RIO NEGRO	505.990.000	0	0	50.000.000	455.990.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	30097977	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA RIO NEGRO	805.792.000	0	0	50.000.000	755.792.000	RS	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073026	REPOSICION DOS CAMIONES TOLVA PARA LA COMUNA DE RÍO NEGRO	346.338.000	0	0	346.338.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.658.120.000	0	0	446.338.000	1.211.782.000		
TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO							7.277.724.912	3.649.719.245	261.229.942	1.810.795.942	1.817.209.725		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.908.118.000	1.358.927.420	305.899.010	1.200.000.000	3.349.190.580	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.193.471.482	1.193.471.482	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	0	511.498.000	RS	SIN RATE DESDE 2024
TOTAL							7.613.087.482	2.552.398.902	305.899.010	1.200.000.000	3.860.688.580		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40066529	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD SAN JUAN DE LA COSTA	250.000.000	0	0	250.000.000	0	RS*	LICITACION DESIERTA
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071828	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUIZAS-CHEUQUEMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA	1.002.049.000	0	0	1.000.000	1.001.049.000	RS*	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40062700	ADQUISICION VEHÍCULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	159.900.000	0	0	0	159.900.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.411.949.000	0	0	251.000.000	1.160.949.000		
TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							9.025.036.482	2.552.398.902	305.899.010	1.451.000.000	5.021.637.580		
						COMUNA DE SAN PABLO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.131.350.000	21.991.200	0	99.000.000	1.010.358.800	RS	ADJUDICACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	30.860.034	0	1.026.966	20.000.000	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	126.140.000	0	126.140.000	126.140.000	0	RS*	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	258.973.750	0	258.973.750	258.973.750	0	RS*	TERMINADO
TOTAL							1.568.350.750	52.851.234	385.113.750	485.140.716	1.030.358.800		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40069510	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES VARIOS DEPARTAMENTOS, SAN PABLO	160.330.000	0	0	160.330.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40070438	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES PUTABLA, QUILEN Y CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO	406.477.000	0	0	1.000.000	405.477.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40074170	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO, SECTOR MAILE, COMUNA DE SAN PABLO	286.355.000	0	0	100.000.000	186.355.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							853.162.000	0	0	261.330.000	591.832.000		
TOTAL COMUNA DE SAN PABLO							2.421.512.750	52.851.234	385.113.750	746.470.716	1.622.190.800		
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	183.438.645	905.089.201	2.000.500.799	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	4.121.575.186	0	1.000.000	2.014.622.814	CF	LIQUIDACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	283.080.799	283.080.799	0	0	0	RS	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.082.712.402	913.329.902	169.382.500	169.382.500	0	RS*	TERMINADO
TOTAL							10.453.325.201	5.362.729.887	352.821.145	1.075.471.701	4.015.123.613		
TOTAL PROVINCIALES							10.453.325.201	5.362.729.887	352.821.145	1.075.471.701	4.015.123.613		
TOTAL PROVINCIA DE OSORNO							103.191.199.580	43.464.641.182	3.056.401.102	16.078.878.988	43.640.805.410		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.968.439.987	8.964.989.987	0	3.450.000	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	4.060.161.100	3.978.756.124	0	81.404.976	0	RS*	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	791.422.000	15.250.000	0	50.000.000	726.172.000	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	676.991.000	15.250.000	0	50.000.000	611.741.000	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	840.037.624	0	0	391.165.073	448.872.551	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.362.125.000	883.195.617	0	478.929.383	0	RS*	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.779.570.158	8.472.385.394	0	178.397.187	128.787.577	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.484.881.860	1.624.763.093	470.816.055	470.816.055	389.302.712	RE	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	262.200	0	86.143.945	2.705.391.855	RS	EXPROPIACIONES
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	1.000.117.739	0	0	110.000.000	890.117.739	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.309.135.000	0	0	50.000.000	1.259.135.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	980.175.000	0	0	50.000.000	930.175.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.934.861.516	1.293.352.495	345.705.258	391.533.321	249.975.700	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	30.000.000	216.329.000	RS	CONVENIO
TOTAL							36.226.044.984	25.248.204.910	816.521.313	2.421.839.940	8.556.000.134		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30034826	REPOSICION POSTA ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.396.009.000	1.863.000	0	50.000.000	1.344.146.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	1.263.261.000	0	0	50.000.000	1.213.261.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40067945	MEJORAMIENTO CALLE CALETERA AV. PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	898.600.000	0	0	50.000.000	848.600.000	RS	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129873	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL PUERTO MONTT	225.461.000	0	0	25.000.000	200.461.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071848	MEJORAMIENTO CALLE GÉNESIS E INMACULADA, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.530.350.000	0	0	1.000.000	1.529.350.000	RS	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40070609	ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE MIXTO SEGURIDAD PÚBLICA, COMUNA DE PUERTO MONTT	330.939.000	0	0	330.939.000	0	RS*	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40072266	CONSERVACION CENTRO SERVICIOS SALUD COMUNAL	1.602.366.000	0	0	0	1.602.366.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40072645	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS SECTOR VICUÑA MACKENNA POBLACION MIRASOL, PUERTO MONTT	328.060.000	0	0	0	328.060.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							7.575.046.000	1.863.000	0	506.939.000	7.066.244.000		
TOTAL COMUNA DE P. MONTT							43.801.090.984	25.250.067.910	816.521.313	2.928.778.940	15.622.244.134		
						COMUNA DE CALBUCO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO, CALBUCO	16.168.723.293	14.193.669.885	0	1.331.809.764	643.243.644	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.666.209.546	1.036.752.441	0	1.000.000	628.457.105	RS	LIQUIDACION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	93.500.000	93.500.000	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.359.482.000	0	0	50.000.000	1.309.482.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	844.800.986	844.800.986	139.583.014	RS*	EJECUCION
TOTAL							20.272.298.839	15.323.922.326	844.800.986	2.227.610.750	2.720.765.763		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40055239	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES VILLARROEL Y C. CONDELL, CALBUCO	2.800.863.000	0	0	100.000.000	2.700.863.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40055163	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA PULUQUI	1.221.535.000	0	0	200.000.000	1.021.535.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							4.022.398.000	0	0	300.000.000	3.722.398.000		
TOTAL COMUNA DE CALBUCO							24.294.696.839	15.323.922.326	844.800.986	2.527.610.750	6.443.163.763		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE COCHAMO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PEDZE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	15.000.000	46.157.800	RS	LIQUIDADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	0	0	10.000.000	112.370.000	RS	LIQUIDADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	480.875.535	40.561.764	72.602.579	350.000.000	90.313.771	RS*	EJECUCION
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	369.691.642	369.691.642	2.477.900.358	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	288.865.700	277.916.143	10.949.557	10.949.557	0	RS*	TERMINADO
26	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	1.506.183	0	1.506.183	1.506.183	0	RS*	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.556.268.000	29.558.750	0	100.000.000	1.426.709.250	RS	EJECUCION
						TOTAL	5.426.907.418	416.308.857	454.749.961	857.147.382	4.153.451.179		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.569.748.000	16.944.000	0	100.000.000	1.452.804.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ	1.053.383.000	0	0	50.000.000	1.003.383.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40070102	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL POCOIHUEN, COCHAMO	3.769.266.000	0	0	100.308.358	3.668.957.642	RS	LICITACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	332.627.000	0	0	332.627.000	0	RS*	EJECUCION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	38.641.000	0	0	38.641.000	0	RS*	EJECUCION
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.763.665.000	16.944.000	0	621.576.358	6.125.144.642		
						TOTAL COMUNA DE COCHAMO	12.190.572.418	433.252.857	454.749.961	1.478.723.740	10.278.595.821		
						COMUNA DE FRESIA							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	131.524.386	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	66.023.294	0	RS	REEVALUACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.779.772.238	564.573.930	190.956.377	692.166.305	523.032.003	RS	EJECUCION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	65.097.200	585.874.800	RS*	LICITACION
						TOTAL	3.459.853.303	1.396.135.315	190.956.377	954.811.185	1.108.906.803		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30435722	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, FRESIA	3.300.950.000	0	0	1.000.000	3.299.950.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	3.300.950.000	0	0	1.000.000	3.299.950.000		
						TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.760.803.303	1.396.135.315	190.956.377	955.811.185	4.408.856.803		
						COMUNA DE FRUTILLAR							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	362.566.601	0	87.005.399	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	0	RS	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	234.000.000	0	166.000.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	1.222.519.000	154.611.365	393.061.106	441.664.700	626.242.935	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025466	MEJORAMIENTO AVENIDA ARTURO ALESSANDRI NORTE, COMUNA DE FRUTILLAR	4.033.866.000	1.521.177	1.934.482.750	1.934.482.750	2.097.862.073	RS	EJECUCION
						TOTAL	6.430.914.598	1.018.490.915	2.327.543.856	2.688.318.675	2.724.105.008		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071230	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CASMA, COMUNA DE FRUTILLAR	228.318.000	0	0	70.000.000	158.318.000	RS	CONVENIO
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	485.755.000	0	0	485.755.000	0	RS	LICITACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	103.582.000	0	0	103.582.000	0	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40069991	CONSTRUCCION MÓDULOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED DE SALUD COMUNAL DE FRUTILLAR	336.469.000	0	0	70.000.000	266.469.000	RS	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40066152	CONSTRUCCION ESPACIO DE ENTRENAMIENTO PARA LAS ARTES MARCIALES, COMUNA DE FRUTILLAR.	315.077.000	0	0	70.659.013	244.417.987	RS	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.469.201.000	0	0	799.996.013	669.204.987		
						TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	7.900.115.598	1.018.490.915	2.327.543.856	3.488.314.688	3.393.309.995		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE LLANQUIHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	436.621.000	201.612.460	39.857.011	235.008.540	0	RS	EJECUCION
TOTAL							436.621.000	201.612.460	39.857.011	235.008.540	0		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054960	ADQUISICION EQUIPO MAMOGRAFO HOSPITAL DE LLANQUIHUE	341.530.000	0	341.530.000	341.530.000	0	RS*	TERMINADO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							341.530.000	0	341.530.000	341.530.000	0		
TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE							778.151.000	201.612.460	381.387.011	576.538.540	0		
						COMUNA DE LOS MUERMOS							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.546.425.858	556.757.937	148.031.651	150.000.000	839.667.921	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	50.000.000	1.274.261.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40049194	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA II, COMUNA DE LOS MUERMOS	1.171.957.000	0	0	50.000.000	1.121.957.000	RS	CONVENIO
TOTAL							4.042.643.858	556.757.937	148.031.651	250.000.000	3.235.885.921		
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS							4.042.643.858	556.757.937	148.031.651	250.000.000	3.235.885.921		
						COMUNA DE MAULLIN							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	10.000.000	127.618.000	RS	REEVALUACION-CON RATE OT
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	62.456.000	0	0	15.000.000	47.456.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	106.879.668	1.161.917.013	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	238.212.047	597.674.000	332.000.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.169.469.000	3.034.999	0	189.874.001	976.560.000	RS	EJECUCION
TOTAL							3.568.013.681	3.034.999	238.212.047	919.427.669	2.645.551.013		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30134574	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	1.167.917.000	3.213.175	0	100.000.000	1.064.703.825	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	366.003.000	0	0	100.516.808	265.486.192	RS*	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	286.015.000	0	94.010.000	182.335.000	103.680.000	RS*	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	964.982.000	0	0	10.000.000	954.982.000	RS	ADJUDICACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40057978	REPOSICION 3RA. COMISARIA MAULLIN	378.161.000	0	0	25.000.000	353.161.000	RS	CONVENIO
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073466	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE MAULLIN	300.000.000	0	0	70.125.999	229.874.001	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.463.078.000	3.213.175	94.010.000	487.977.807	2.971.887.018		
TOTAL COMUNA DE MAULLIN							7.031.091.681	6.248.174	332.222.047	1.407.405.476	5.617.438.031		
						COMUNA DE PUERTO VARAS							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.391.441.000	1.076.381.867	807.473.933	807.473.933	3.507.585.200	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.192.357.990	2.133.693.520	22.017.980	45.070.620	13.593.850	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	160.000.000	40.000.000	40.000.000	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.347.083.550	1.080.697.996	248.353.554	248.353.554	18.032.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	927.995.201	0	136.655.079	0	RS	EJECUCION
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	125.778.069	173.355.802	482.138.273	262.177.658	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	845.787.189	791.204.753	54.582.436	54.582.436	0	RS	TERMINADO
TOTAL							11.911.414.009	6.295.751.406	1.345.783.705	1.814.273.895	3.801.388.708		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	535.576	0	4.000.000	282.210.424	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.362.466.000	0	0	80.000.000	1.282.466.000	RS	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40064856	CONSERVACION VÍAS URBANAS DE PUERTO VARAS	920.256.000	0	0	1.000.000	919.256.000	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073778	MEJORAMIENTO MERCADO PIO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS	326.450.000	0	0	61.209.414	265.240.586	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.895.918.000	535.576	0	146.209.414	2.749.173.010		
TOTAL COMUNA DE P.VARAS							14.807.332.009	6.296.286.982	1.345.783.705	1.960.483.309	6.550.561.718		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.898.127.708	3.898.127.708	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	6.278.871.000	191.791.026	0	50.000.000	6.037.079.974	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.184.812.000	4.028.330.807	66.824.500	156.481.193	0	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	119.176.269	0	30.000.000	113.084.731	RS	REEVALUACION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	1.859.973.874	0	50.000.000	298.744.126	RS*	EJECUCION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	145.399.560	900.000.000	0	RS***	EJECUCION
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							17.782.789.708	10.097.399.684	212.224.060	1.236.481.193	6.448.908.831		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	658.308.000	0	658.308.000	658.308.000	0	RS*	TERMINADO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	29.059.800	0	29.059.800	29.059.800	0	RS*	TERMINADO
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40067969	CONSTRUCCION ETAPA 3, RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA	3.313.315.000	0	0	80.000.000	3.233.315.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							4.000.682.800	0	687.367.800	767.367.800	3.233.315.000		
TOTAL PROVINCIALES							21.783.472.508	10.097.399.684	899.591.860	2.003.848.993	9.682.223.831		
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE							143.389.970.198	60.580.174.560	7.741.588.767	17.577.515.621	65.232.280.017		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE ANCUD							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETU, ANCUD	2.028.170.000	1.642.222.023	0	385.947.977	0	RE	REEVALUACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.370.127.000	536.417.502	0	81.816.127	751.893.371	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	1.389.476.000	808.091.051	210.734.071	581.384.949	0	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	311.244.500	0	311.244.500	311.244.500	0	RS*	TERMINADO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.390.927.000	1.130.848.831	229.163.815	229.163.815	30.914.354	RS	EJECUCION
TOTAL							6.489.944.500	4.117.579.407	751.142.386	1.589.557.368	782.807.725		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014527	MEJORAMIENTO CALLE BAQUEDANO Y COSTANERA NORTE, COMUNA DE ANCUD	669.290.000	0	0	50.000.000	619.290.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30093353	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA DE SALUD RURAL SECTOR NAL, COMUNA DE ANCUD	1.459.839.000	0	0	50.000.000	1.409.839.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40057328	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR CARACOLES, ANCUD	238.808.000	0	41.767.500	42.537.500	196.270.500	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40045547	CONSTRUCCION CUARTEL 2A COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	103.460.000	0	0	50.000.000	53.460.000	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	566.881.000	0	0	128.902.147	437.978.853	RS*	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	422.079.000	0	0	101.039.500	321.039.500	RS*	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071987	REPOSICIÓN TALLER DE OPERACIONES.	278.478.000	0	0	90.000.000	188.478.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.738.835.000	0	41.767.500	512.479.147	3.226.355.853		
TOTAL COMUNA DE ANCUD							10.228.779.500	4.117.579.407	792.909.886	2.102.036.515	4.009.163.578		
						COMUNA DE CASTRO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	844.703.000	542.161.724	83.177.856	302.541.276	0	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	6.845.169.786	4.224.833.754	5.055.379.661	3.284.894.553	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	2.394.442.000	0	0	100.000.000	2.294.442.000	RS	REEVALUACION
TOTAL							18.424.589.000	7.387.331.510	4.308.011.610	5.457.920.937	5.579.336.553		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	128.911.000	0	0	128.911.000	0	RS*	EJECUCION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	600.874.000	0	0	100.685.856	500.188.144	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40070257	MEJORAMIENTO PLAZA JAVIERA CARRERA CASTRO	336.417.000	0	0	90.000.000	246.417.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.066.202.000	0	0	319.596.856	746.605.144		
TOTAL COMUNA DE CASTRO							19.490.791.000	7.387.331.510	4.308.011.610	5.777.517.793	6.325.941.697		
						COMUNA DE CHONCHI							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	92.764.367	61.313.682	0	1.000.000	30.450.685	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	3.123.618.991	814.531.309	1.129.933.999	533.871.010	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	1.945.000	454.816.792	454.816.792	3.270.962.208	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	2.394.442.000	0	71.317.505	71.317.505	2.323.124.495	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	99.000.000	1.191.291.000	RS	LICITACION DESIERTA
TOTAL							12.292.645.367	3.186.877.673	1.340.665.606	1.756.068.296	7.349.699.398		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052247	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE CHONCHI	555.683.000	0	0	50.000.000	444.546.400	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40010316	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA HUILLINCO, COMUNA DE CHONCHI	603.419.000	0	114.991.538	350.000.000	253.419.000	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040291	CONSERVACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE CHONCHI	326.471.000	0	0	98.178.163	228.292.837	RS*	ADJUDICACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071482	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTOR NORESTE, COMUNA DE CHONCHI	806.312.000	0	0	1.000.000	805.312.000	RS	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039346	REPOSICION DE 2 AMBULANCIAS BASICAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	309.400.000	0	0	309.400.000	0	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40066148	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR PUCATUE HUICHA, COMUNA DE CHONCHI	195.000.000	0	0	0	195.000.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.796.285.000	0	114.991.538	808.578.163	1.926.570.237		
TOTAL COMUNA DE CHONCHI							15.088.930.367	3.186.877.673	1.455.657.144	2.564.646.459	9.276.269.635		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	190.867.000	103.039.646	39.604.980	56.508.734	31.318.620	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	37.849.624	55.062.180	200.000.000	157.101.376	RS	EJECUCION
TOTAL							585.818.000	140.889.270	94.667.160	256.508.734	188.419.996		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	173.145.000	166.622.433	0	6.522.567	0	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	265.941.412	131.141.412	2.999.588	134.800.000	0	RS*	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063532	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES, CURACO DE VELEZ	498.111.000	0	0	326.632.000	171.479.000	RS*	ADJUDICACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40051701	REPOSICION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA BOMBEROS DE HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ	115.920.000	0	0	15.000.000	100.920.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056255	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	790.967.000	0	0	500.000.000	290.967.000	RS*	ADJUDICACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.844.084.412	297.763.845	2.999.588	982.954.567	563.366.000		
TOTAL COMUNA DE C.VELEZ							2.429.902.412	438.653.115	97.666.748	1.239.463.301	751.785.996		
						COMUNA DE DALCAHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.414.744.060	1.209.705.869	128.794.172	205.038.191	0	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	8.950.000	0	50.000.000	2.911.083.000	RS	ADJUDICACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	16.200.000	24.300.000	24.300.000	1.384.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	217.065.774	200.028.588	600.000.000	332.417.226	RS*	EJECUCION
TOTAL							5.576.144.060	1.451.921.643	353.122.760	879.338.191	3.244.884.226		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40061640	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CALEN, COMUNA DE DALCAHUE	1.284.197.000	0	0	50.000.000	1.234.197.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40054303	AMPLIACION REDES DE A. POTABLE, ALCANT Y CONSTR. MURO DE CONTENC. AVDA. MOCOPULLI, DALCAHUE	2.085.979.000	0	0	100.000.000	1.985.979.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	1.940.477.000	0	0	50.000.000	1.890.477.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40026493	CONSTRUCCION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE DALCAHUE	68.437.000	0	0	2.085.978	66.351.022	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40070836	REPOSICION BUS MUNICIPAL, COMUNA DE DALCAHUE	310.000.000	0	0	310.000.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40068201	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE	201.000.000	0	0	0	201.000.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.890.090.000	0	0	512.085.978	5.378.004.022		
TOTAL COMUNA DE DALCAHUE							11.466.234.060	1.451.921.643	353.122.760	1.391.424.169	8.622.888.248		
						COMUNA DE PUQUELDON							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.724.474.841	17.100.000	50.000.000	525.161.159	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	1.574.814.000	8.800.655	0	300.000.000	1.266.013.345	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	717.773.000	593.250.434	122.570.000	124.522.566	0	RS*	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	305.443.000	144.571.791	115.701.320	160.871.209	0	RS*	CONVENIO
TOTAL							5.897.666.000	3.471.097.721	255.371.320	635.393.775	1.791.174.504		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	599.158.390	0	599.158.390	599.158.390	0	RS*	TERMINADO
29	05	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	361.635.961	0	361.635.961	361.635.961	0	RS*	TERMINADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40013816	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON	771.810.000	0	0	183.711.001	588.098.999	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.732.604.351	0	960.794.351	1.144.505.352	588.098.999		
TOTAL COMUNA DE PUQUELDON							7.630.270.351	3.471.097.721	1.216.165.671	1.779.899.127	2.379.273.503		
						COMUNA DE QUEILEN							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	1.978.621.709	RS	REEVALUACION
TOTAL							3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	1.978.621.709		
TOTAL COMUNA DE QUEILEN							3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	1.978.621.709		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE QUELLON							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	4000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	5.000.000	1.406.317.146	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	117.081.000	0	5.000.000	8.009.000	RS	LIQUIDACION
TOTAL							1.616.582.146	158.846.000	0	43.410.000	1.414.326.146		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	363.037.000	0	0	363.037.000	0	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	312.912.000	0	0	152.187.413	160.724.587	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							675.949.000	0	0	515.224.413	160.724.587		
TOTAL COMUNA DE QUELLON							2.292.531.146	158.846.000	0	558.634.413	1.575.050.733		
						COMUNA DE QUEMCHI							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.654.842.789	1.485.286.866	0	166.921.134	2.634.789	RS	EJECUCION
TOTAL							1.654.842.789	1.485.286.866	0	166.921.134	2.634.789		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063487	CONSERVACION DE CAMINOS ISLAS TAUCULON, AULIN Y BUTACHAUQUES, COMUNA DE QUEMCHI.	974.355.000	0	0	500.000.000	474.355.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40005528	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	700.908.000	0	0	100.000.000	600.908.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.675.263.000	0	0	600.000.000	1.075.263.000		
TOTAL COMUNA DE QUEMCHI							3.330.105.789	1.485.286.866	0	766.921.134	1.077.897.789		
						COMUNA DE QUINCHAO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.310.834.000	1.231.903.855	178.500	30.000.000	48.930.145	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.822.540.000	0	0	200.000.000	1.622.540.000	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.480.736.000	1.415.558.565	692.293.269	772.402.432	292.775.003	RS	EJECUCION
TOTAL							5.614.110.000	2.647.462.420	692.471.769	1.002.402.432	1.964.245.148		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	391.291.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40067325	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO	2.352.751.000	0	0	500.000.000	1.852.751.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.794.042.000	0	0	550.000.000	2.244.042.000		
TOTAL COMUNA DE QUINCHAO							8.408.152.000	2.647.462.420	692.471.769	1.552.402.432	4.208.287.148		
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	3.477.985.000	527.771.961	0	200.000.000	2.750.213.039	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	4.955.228.139	4.955.228.139	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUO, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.707.826.752	0	100.000.000	3.294.498.248	RE	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	17.878.003.000	6.411.745.496	4.401.876	200.000.000	11.266.257.504	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.091.573.127	559.298.027	532.275.100	532.275.100	0	RS*	TERMINADO
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40062497	DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO INFRAEST. PORTUARIA 04 SECT. REZAGO, QUEMCHI-QUINCHAO Y QUELLON	190.995.000	143.246.250	47.748.750	47.748.750	0	RS	TERMINADO
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.000.000	0	2.369.762.598	2.449.000.000	0	RS***	EJECUCION
24	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA B) GLOSA 03 GESTIÓN HÍDRICA (Subtítulo 24.03.014)	140.080.000	0	0	140.080.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							36.285.189.266	15.305.116.625	2.954.188.324	3.669.103.850	17.310.968.791		
TOTAL PROVINCIALES							36.285.189.266	15.305.116.625	2.954.188.324	3.669.103.850	17.310.968.791		
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE							119.724.807.891	40.695.473.271	11.870.193.912	21.452.049.193	57.516.148.827		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CHAITEN							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	4.255.389.000	25.800.000	0	200.000.000	4.029.589.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058788	REPOSICION AMBULANCIAS COMUNA DE CHAITEN	172.000.000	0	0	17.200.000	0	RS*	LICITACION
TOTAL							4.427.389.000	25.800.000	0	217.200.000	4.029.589.000		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042493	MEJORAMIENTO DIVERASS CALLES SECTOR SUR, CHAITEN	6.383.540.000	0	0	0	6.383.540.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							6.383.540.000	0	0	0	6.383.540.000		
TOTAL COMUNA DE CHAITEN							10.810.929.000	25.800.000	0	217.200.000	10.413.129.000		
						COMUNA DE FUTALEUFU							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	75.660.000	0	50.398.000	0	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.415.585.000	44.597.047	0	100.000.000	1.270.987.953	RS	EJECUCION
TOTAL							1.659.803.000	220.257.047	0	168.558.000	1.270.987.953		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056911	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES COMUNA DE FUTALEUFU	722.117.000	0	272.558.147	360.000.000	362.117.000	RS*	EJECUCION
26	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	126.844.817	0	118.893.527	126.844.817	0	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073440	MEJORAMIENTO PASEO ACCESO PONIENTE, COMUNA DE FUTALEUFU	230.000.000	0	0	0	230.000.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.078.961.817	0	391.451.674	486.844.817	592.117.000		
TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU							2.738.764.817	220.257.047	391.451.674	655.402.817	1.863.104.953		
						COMUNA DE HUALAIHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	88.920.096	0	165.875.904	0	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.966.390.000	1.324.404.045	373.650.739	588.469.982	53.515.973	RS	EJECUCION
TOTAL							2.221.186.000	1.413.324.141	373.650.739	754.345.886	53.515.973		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	30386191	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE HORNOPIREN, HUALAIHUE	81.700.000	15.600.000	0	66.100.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30397627	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA, COMUNA DE HUALAIHUE	1.446.756.000	696.150	0	50.000.000	1.396.059.850	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40053338	CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS RIO NEGRO HORNOPIREN, HUALAIHUE	115.300.000	0	0	30.000.000	85.300.000	RS	ADJUDICADA
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40065407	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COMUNA DE HUALAIHUE	341.685.000	0	0	170.842.500	170.842.500	RS*	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129886	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE HUALAIHUE	344.715.000	0	0	35.000.000	309.715.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40077324	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIO PUBLICO SECTOR LOS CANELOS, HORNOPIRÉN, COMUNA DE HUALAIHUÉ	328.738.000	0	0	0	328.738.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.658.894.000	16.296.150	0	351.942.500	2.290.655.350		
TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE							4.880.080.000	1.429.620.291	373.650.739	1.106.288.386	2.344.171.323		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PALENA							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.400.871.686	0	20.563.374	28.313.940	RS	EJECUCION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	87.175.000	28.500.000	RS*	EJECUCION
TOTAL							1.579.749.000	1.415.196.686	0	107.738.374	56.813.940		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40072992	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACION, COLEGIO ROBERTO WHITE GESELL DE PALENA	541.587.000	0	2.100.000	100.000.000	441.587.000	RS	ADJUDICACION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40007928	CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA	4.529.799.000	0	0	250.000.000	4.279.799.000	RS	CONVENIO
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40076387	REPOSICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	187.635.000	0	0	0	187.635.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.259.021.000	0	2.100.000	350.000.000	4.909.021.000		
TOTAL COMUNA DE PALENA							6.838.770.000	1.415.196.686	2.100.000	457.738.374	4.965.834.940		
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	16.612.042.000	4.059.795.859	540.410.883	2.947.847.628	9.604.398.513	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	34.164.961.000	9.817.932.092	3.680.258.237	3.732.246.481	20.614.782.427	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	50.292.204.000	13.369.891.477	0	400.000.000	36.522.312.523	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	1.000.000	28.599.000	S/R	SIN RS 2024
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	466.312.658	780.000.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							101.878.806.000	27.247.619.428	4.686.981.778	7.861.094.109	66.770.092.463		
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063704	REPOSICION EQUIPOS RAYOS X OSTEOPULMONARES HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	769.914.000	0	0	767.553.000	358.012.623	RS*	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							769.914.000	0	0	767.553.000	358.012.623		
TOTAL PROVINCIALES							102.648.720.000	27.247.619.428	4.686.981.778	8.628.647.109	67.128.105.086		
TOTAL PROVINCIA DE PALENA							127.917.263.817	30.338.493.452	5.454.184.191	11.065.276.686	86.714.345.302		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						REGIONALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	12.180.626	401.763.374	RS*	DETENIDO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	337.979.497	337.978.503	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LOS RSD Y SU GESTION EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	208.722.500	0	11.161.500	0	RS*	EJECUCION
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	6.400.000.000	0	76.078.087	6.400.000.000	0	RS***	EJECUCION
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	200.000.000	0	0	200.000.000	0	RS***	
24	03-011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	Aplicación letra c) glosa 03 Residuos Sólidos Domiciliarios	372.507.000	0	0	372.507.000	0	RS***	
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	0	5.618.003.997	8.000.000.000	0	RS**	EJECUCION
TOTAL							16.282.293.000	208.722.500	5.694.082.084	15.333.828.623	739.741.877		
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	627.486.611	320.615.761	532.193.710	462.961.679	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40032367	DIAGNOSTICO DE COND. NATURALES VARIOS SECTORES ZONAS DE REZAGO NORTE, REGION DE LOS LAGOS	1.512.982.000	0	0	50.000.000	1.462.982.000	RS	EJECUCION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLITICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL, REGION DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	218.250.875	40.249.125	RS*	LICITACION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	15.000.000	238.000.000	RS*	CONVENIO
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARITIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	28.992.305	541.512.695	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	149.000.000	11.075.636.000	RS	EXPROPIACIONES
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	15.000.000	518.060.000	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40046973	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVA ZONA PRIMARIA EXTRAPUERTO EMPORMONTT, PUERTO MONTT	3.614.118.000	0	0	1.000.000	3.613.118.000	RS	CONVENIO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	142.300.000	0	0	142.300.000	0	RS*	LICITACION
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	102.567.000	0	0	102.567.000	0	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40055362	ANALISIS PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LOS LAGOS	323.520.000	0	0	5.000.000	318.520.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064760	CONSERVACION POLIDEPORTIVO ARENA PUERTO MONTT	1.803.653.000	0	0	500.000.000	1.303.653.000	S/R	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40036420	HABILITACION Centro Cardioquirúrgico para Macro Zona Sur Austral	2.494.106.000	442.023.638	679.506.079	1.029.999.999	1.022.082.363	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40056853	CONSTRUCCION CAMPUS SALUD, INGENIERIA Y ARTES, ULAGOS, PUERTO MONTT	6.641.168.000	0	0	100.000.000	6.541.168.000	RS	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	50.000.000	5.434.512.000	RS	EJECUCION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40067537	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA CUATRO CUARTELES FRONTERIZOS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS	167.421.000	0	0	167.421.000	0	RS*	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072933	ADQUISICION UNIDAD DESPLIEGUE POLICIA MARITIMA PARA GOB MARITIMA DE PTO MONTT	740.660.000	0	0	0	740.660.000	RS*	CONVENIO
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40073955	ACTUALIZACION DISEÑO DE INDICADORES Y METAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION REGIONAL CAMBIO CLIMATICO (PARCC) LOS LAGOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							37.589.350.000	1.069.510.249	1.000.121.840	3.106.724.889	33.413.114.862		
TOTAL REGIONAL							53.871.643.000	1.278.232.749	6.694.203.924	18.440.553.512	34.152.856.739		
						PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD							
24	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	0	RS***	EJECUCION
33	RTE A BO	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072971	TRANSFERENCIA A JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE	3.231.105.000	0	3.050.000.000	3.231.105.000	0	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	EJECUCION	FRPD	PROVISION FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO (SIN DISTRIBUIR)	3.503.147.000	0	0	3.503.147.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
33	03	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION		FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL (SIN DISTRIBUIR)	6.026.658.000	0	0	6.026.658.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
TOTAL							17.260.910.000	0	3.050.000.000	17.260.910.000	0		
TOTAL							17.260.910.000	0	3.050.000.000	17.260.910.000	0		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROGRAMAS DE ARRASTRE							
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	200.000.000	650.811.191	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	239.073.000	0	33.150.000	50.577.000	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	1.388.809.167	0	119.308.000	531.882.833	RS**	EJECUCION
33	03	TRANSPORTE	FRPD	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.823.578.319	0	1.750.122.000	11.406.299.681	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.878	428.154.116	0	748.375.000	3.020.762	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.001.000	608.377.496	0	640.355.000	1.268.504	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.001.000	345.714.459	0	351.681.000	2.605.541	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	385.283.360	0	299.178.000	15.538.640	RS**	EJECUCION
33	03	PESCA	FRPD	INDESPA	40063557	TRANSFERENCIA PROGRAMA TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.900.000.000	604.099.000	0	1.295.901.000	1.000.000.000	RS**	EJECUCION
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	SERNATUR	40064817	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.750.000.000	450.150.010	0	1.299.836.000	13.990	RS**	EJECUCION
33	03	TRANSPORTE	FAR	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	91.000.000	7.691.000.000	RS**	EJECUCION/MODIF CONV PROGRAMACION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	29.375.709	0	1.145.024.000	291	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.960	183.817.960	0	26.183.000	0	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	CORFO	40067360	CAPACITACION CENTRO TECNOLOGICO PARA LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGION DE LOS LAGOS	4.850.000.000	0	0	1.321.000.000	3.529.000.000	RS**	EJECUCION
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	40075384	TRANSFERENCIA CONECTACOOOP CIRCULAR, PROGRAMA DE INCUBACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA DESARROLLAR	266.852.000	20.416.000	0	147.133.000	99.303.000	RS**	EJECUCION
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad San Sebastián	40075417	TRANSFERENCIA SOLUCIONES SOCIO SANITARIAS PARA LA VISITACIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE ÁREA	243.000.000	20.416.000	0	214.302.000	8.282.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Santiago de Chile	40075430	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA	300.000.000	1.000.000	0	114.777.000	184.223.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Chile	40075429	TRANSFERENCIA VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO DE COSECHA DE AGUA SUBSUPERFICIAL Y DESARROLLO DE EST	174.060.000	0	0	103.875.000	70.185.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	40075416	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO MARÍTIMO PORTUARIO EN EL MARCO	300.000.000	752.000	0	218.405.000	80.843.000	RS**	EJECUCION
						TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE	43.204.664.838	7.760.205.405	0	10.119.605.000	25.324.854.433		
						PROGRAMAS SALUD							
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.214.000	583.423.000	0	24.790.000	1.000	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	558.564.000	458.564.000	0	100.000.000	0	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	0	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	504.035.000	0	454.800.000	615.165.000	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40063903	PROTECCION DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA PROVINCIA DE PALENA y COCHAMÓ	878.618.605	0	0	321.087.000	557.531.605	RS**	CONVENIO
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40063898	PROTECCION DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA PROVINCIA LLANQUIHUE	1.289.643.265	0	0	435.799.000	853.844.265	RS**	CONVENIO
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40065461	PROTECCION Y APOYO SALUD INTEGRAL E INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA	1.305.293.570	0	0	0	1.305.293.570	RS**	RES EN TRAMITE GORE
						TOTAL PROGRAMAS SALUD	6.814.333.440	2.026.022.000	0	1.456.476.000	3.331.835.440		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROGRAMAS NUEVOS							
24	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	SENDA	40072688	PREVENCION SENDA - GORE LOS LAGOS: MÁS COMUNIDAD, MÁS PREVENCIÓN	333.537.000	0	0	156.724.000	176.813.000	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SAG Región de Los Lagos	40063864	CONTROL PROGRAMA COMUNITARIO DE CONTROL DE VISÓN AMERICANO EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	452.992.000	0	0	0	452.992.000	RS**	RES APROBACION EN CONTRALORIA
33	03	PESCA	LIBRE	CORFO	40064703	CAPACITACION TRANSFERENCIA PRODUCTIVA Y ECONOMIA CIRCULAR PARA LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN	1.600.000.000	0	0	50.000.000	1.550.000.000	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	ProChile	40071275	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	248.500.000	0	0	0	248.500.000	RS**	RES APROBACION EN CONTRALORIA
24	09	MULTISECTORIAL	LIBRE	GORE Los Lagos	40077562	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" PR3101021001- EX ANTE	710.745.000	0	0	108.500.000	602.245.000	RS**	EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							3.345.774.000	0	0	315.224.000	3.030.550.000		

						PROGRAMAS FRPD - Ciencia-Tecnología, Conocimiento e Innovación							
33	01	PESCA	FRPD	Universidad Austral de Chile	50000231	PREDICCIÓN Y MANEJO INTELIGENTE DE CALIGIDOSIS: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UNA SALMONICULTURA SOSTENIBLE	300.000.000	0	0	166.399.000	133.601.000	RS**	CONVENIO
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Católica de Chile	50000235	INICIO DE UN PLAN PILOTO DE VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS Y VRS BOVINA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	300.000.000	0	0	92.390.000	207.610.000	RS**	CONVENIO
33	01	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	Corporación Instituto Profesional Santo Tomás	50000240	MONTE VERDE EL ORIGEN, INNOVACIÓN DESDE EL PATRIMONIO	251.878.000	0	0	147.785.000	104.093.000	RS**	CONVENIO
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	Universidad San Sebastián	50000244	GESTIÓN HÍDRICA SUSTENTABLE EN CENTROS DE SALUD: ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES Y PATÓGENOS MULTIRRESISTENTES UTILIZANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS	270.000.000	0	0	71.542.000	198.458.000	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	50000248	PLATAFORMA MULTI-ÓMICA PARA LA MITILCULTURA SOSTENIBLE: SOLUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS AL DESAFÍO DE LA FIJACIÓN Y EL DESPRENDIMIENTO DE SEMILLAS DE MYTILUS CHILENSIS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	265.500.000	0	0	22.429.000	243.071.000	RS**	CONVENIO
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	50000252	CENTRO DE FORMACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL: INNOVA PUERTO MONTT	282.000.000	0	0	108.081.000	173.919.000	RS**	CONVENIO
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	Universidad de Los Lagos	50000254	DETERMINACIÓN DE LA LINEA BASE DE HUELLA DE CARBONO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS PRINCIPALES FRUTALES Y CULTIVOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	300.000.000	0	0	44.249.000	255.751.000	RS**	CONVENIO
33	01	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FRPD	Universidad San Sebastián	50000258	MENTES CIRCULARES Y SOSTENIBLES: INNOVANDO DESDE LA EDUCACIÓN PARA EL FUTURO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	610.000.000	0	0	155.744.000	454.256.000	RS**	CONVENIO
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							2.579.378.000	0	0	808.619.000	1.770.759.000		

TOTAL PROGRAMAS	55.944.150.278	9.786.227.405	0	12.699.924.000	33.457.998.873
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)	73.205.060.278	9.786.227.405	3.050.000.000	29.960.834.000	33.457.998.873
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2025	621.299.944.764	186.143.242.619	37.866.571.896	114.575.108.000	320.714.435.168

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
S/R=SIN RATE 2025
