

ESTADO DE SITUACIÓN

Ejecución Presupuestaria FNDR


Mayo 2026

División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional de Los Lagos




www.gorelосlagos.cl

MARCO PRESUPUESTARIO FNDR – Programa 02 2026

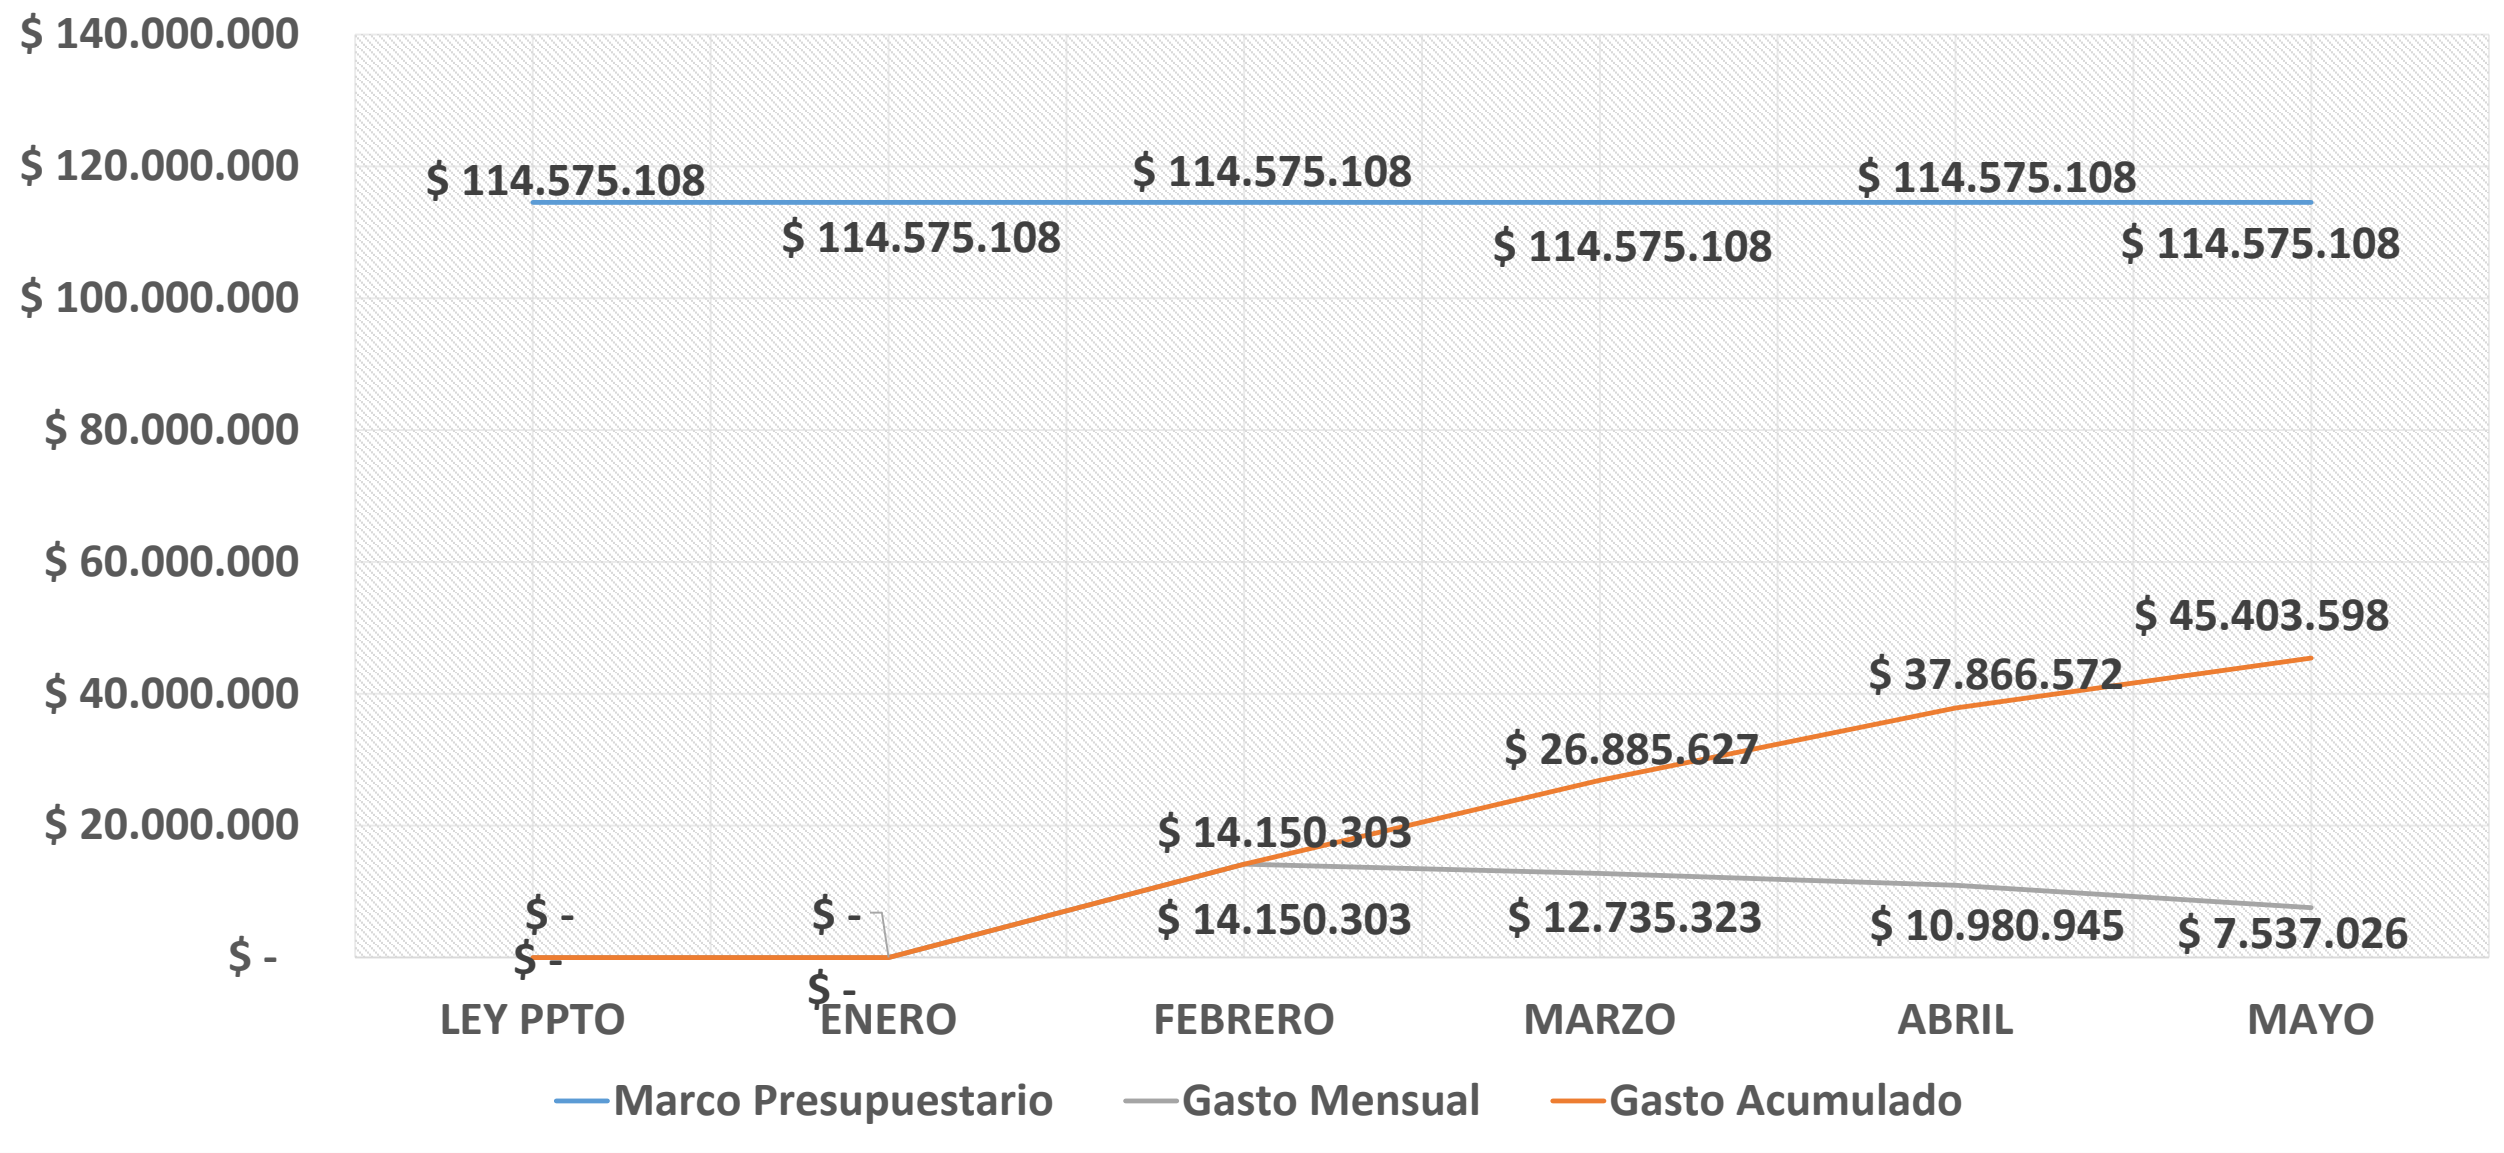


EFICIENCIA PRESUPUESTARIA FNDR

Programa 02 2026

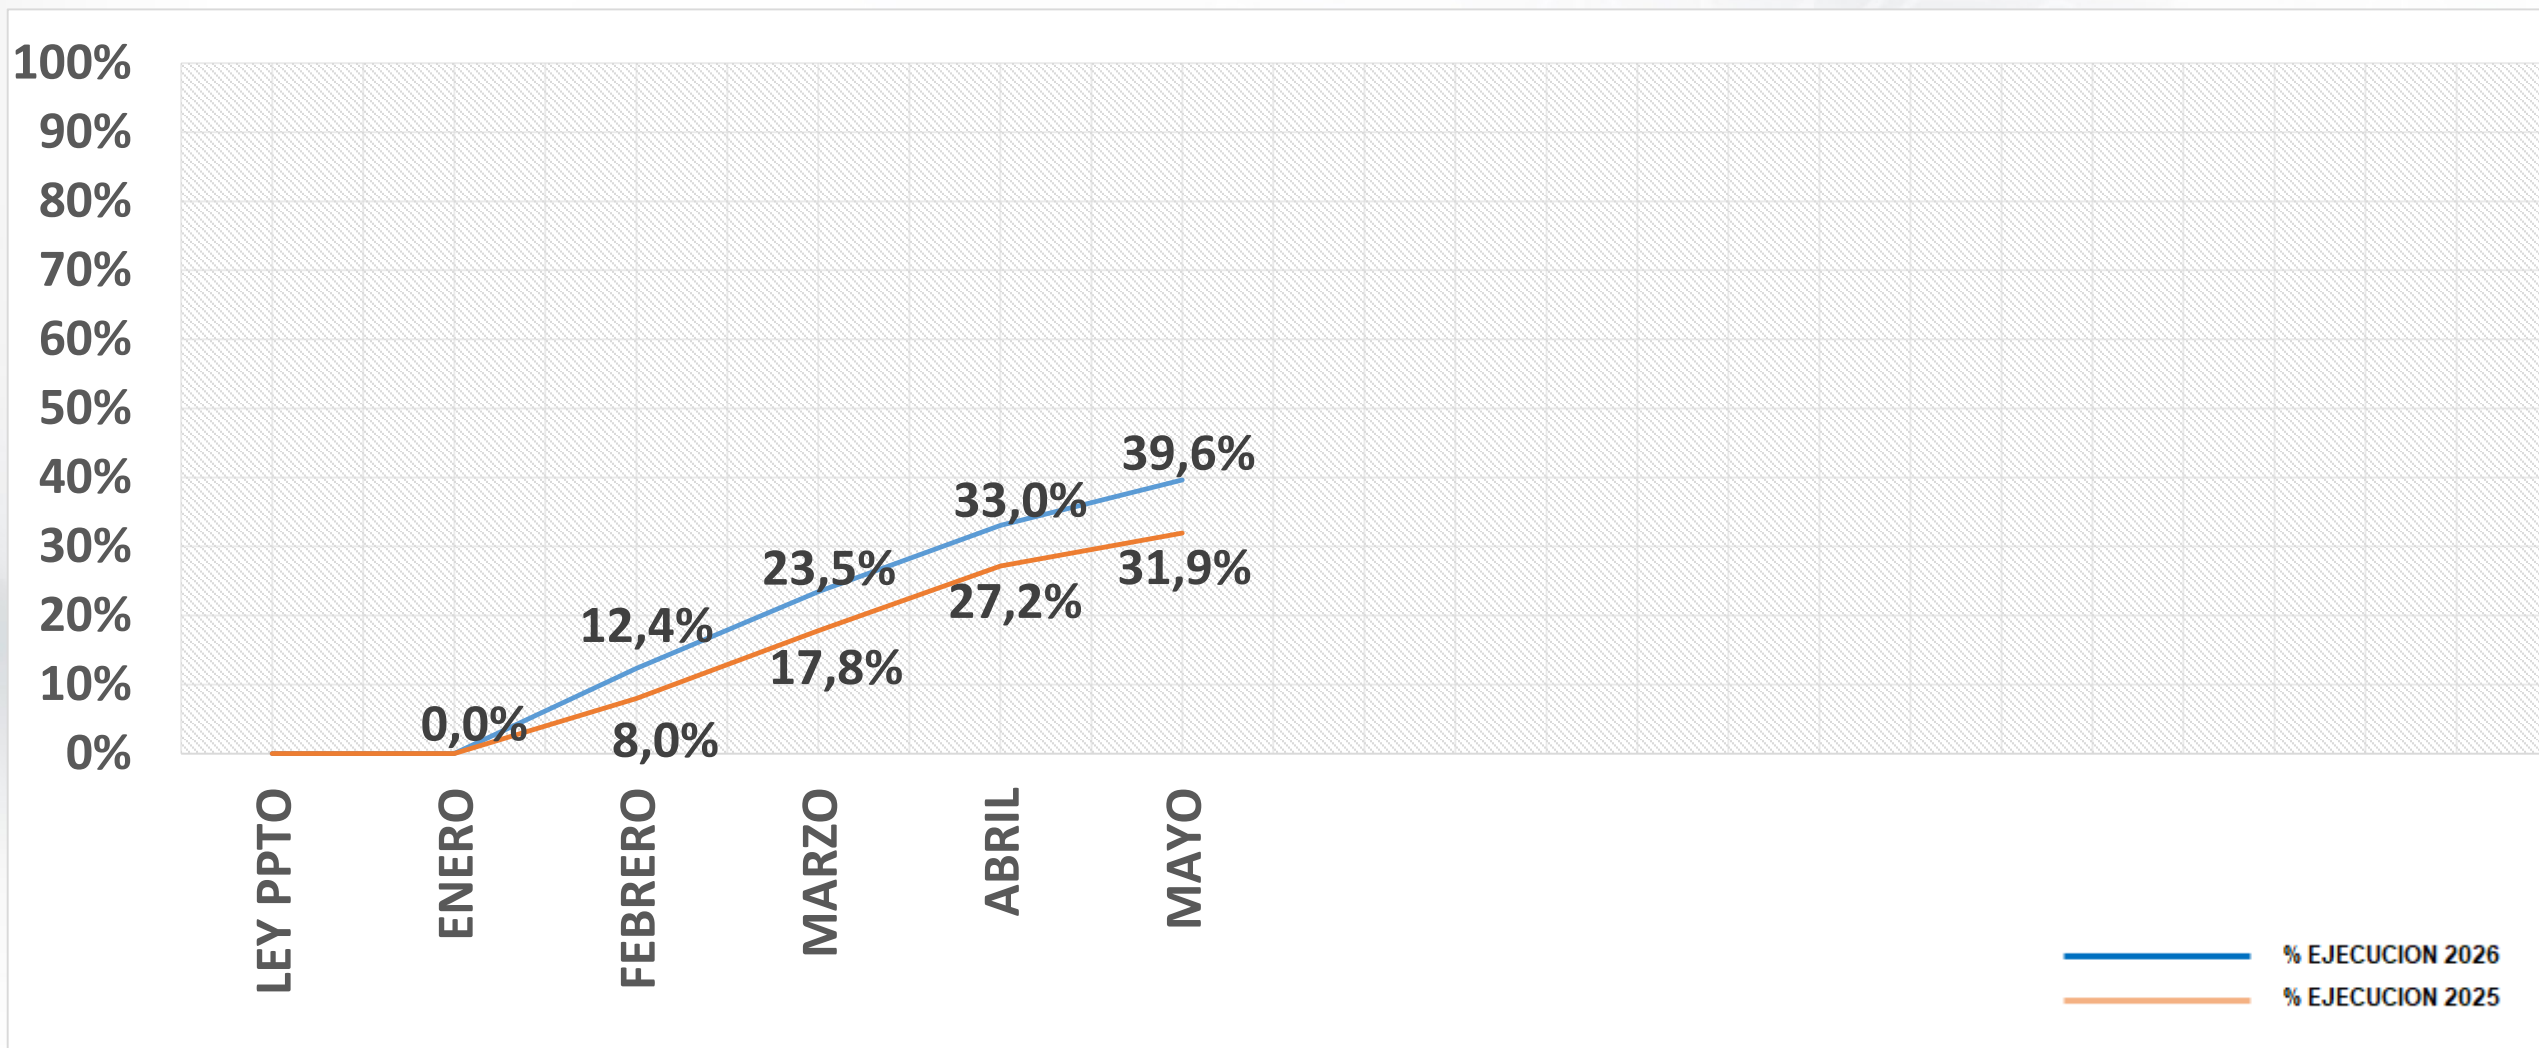


Eficiencia Presupuestaria por Provincia

al 31 Mayo

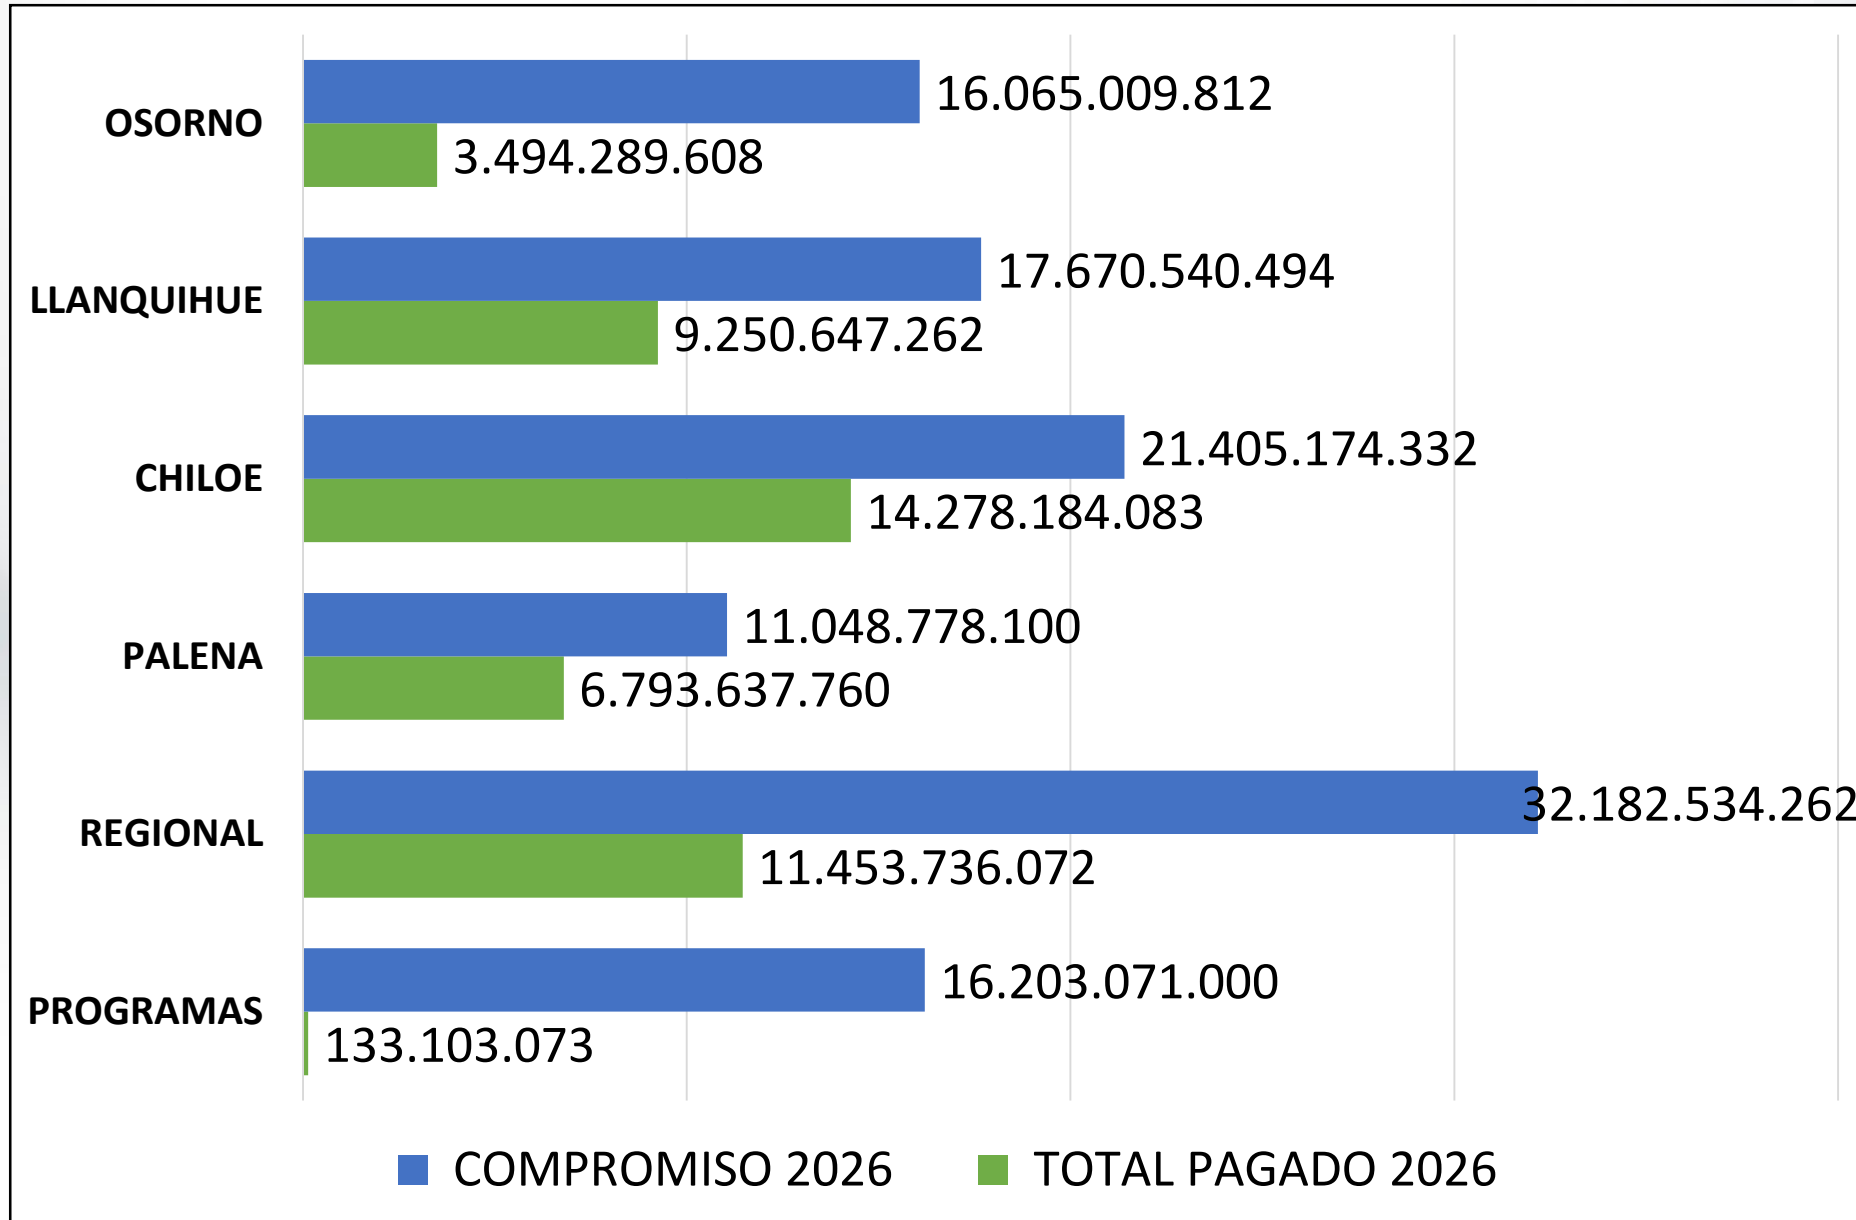

% Distribución por Provincia

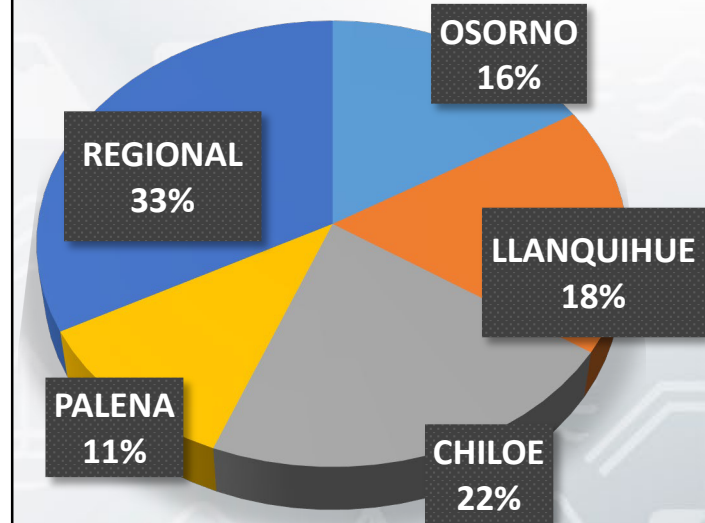

Resumen Ejecución por Provincia

PROVINCIA	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	21,75%	12.570.720.204
LLANQUIHUE	52,35%	8.419.893.232
CHILOE	66,70%	7.126.990.249
PALENA	61,49%	4.255.140.340
REGIONAL	35,59%	20.728.798.190
PPTO TERRITORIAL		53.101.542.215
PROGRAMAS	0,82%	16.069.967.927
TOTAL	39,63%	69.171.510.142

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROVINCIA



Detalle Provincia de Osorno

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL			FNDR 2026				
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	26	55.210.309.235	54%	28.584.693.652	8.112.806.579	50%	952.168.765	11,74%	7.160.637.814
PTO. OCTAY	5	3.288.180.000	3%	266.506.973	888.755.107	6%	284.534.513	32,01%	604.220.594
PURRANQUE	6	6.592.068.000	6%	2.372.200.594	1.825.842.162	11%	800.676.460	43,85%	1.025.165.702
PUYEHUE	3	8.923.043.000	9%	623.540.695	153.867.605	1%	0	0,00%	153.867.605
RIO NEGRO	8	7.277.724.912	7%	3.649.719.245	1.810.795.942	11%	263.579.942	14,56%	1.547.216.000
SAN JUAN DE LA COSTA	6	9.025.036.482	9%	2.552.398.902	1.451.000.000	9%	388.413.129	26,77%	1.062.586.871
SAN PABLO	6	2.421.512.750	2%	52.851.234	746.470.716	5%	385.113.750	51,59%	361.356.966
PROV. OSORNO	4	10.453.325.201	10%	5.362.729.887	1.075.471.701	7%	419.803.049	39,03%	655.668.652
TOTAL	64	103.191.199.580	100%	43.464.641.182	16.065.009.812	100%	3.494.289.608	21,75%	12.570.720.204

Detalle Provincia de Llanquihue

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
		COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PUERTO MONTT	21	43.801.090.984	31%	25.250.067.910	3.027.713.014	17%	1.073.672.418	35%	1.954.040.596
CALBUCO	7	24.310.479.089	17%	15.323.922.326	2.113.393.000	12%	931.426.947	44%	1.181.966.053
COCHAMO	11	12.190.572.418	9%	433.252.857	1.408.723.740	8%	563.006.273	40%	845.717.467
FRESIA	5	6.760.803.303	5%	1.396.135.315	755.811.185	4%	215.052.982	28%	540.758.203
FRUTILLAR	9	7.900.115.598	6%	1.018.490.915	3.872.511.584	22%	2.751.110.217	71%	1.121.401.367
LLANQUIHUE	2	778.151.000	1%	201.612.460	576.538.540	3%	381.387.011	66%	195.151.529
LOS MUERMOS	3	4.042.643.858	3%	556.757.937	363.799.300	2%	263.799.300	73%	100.000.000
MAULLIN	10	7.031.091.681	5%	6.248.174	1.357.405.476	8%	492.821.723	36%	864.583.753
PUERTO VARAS	11	14.807.332.009	10%	6.296.286.982	2.220.795.662	13%	1.678.778.531	76%	542.017.131
PROV.LLANQUIHUE	7	21.783.472.508	15%	10.097.399.684	1.973.848.993	11%	899.591.860	46%	1.074.257.133
TOTAL	86	143.405.752.448	100%	60.580.174.560	17.670.540.494	100%	9.250.647.262	52%	8.419.893.232

Detalle Provincia de Chiloé

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
ANCUD	11	10.228.779.500	8%	4.117.579.407	2.015.665.456	9%	972.205.612	48%	1.043.459.844
CASTRO	6	21.314.145.000	18%	7.387.331.510	6.039.398.235	28%	5.823.907.201	96%	215.491.034
CHONCHI	11	15.088.930.367	12%	3.186.877.673	2.623.908.074	12%	1.853.196.082	71%	770.711.992
CURACO DE VELEZ	6	2.429.902.412	2%	438.653.115	939.463.301	4%	98.070.571	10%	841.392.730
DALCAHUE	10	11.466.234.060	9%	1.451.921.643	1.391.424.169	7%	571.423.904	41%	820.000.265
PUQUELDON	5	7.630.270.351	6%	3.471.097.721	1.779.899.127	8%	1.216.165.671	68%	563.733.456
QUEILEN	1	3.073.922.000	3%	1.045.300.291	50.000.000	0%	0	0%	50.000.000
QUELLON	5	2.292.531.146	2%	158.846.000	558.634.413	3%	0	0%	558.634.413
QUEMCHI	3	3.330.105.789	3%	1.485.286.866	766.921.134	4%	0	0%	766.921.134
QUINCHAO	5	8.408.152.000	7%	2.647.462.420	1.570.756.573	7%	787.930.073	50%	782.826.500
PROV. CHILOE	6	36.285.189.266	30%	15.305.116.625	3.669.103.850	17%	2.955.284.969	81%	713.818.881
TOTAL	69	121.548.161.891	100%	40.695.473.271	21.405.174.332	100%	14.278.184.083	67%	7.126.990.249

Detalle Provincia de Palena

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
CHAITEN	3	10.810.929.000	8%	25.800.000	217.200.000	2%	0	0%	217.200.000
FUTALEUFU	6	2.738.764.817	2%	220.257.047	707.112.825	6%	530.603.535	75%	176.509.290
HUALAIHUE	8	4.880.080.000	4%	1.429.620.291	1.106.288.386	10%	378.650.739	34%	727.637.647
PALENA	5	6.838.770.000	5%	1.415.196.686	457.738.374	4%	4.200.000	1%	453.538.374
PROV. PALENA	5	102.648.720.000	80%	27.247.619.428	8.560.438.515	77%	5.880.183.486	69%	2.680.255.029
TOTAL	27	127.917.263.817	100%	30.338.493.452	11.048.778.100	100%	6.793.637.760	61%	4.255.140.340

Eficiencia por Provisión

Al 31 Mayo

FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2026 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2026 - PROGRAMA 02			
		MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2026	PAGOS 2026	% EJECUCION	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	70.840.920.000	60.021.398.720	52,39%	10.819.521.280	60.021.398.720	24.854.387.801	41,41%	35.167.010.919
FATP	FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL	21.235.317.000	21.749.482.011	18,98%	-514.165.011	21.749.482.011	6.648.590.434	30,57%	15.100.891.577
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	7.836.097.059	6,84%	-7.836.097.059	7.836.097.059	5.413.870.828	69,09%	2.422.226.231
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	1.485.904.946	1,30%	-1.485.904.946	1.485.904.946	1.414.036.351	95,16%	71.868.595
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	8.000.000.000	6,98%	0	8.000.000.000	6.748.352.446	84,35%	1.251.647.554
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	422.138.273	0,37%	-422.138.273	422.138.273	175.755.802	41,63%	246.382.471
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	14.498.871.000	14.340.371.000	12,52%	158.500.000	14.340.371.000	133.103.073	0,93%	14.207.267.927
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	136.655.079	0,12%	-136.655.079	136.655.079	0	0,00%	136.655.079
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	385.947.977	0,34%	-385.947.977	385.947.977	0	0,00%	385.947.977
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	196.112.935	0,17%	-196.112.935	196.112.935	15.501.123	7,90%	180.611.812
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	1.000.000	0,00%	-1.000.000	1.000.000	0	0,00%	1.000.000
TOTAL	TOTAL	114.575.108.000	114.575.108.000	100%	0	114.575.108.000	45.403.597.858	40%	69.171.510.142

Eficiencia por Subtítulo

Al 31 Mayo

PROGRAMA 02 - FNDR 2026

SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
22 Estudios e investigaciones	2.234.188.250	392.207.500	469.292.000	469.292.000	0,41%	15.782.250	3,36%	453.509.750
24 Transferencias Corrientes	23.650.202.440	2.026.022.000	17.513.287.000	17.513.287.000	15,29%	3.139.052.903	17,92%	14.374.234.097
26 Otros Gastos Corrientes	128.351.000	0	128.351.000	128.351.000	0,11%	120.399.710	93,81%	7.951.290
29 Activos no Financieros	26.237.415.347	5.529.299.633	11.356.612.000	11.356.612.000	9,91%	4.485.722.925	39,50%	6.870.889.075
31 Iniciativas de Inversión	502.188.800.139	170.435.508.081	53.368.432.000	53.368.432.000	46,58%	27.711.184.551	51,92%	25.657.247.449
33 Transferencias de Capital	69.834.320.838	7.760.205.405	31.739.134.000	31.739.134.000	27,70%	9.931.455.519	31,29%	21.807.678.481
	624.273.278.014	186.143.242.619	114.575.108.000	114.575.108.000	100%	45.403.597.858	40%	69.171.510.142

Eficiencia por Sector

Al 31 Mayo



SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
	COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	192.569.604.761	30,85%	46.612.552.431	23.284.048.244	20%	8.543.389.318	36,69%	14.740.658.926
SALUD	122.155.155.637	19,57%	38.867.194.368	17.304.801.621	15%	8.951.814.797	51,73%	8.352.986.824
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	103.124.069.583	16,52%	44.364.850.249	14.710.203.495	13%	7.218.198.632	49,07%	7.492.004.863
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	34.939.961.380	5,60%	21.648.131.762	994.830.823	1%	501.675.823	50,43%	493.155.000
RECURSOS HIDRICOS	24.259.272.938	3,89%	6.488.019.994	2.766.357.925	2%	939.669.598	33,97%	1.826.688.327
MULTISECTORIAL	51.740.328.263	8,29%	5.842.343.514	30.281.000.905	26%	7.922.190.887	26,16%	22.358.810.018
SEGURIDAD PUBLICA	21.298.177.649	3,41%	7.640.562.234	6.423.742.344	6%	4.545.999.710	70,77%	1.877.742.634
DEPORTES	31.244.826.379	5,00%	7.627.485.640	5.464.341.108	5%	3.120.633.760	57,11%	2.343.707.348
TURISMO Y COMERCIO	4.083.878.000	0,65%	1.681.338.819	1.647.621.000	1%	0	0,00%	1.647.621.000
ENERGIA	9.059.156.000	1,45%	125.778.069	5.115.927.115	4%	3.526.922.260	68,94%	1.589.004.855
PESCA	4.800.000.000	0,77%	604.099.000	1.512.300.000	1%	133.103.073	8,80%	1.379.196.927
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	15.824.604.546	2,53%	1.484.547.941	2.905.036.420	3%	0	0,00%	2.905.036.420
AGRICULTURA	5.869.551.878	0,94%	3.156.338.598	2.158.897.000	2%	0	0,00%	2.158.897.000
JUSTICIA	3.304.691.000	0,53%	0	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000
TOTAL	624.273.278.014	100%	186.143.242.619	114.575.108.000	100%	45.403.597.858	40%	69.171.510.142

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE OSORNO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/TERMINADOS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.880.905.650	7.880.905.650	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	22.210.242.780	5.657.190.512	0	5.156.380.804	5.156.380.804	11.396.671.464	RS	LIQUIDADO/PARA ADJUDICAR
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	699.055.000	47.479.757	0	50.000.000	50.000.000	601.575.243	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	112.067.112	15.501.123	64.707.959	49.206.836	17.028.929	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	329.270.698	0	79.000.000	79.000.000	102.979.302	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	930.411.000	502.435.848	420.658.016	427.975.152	7.317.136	0	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	5.000.000	5.000.000	3.270.092.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	0	501.181.920	501.181.920	143.483.080	RS*	LICITACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	304.640.000	0	0	304.640.000	304.640.000	0	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	1.012.364.034	0	114.676.966	114.676.966	0	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40039803	CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA DE BOMBEROS CANCURA, OSORNO	593.692.000	0	207.317.680	401.132.105	193.814.425	192.559.895	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.429.805.260	1.388.058.496	41.746.764	41.746.764	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.421.679.579	1.421.679.579	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	704.555.415	704.555.415	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	593.199.190	593.199.190	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	359.879.295	359.879.295	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	688.311.832	688.311.832	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	331.349.517	331.349.517	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.548.519.676	2.548.519.676	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.457.537.952	4.457.537.952	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	549.889.089	549.889.089	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042947	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE CHILLÁN , ENTRE AV. REPÚBLICA Y C.TEMUCO,OSORNO	1.456.900.000	0	234.090.019	469.512.019	235.422.000	987.387.981	RS	EJECUCION
TOTAL							52.912.425.235	28.584.693.652	919.313.602	7.615.953.689	6.696.640.087	16.711.777.894		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	429.057.000	0	0	100.000.000	100.000.000	329.057.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40059081	CONSERVACION FERIA PEDRO AGUIRRE CERDA OSORNO	507.089.000	0	0	321.987.890	321.987.890	185.101.110	RS*	ADJUDICACION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40062270	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIÓN JUAN DE DIOS GUAJARDO, OSORNO	204.510.000	0	32.855.163	50.000.000	17.144.837	154.510.000	RS*	ADJUDICACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40054690	REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA PAMPA SHILLING, OSORNO	43.865.000	0	0	23.865.000	23.865.000	20.000.000	RS	ADJUDICACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059784	REPOSICION CALLE PARALELA HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FRANCKE OSORNO	1.113.363.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.112.363.000	RS	LICITACION
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							2.297.884.000	0	32.855.163	496.852.890	463.997.727	1.801.031.110		
TOTAL COMUNA DE OSORNO							55.210.309.235	28.584.693.652	952.168.765	8.112.806.579	7.160.637.814	18.512.809.004		
						COMUNA DE PUERTO OCTAY								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.158.223.000	21.934.080	0	300.000.000	300.000.000	836.288.920	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40051437	CONSERVACION DE 16 CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTORES RURALES, COMUNA DE PUERTO OCTAY	570.975.000	244.572.893	284.534.513	326.402.107	41.867.594	0	RS*	EJECUCION
TOTAL							1.729.198.000	266.506.973	284.534.513	626.402.107	341.867.594	836.288.920		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041628	ADQUISICION AMBULANCIA EMERGENCIA BASICA CECOSF CASCADAS, COMUNA PUERTO OCTAY	98.353.000	0	0	98.353.000	98.353.000	0	RS*	LICITACION DESIERTA
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1.197.961.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.147.961.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40075708	MEJORAMIENTO MULTICACHA TECHADA ESCUELA ALBERTO HURTADO COMUNDA DE PUERTO OCTAY	262.668.000	0	0	114.000.000	114.000.000	148.668.000	RS*	LICITACION
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							1.558.982.000	0	0	262.353.000	262.353.000	1.296.629.000		
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY							3.288.180.000	266.506.973	284.534.513	888.755.107	604.220.594	2.132.917.920		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.593.749.000	865.213.301	196.772.702	250.000.000	53.227.298	478.535.699	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.176.646.000	1.056.428.269	0	80.000.000	80.000.000	40.217.731	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.232.931.000	0	5.692.746	618.544.000	612.851.254	614.387.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.170.070.000	450.559.024	598.211.012	710.435.380	112.224.368	9.075.596	RS	EJECUCION
TOTAL							5.173.396.000	2.372.200.594	800.676.460	1.658.979.380	858.302.920	1.142.216.026		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40047721	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS ANGELES, PURRANQUE	46.499.000	0	0	15.000.000	15.000.000	24.625.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40033259	REPOSICION CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PURRANQUE	1.372.173.000	0	0	151.862.782	151.862.782	1.220.310.218	RS	LICITACION
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							1.418.672.000	0	0	166.862.782	166.862.782	1.244.935.218		
TOTAL COMUNA DE PURRANQUE							6.592.068.000	2.372.200.594	800.676.460	1.825.842.162	1.025.165.702	2.387.151.244		
						COMUNA DE PUYEHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	585.020.395	0	48.867.605	48.867.605	0	RS*	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	38.520.300	0	55.000.000	55.000.000	102.851.700	RS	EJECUCION
TOTAL							830.260.000	623.540.695	0	103.867.605	103.867.605	102.851.700		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.092.783.000	0	0	50.000.000	50.000.000	8.042.783.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							8.092.783.000	0	0	50.000.000	50.000.000	8.042.783.000		
TOTAL COMUNA DE PUYEHUE							8.923.043.000	623.540.695	0	153.867.605	153.867.605	8.145.634.700		
						COMUNA DE RIO NEGRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.147.632.000	1.054.667.638	25.409.121	54.251.065	28.841.944	38.713.297	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.003.769.912	999.242.248	1.220.604	4.527.664	3.307.060	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.299.153.000	1.054.987.961	0	240.292.625	240.292.625	3.872.414	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	21.312.000	0	519.689.986	519.689.986	562.842.014	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032117	CONSERVACION CAMINOS VECINALES DE ÑANCUÁN CHANCHAN, SAN FLORENTINO Y QUISQUELELFUN, RÍO NEGRO	1.065.206.000	519.509.398	236.950.217	545.696.602	308.746.385	0	RS*	EJECUCION
TOTAL							5.619.604.912	3.649.719.245	263.579.942	1.364.457.942	1.100.878.000	605.427.725		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052927	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR MILLACURA, COMUNA DE RIO NEGRO	505.990.000	0	0	50.000.000	50.000.000	455.990.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	30097977	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA RIO NEGRO	805.792.000	0	0	50.000.000	50.000.000	755.792.000	RS	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073026	REPOSICION DOS CAMIONES TOLVA PARA LA COMUNA DE RÍO NEGRO	346.338.000	0	0	346.338.000	346.338.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.658.120.000	0	0	446.338.000	446.338.000	1.211.782.000		
TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO							7.277.724.912	3.649.719.245	263.579.942	1.810.795.942	1.547.216.000	1.817.209.725		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.908.118.000	1.358.927.420	388.413.129	1.200.000.000	811.586.871	3.349.190.580	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.193.471.482	1.193.471.482	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	0	0	511.498.000	RS	SIN RATE DESDE 2024
TOTAL							7.613.087.482	2.552.398.902	388.413.129	1.200.000.000	811.586.871	3.860.688.580		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40066529	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD SAN JUAN DE LA COSTA	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0	RS*	LICITACION DESIERTA
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071828	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUIZAS-CHEUQUEMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA	1.002.049.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.001.049.000	RS*	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40062700	ADQUISICION VEHÍCULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	159.900.000	0	0	0	0	159.900.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.411.949.000	0	0	251.000.000	251.000.000	1.160.949.000		
TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							9.025.036.482	2.552.398.902	388.413.129	1.451.000.000	1.062.586.871	5.021.637.580		
						COMUNA DE SAN PABLO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.131.350.000	21.991.200	0	99.000.000	99.000.000	1.010.358.800	RS	ADJUDICACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	30.860.034	0	1.026.966	1.026.966	20.000.000	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	126.140.000	0	126.140.000	126.140.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	258.973.750	0	258.973.750	258.973.750	0	0	RS*	TERMINADO
TOTAL							1.568.350.750	52.851.234	385.113.750	485.140.716	100.026.966	1.030.358.800		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40069510	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES VARIOS DEPARTAMENTOS, SAN PABLO	160.330.000	0	0	160.330.000	160.330.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40070438	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES PUTABLA, QUILEN Y CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO	406.477.000	0	0	1.000.000	1.000.000	405.477.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40074170	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO, SECTOR MAILE, COMUNA DE SAN PABLO	286.355.000	0	0	100.000.000	100.000.000	186.355.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							853.162.000	0	0	261.330.000	261.330.000	591.832.000		
TOTAL COMUNA DE SAN PABLO							2.421.512.750	52.851.234	385.113.750	746.470.716	361.356.966	1.622.190.800		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	250.420.549	905.089.201	654.668.652	2.000.500.799	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	4.121.575.186	0	1.000.000	1.000.000	2.014.622.814	CF	LIQUIDACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	283.080.799	283.080.799	0	0	0	0	RS	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.082.712.402	913.329.902	169.382.500	169.382.500	0	0	RS*	TERMINADO
TOTAL							10.453.325.201	5.362.729.887	419.803.049	1.075.471.701	655.668.652	4.015.123.613		
TOTAL PROVINCIALES							10.453.325.201	5.362.729.887	419.803.049	1.075.471.701	655.668.652	4.015.123.613		
TOTAL PROVINCIA DE OSORNO							103.191.199.580	43.464.641.182	3.494.289.608	16.065.009.812	12.570.720.204	43.654.674.586		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.968.439.987	8.964.989.987	3.450.000	3.450.000	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	4.060.161.100	3.978.756.124	0	81.404.976	81.404.976	0	RS*	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	791.422.000	15.250.000	0	50.000.000	50.000.000	726.172.000	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	676.991.000	15.250.000	0	50.000.000	50.000.000	611.741.000	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	840.037.624	0	0	391.165.073	391.165.073	448.872.551	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.362.125.000	883.195.617	0	478.929.383	478.929.383	0	RS*	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.779.570.158	8.472.385.394	24.767.031	108.397.187	83.630.156	198.787.577	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.484.881.860	1.624.763.093	699.750.129	699.750.129	0	160.368.638	RE	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	262.200	0	86.143.945	86.143.945	2.705.391.855	RS	EXPROPIACIONES
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	1.000.117.739	0	0	50.000.000	50.000.000	950.117.739	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.309.135.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.259.135.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	980.175.000	0	0	50.000.000	50.000.000	930.175.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.934.861.516	1.293.352.495	345.705.258	391.533.321	45.828.063	249.975.700	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	30.000.000	30.000.000	216.329.000	RS	CONVENIO
TOTAL							36.226.044.984	25.248.204.910	1.073.672.418	2.520.774.014	1.447.101.596	8.457.066.060		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30034826	REPOSICION POSTA ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.396.009.000	1.863.000	0	50.000.000	50.000.000	1.344.146.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	1.263.261.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.213.261.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40067945	MEJORAMIENTO CALLE CALETERA AV. PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	898.600.000	0	0	50.000.000	50.000.000	848.600.000	RS	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129873	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL PUERTO MONTT	225.461.000	0	0	25.000.000	25.000.000	200.461.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071848	MEJORAMIENTO CALLE GÉNESIS E INMACULADA, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.530.350.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.529.350.000	RS	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40070609	ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE MIXTO SEGURIDAD PÚBLICA, COMUNA DE PUERTO MONTT	330.939.000	0	0	330.939.000	330.939.000	0	RS*	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40072266	CONSERVACION CENTRO SERVICIOS SALUD COMUNAL	1.602.366.000	0	0	0	0	1.602.366.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40072645	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS SECTOR VICUÑA MACKENNA POBLACION MIRASOL, PUERTO MONTT	328.060.000	0	0	0	0	328.060.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							7.575.046.000	1.863.000	0	506.939.000	506.939.000	7.066.244.000		
TOTAL COMUNA DE P. MONTT							43.801.090.984	25.250.067.910	1.073.672.418	3.027.713.014	1.954.040.596	15.523.310.060		
						COMUNA DE CALBUCO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO, CALBUCO	16.168.723.293	14.193.669.885	70.843.711	1.001.809.764	930.966.053	973.243.644	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.666.209.546	1.036.752.441	0	1.000.000	1.000.000	628.457.105	RS	LIQUIDACION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	109.282.250	93.500.000	15.782.250	15.782.250	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.359.482.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.309.482.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	844.800.986	844.800.986	0	139.583.014	RS*	EJECUCION
TOTAL							20.288.081.089	15.323.922.326	931.426.947	1.913.393.000	981.966.053	3.050.765.763		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40055239	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES VILLARROEL Y C. CONDELL, CALBUCO	2.800.863.000	0	0	100.000.000	100.000.000	2.700.863.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40055163	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA PULUQUI	1.221.535.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.121.535.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							4.022.398.000	0	0	200.000.000	200.000.000	3.822.398.000		
TOTAL COMUNA DE CALBUCO							24.310.479.089	15.323.922.326	931.426.947	2.113.393.000	1.181.966.053	6.873.163.763		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE COCHAMO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PEDZE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	15.000.000	15.000.000	46.157.800	RS	LIQUIDADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	0	0	10.000.000	10.000.000	112.370.000	RS	LIQUIDADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	480.875.535	40.561.764	180.858.891	300.000.000	119.141.109	140.313.771	RS*	EJECUCION
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	369.691.642	449.691.642	80.000.000	2.397.900.358	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	288.865.700	277.916.143	10.949.557	10.949.557	0	0	RS*	TERMINADO
26	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	1.506.183	0	1.506.183	1.506.183	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.556.268.000	29.558.750	0	100.000.000	100.000.000	1.426.709.250	RS	EJECUCION
TOTAL							5.426.907.418	416.308.857	563.006.273	887.147.382	324.141.109	4.123.451.179		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.569.748.000	16.944.000	0	50.000.000	50.000.000	1.502.804.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ	1.053.383.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.003.383.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40070102	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL POCOIHUEN, COCHAMO	3.769.266.000	0	0	50.308.358	50.308.358	3.718.957.642	RS	LICITACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	332.627.000	0	0	332.627.000	332.627.000	0	RS*	EJECUCION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	38.641.000	0	0	38.641.000	38.641.000	0	RS*	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							6.763.665.000	16.944.000	0	521.576.358	521.576.358	6.225.144.642		
TOTAL COMUNA DE COCHAMO							12.190.572.418	433.252.857	563.006.273	1.408.723.740	845.717.467	10.348.595.821		
						COMUNA DE FRESIA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	131.524.386	131.524.386	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	66.023.294	66.023.294	0	RS	REEVALUACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.779.772.238	564.573.930	215.052.982	492.166.305	277.113.323	723.032.003	RS	EJECUCION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	65.097.200	65.097.200	585.874.800	RS*	LICITACION
TOTAL							3.459.853.303	1.396.135.315	215.052.982	754.811.185	539.758.203	1.308.906.803		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30435722	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, FRESIA	3.300.950.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.299.950.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							3.300.950.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.299.950.000		
TOTAL COMUNA DE FRESIA							6.760.803.303	1.396.135.315	215.052.982	755.811.185	540.758.203	4.608.856.803		
						COMUNA DE FRUTILLAR								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	362.566.601	0	87.005.399	87.005.399	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	234.000.000	0	166.000.000	166.000.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	1.222.519.000	154.611.365	476.079.523	525.313.652	49.234.129	542.593.983	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025466	MEJORAMIENTO AVENIDA ARTURO ALESSANDRI NORTE, COMUNA DE FRUTILLAR	4.033.866.000	1.521.177	2.275.030.694	2.275.030.694	0	1.757.314.129	RS	EJECUCION
TOTAL							6.430.914.598	1.018.490.915	2.751.110.217	3.112.515.571	361.405.354	2.299.908.112		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071230	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CASMA, COMUNA DE FRUTILLAR	228.318.000	0	0	70.000.000	70.000.000	158.318.000	RS	LICITACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	485.755.000	0	0	485.755.000	485.755.000	0	RS	LICITACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	103.582.000	0	0	103.582.000	103.582.000	0	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40069991	CONSTRUCCION MÓDULOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED DE SALUD COMUNAL DE FRUTILLAR	336.469.000	0	0	50.000.000	50.000.000	286.469.000	RS	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40066152	CONSTRUCCION ESPACIO DE ENTRENAMIENTO PARA LAS ARTES MARCIALES, COMUNA DE FRUTILLAR.	315.077.000	0	0	50.659.013	50.659.013	264.417.987	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.469.201.000	0	0	759.996.013	759.996.013	709.204.987		
TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR							7.900.115.598	1.018.490.915	2.751.110.217	3.872.511.584	1.121.401.367	3.009.113.099		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE LLANQUIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	436.621.000	201.612.460	39.857.011	235.008.540	195.151.529	0	RS	EJECUCION
TOTAL							436.621.000	201.612.460	39.857.011	235.008.540	195.151.529	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054960	ADQUISICION EQUIPO MAMOGRAFO HOSPITAL DE LLANQUIHUE	341.530.000	0	341.530.000	341.530.000	0	0	RS*	TERMINADO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							341.530.000	0	341.530.000	341.530.000	0	0		
TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE							778.151.000	201.612.460	381.387.011	576.538.540	195.151.529	0		
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.546.425.858	556.757.937	263.799.300	263.799.300	0	725.868.621	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.274.261.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40049194	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA II, COMUNA DE LOS MUERMOS	1.171.957.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.121.957.000	RS	CONVENIO
TOTAL							4.042.643.858	556.757.937	263.799.300	363.799.300	100.000.000	3.122.086.621		
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS							4.042.643.858	556.757.937	263.799.300	363.799.300	100.000.000	3.122.086.621		
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	10.000.000	10.000.000	127.618.000	RS	REEVALUACION-CON RATE OT
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	62.456.000	0	0	15.000.000	15.000.000	47.456.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	106.879.668	106.879.668	1.161.917.013	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	398.811.723	597.674.000	198.862.277	332.000.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.169.469.000	3.034.999	0	189.874.001	189.874.001	976.560.000	RS	EJECUCION
TOTAL							3.568.013.681	3.034.999	398.811.723	919.427.669	520.615.946	2.645.551.013		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30134574	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	1.167.917.000	3.213.175	0	50.000.000	50.000.000	1.114.703.825	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	366.003.000	0	0	100.516.808	100.516.808	265.486.192	RS*	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	286.015.000	0	94.010.000	182.335.000	88.325.000	103.680.000	RS*	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	964.982.000	0	0	10.000.000	10.000.000	954.982.000	RS	ADJUDICACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40057978	REPOSICION 3RA. COMISARIA MAULLIN	378.161.000	0	0	25.000.000	25.000.000	353.161.000	RS	CONVENIO
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073466	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE MAULLIN	300.000.000	0	0	70.125.999	70.125.999	229.874.001	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.463.078.000	3.213.175	94.010.000	437.977.807	343.967.807	3.021.887.018		
TOTAL COMUNA DE MAULLIN							7.031.091.681	6.248.174	492.821.723	1.357.405.476	864.583.753	5.667.438.031		
						COMUNA DE PUERTO VARAS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.391.441.000	1.076.381.867	1.115.016.119	1.127.786.286	12.770.167	3.187.272.847	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.192.357.990	2.133.693.520	45.070.620	45.070.620	0	13.593.850	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	160.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.347.083.550	1.080.697.996	248.353.554	248.353.554	0	18.032.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	927.995.201	0	136.655.079	136.655.079	0	RS	PARALIZADA
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	125.778.069	175.755.802	422.138.273	246.382.471	322.177.658	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	845.787.189	791.204.753	54.582.436	54.582.436	0	0	RS	TERMINADO
TOTAL							11.911.414.009	6.295.751.406	1.678.778.531	2.074.586.248	395.807.717	3.541.076.355		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	535.576	0	4.000.000	4.000.000	282.210.424	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.362.466.000	0	0	80.000.000	80.000.000	1.282.466.000	RS	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40064856	CONSERVACION VÍAS URBANAS DE PUERTO VARAS	920.256.000	0	0	1.000.000	1.000.000	919.256.000	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073778	MEJORAMIENTO MERCADO PIO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS	326.450.000	0	0	61.209.414	61.209.414	265.240.586	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.895.918.000	535.576	0	146.209.414	146.209.414	2.749.173.010		
TOTAL COMUNA DE P.VARAS							14.807.332.009	6.296.286.982	1.678.778.531	2.220.795.662	542.017.131	6.290.249.365		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.898.127.708	3.898.127.708	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CAREMAPU, MAULLIN	6.278.871.000	191.791.026	0	50.000.000	50.000.000	6.037.079.974	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.184.812.000	4.028.330.807	66.824.500	156.481.193	89.656.693	0	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	119.176.269	0	30.000.000	30.000.000	113.084.731	RS	REEVALUACION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	1.859.973.874	0	50.000.000	50.000.000	298.744.126	RS*	EJECUCION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	145.399.560	900.000.000	754.600.440	0	RS***	EJECUCION
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							17.782.789.708	10.097.399.684	212.224.060	1.236.481.193	1.024.257.133	6.448.908.831		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	658.308.000	0	658.308.000	658.308.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	29.059.800	0	29.059.800	29.059.800	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40067969	CONSTRUCCION ETAPA 3, RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA	3.313.315.000	0	0	50.000.000	50.000.000	3.263.315.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							4.000.682.800	0	687.367.800	737.367.800	50.000.000	3.263.315.000		
TOTAL PROVINCIALES							21.783.472.508	10.097.399.684	899.591.860	1.973.848.993	1.074.257.133	9.712.223.831		
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE							143.405.752.448	60.580.174.560	9.250.647.262	17.670.540.494	8.419.893.232	65.155.037.394		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE ANCUD								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.642.222.023	0	385.947.977	385.947.977	0	RE	REEVALUACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑIA BOMBEROS ANCUD	1.370.127.000	536.417.502	0	81.816.127	81.816.127	751.893.371	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	1.389.476.000	808.091.051	335.657.434	481.384.949	145.727.515	100.000.000	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	311.244.500	0	311.244.500	311.244.500	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.390.927.000	1.130.848.831	257.071.178	257.097.756	26.578	2.980.413	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40057328	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR CARACOLES, ANCUD	238.808.000	0	68.232.500	68.232.500	0	170.575.500	RS	EJECUCION
TOTAL							6.728.752.500	4.117.579.407	972.205.612	1.585.723.809	613.518.197	1.025.449.284		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014527	MEJORAMIENTO CALLE BAQUEDANO Y COSTANERA NORTE, COMUNA DE ANCUD	669.290.000	0	0	50.000.000	50.000.000	619.290.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30093353	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA DE SALUD RURAL SECTOR NAL, COMUNA DE ANCUD	1.459.839.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.409.839.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40045547	CONSTRUCCION CUARTEL 2A COMPAÑIA BOMBEROS ANCUD	103.460.000	0	0	50.000.000	50.000.000	53.460.000	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	566.881.000	0	0	128.902.147	128.902.147	437.978.853	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	422.079.000	0	0	101.039.500	101.039.500	321.039.500	RS*	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071987	REPOSICIÓN TALLER DE OPERACIONES.	278.478.000	0	0	50.000.000	50.000.000	228.478.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.500.027.000	0	0	429.941.647	429.941.647	3.070.085.353		
TOTAL COMUNA DE ANCUD							10.228.779.500	4.117.579.407	972.205.612	2.015.665.456	1.043.459.844	4.095.534.637		
						COMUNA DE CASTRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	844.703.000	542.161.724	83.177.856	102.541.276	19.363.420	200.000.000	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	6.845.169.786	5.227.260.103	5.227.260.103	0	3.113.014.111	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	2.394.442.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.344.442.000	RS	REEVALUACION
TOTAL							18.424.589.000	7.387.331.510	5.310.437.959	5.379.801.379	69.363.420	5.657.456.111		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	128.911.000	0	32.783.386	128.911.000	96.127.614	0	RS*	EJECUCION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	600.874.000	0	480.685.856	480.685.856	0	120.188.144	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40070257	MEJORAMIENTO PLAZA JAVIERA CARRERA CASTRO	336.417.000	0	0	50.000.000	50.000.000	286.417.000	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40043234	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL, COMUNA DE CASTRO	1.221.768.000	0	0	0	0	1.221.768.000	RS*	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40043234	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL, COMUNA DE CASTRO	601.586.000	0	0	0	0	601.586.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.889.556.000	0	513.469.242	659.596.856	146.127.614	2.229.959.144		
TOTAL COMUNA DE CASTRO							21.314.145.000	7.387.331.510	5.823.907.201	6.039.398.235	215.491.034	7.887.415.255		
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	92.764.367	61.313.682	0	23.712.000	23.712.000	7.738.685	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	3.123.618.991	883.436.509	1.076.296.920	192.860.411	587.508.089	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	1.945.000	694.003.486	694.003.486	0	3.031.775.514	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	2.394.442.000	0	71.317.505	71.317.505	0	2.323.124.495	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.240.291.000	RS	LICITACION DESIERTA
TOTAL							12.292.645.367	3.186.877.673	1.648.757.500	1.915.329.911	266.572.411	7.190.437.783		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052247	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE CHONCHI	555.683.000	0	0	50.000.000	50.000.000	444.546.400	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40010316	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA HUILLINCO, COMUNA DE CHONCHI	603.419.000	0	204.438.582	250.000.000	45.561.418	353.419.000	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040291	CONSERVACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE CHONCHI	326.471.000	0	0	98.178.163	98.178.163	228.292.837	RS*	ADJUDICACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071482	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTOR NORESTE, COMUNA DE CHONCHI	806.312.000	0	0	1.000.000	1.000.000	805.312.000	RS	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039346	REPOSICION DE 2 AMBULANCIAS BASICAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	309.400.000	0	0	309.400.000	309.400.000	0	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40066148	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR PUCATUE HUICHA, COMUNA DE CHONCHI	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.796.285.000	0	204.438.582	708.578.163	504.139.581	2.026.570.237		
TOTAL COMUNA DE CHONCHI							15.088.930.367	3.186.877.673	1.853.196.082	2.623.908.074	770.711.992	9.217.008.020		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CEFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	190.867.000	103.039.646	39.604.980	56.508.734	16.903.754	31.318.620	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	37.849.624	55.466.003	200.000.000	144.533.997	157.101.376	RS	EJECUCION
TOTAL							585.818.000	140.889.270	95.070.983	256.508.734	161.437.751	188.419.996		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	173.145.000	166.622.433	0	6.522.567	6.522.567	0	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	265.941.412	131.141.412	2.999.588	134.800.000	131.800.412	0	RS*	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063532	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES, CURACO DE VELEZ	498.111.000	0	0	126.632.000	126.632.000	371.479.000	RS*	ADJUDICACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40051701	REPOSICION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA BOMBEROS DE HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ	115.920.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100.920.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056255	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	790.967.000	0	0	400.000.000	400.000.000	390.967.000	RS*	ADJUDICACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.844.084.412	297.763.845	2.999.588	682.954.567	679.954.979	863.366.000		
TOTAL COMUNA DE C.VELEZ							2.429.902.412	438.653.115	98.070.571	939.463.301	841.392.730	1.051.785.996		
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.414.744.060	1.209.705.869	128.794.172	205.038.191	76.244.019	0	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	8.950.000	0	50.000.000	50.000.000	2.911.083.000	RS	ADJUDICACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	16.200.000	24.300.000	24.300.000	0	1.384.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	217.065.774	418.329.732	600.000.000	181.670.268	332.417.226	RS*	EJECUCION
TOTAL							5.576.144.060	1.451.921.643	571.423.904	879.338.191	307.914.287	3.244.884.226		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40061640	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CALEN, COMUNA DE DALCAHUE	1.284.197.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.234.197.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40054303	AMPLIACION REDES DE A. POTABLE, ALCANT Y CONSTR. MURO DE CONTENC. AVDA. MOCOPULLI, DALCAHUE	2.085.979.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.985.979.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	1.940.477.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.890.477.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40026493	CONSTRUCCION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE DALCAHUE	68.437.000	0	0	2.085.978	2.085.978	66.351.022	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40070836	REPOSICION BUS MUNICIPAL, COMUNA DE DALCAHUE	310.000.000	0	0	310.000.000	310.000.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40068201	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE	201.000.000	0	0	0	0	201.000.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.890.090.000	0	0	512.085.978	512.085.978	5.378.004.022		
TOTAL COMUNA DE DALCAHUE							11.466.234.060	1.451.921.643	571.423.904	1.391.424.169	820.000.265	8.622.888.248		
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.724.474.841	17.100.000	50.000.000	32.900.000	525.161.159	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	1.574.814.000	8.800.655	0	300.000.000	300.000.000	1.266.013.345	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	717.773.000	593.250.434	122.570.000	124.522.566	1.952.566	0	RS*	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	305.443.000	144.571.791	115.701.320	160.871.209	45.169.889	0	RS*	CONVENIO
TOTAL							5.897.666.000	3.471.097.721	255.371.320	635.393.775	380.022.455	1.791.174.504		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	599.158.390	0	599.158.390	599.158.390	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	361.635.961	0	361.635.961	361.635.961	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40013816	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON	771.810.000	0	0	183.711.001	183.711.001	588.098.999	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.732.604.351	0	960.794.351	1.144.505.352	183.711.001	588.098.999		
TOTAL COMUNA DE PUQUELDON							7.630.270.351	3.471.097.721	1.216.165.671	1.779.899.127	563.733.456	2.379.273.503		
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709	RS	REEVALUACION
TOTAL							3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709		
TOTAL COMUNA DE QUEILEN							3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE QUELLON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	4000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	5.000.000	5.000.000	1.406.317.146	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	117.081.000	0	5.000.000	5.000.000	8.009.000	RS	LIQUIDACION
TOTAL							1.616.582.146	158.846.000	0	43.410.000	43.410.000	1.414.326.146		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	363.037.000	0	0	363.037.000	363.037.000	0	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	312.912.000	0	0	152.187.413	152.187.413	160.724.587	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							675.949.000	0	0	515.224.413	515.224.413	160.724.587		
TOTAL COMUNA DE QUELLON							2.292.531.146	158.846.000	0	558.634.413	558.634.413	1.575.050.733		
						COMUNA DE QUEMCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.654.842.789	1.485.286.866	0	166.921.134	166.921.134	2.634.789	RS	EJECUCION
TOTAL							1.654.842.789	1.485.286.866	0	166.921.134	166.921.134	2.634.789		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063487	CONSERVACION DE CAMINOS ISLAS TAUCULON, AULIN Y BUTACHAUQUES, COMUNA DE QUEMCHI.	974.355.000	0	0	500.000.000	500.000.000	474.355.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40005528	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	700.908.000	0	0	100.000.000	100.000.000	600.908.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.675.263.000	0	0	600.000.000	600.000.000	1.075.263.000		
TOTAL COMUNA DE QUEMCHI							3.330.105.789	1.485.286.866	0	766.921.134	766.921.134	1.077.897.789		
						COMUNA DE QUINCHAO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.310.834.000	1.231.903.855	178.500	30.000.000	29.821.500	48.930.145	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.822.540.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.622.540.000	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.480.736.000	1.415.558.565	787.751.573	790.756.573	3.005.000	274.420.862	RS	EJECUCION
TOTAL							5.614.110.000	2.647.462.420	787.930.073	1.020.756.573	232.826.500	1.945.891.007		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	391.291.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40067325	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO	2.352.751.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.852.751.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.794.042.000	0	0	550.000.000	550.000.000	2.244.042.000		
TOTAL COMUNA DE QUINCHAO							8.408.152.000	2.647.462.420	787.930.073	1.570.756.573	782.826.500	4.189.933.007		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	3.477.985.000	527.771.961	0	200.000.000	200.000.000	2.750.213.039	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	4.955.228.139	4.955.228.139	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.707.826.752	0	100.000.000	100.000.000	3.294.498.248	RE	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	17.878.003.000	6.411.745.496	5.498.521	200.000.000	194.501.479	11.266.257.504	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.091.573.127	559.298.027	532.275.100	532.275.100	0	0	RS*	TERMINADO
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40062497	DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO INFRAEST. PORTUARIA 04 SECT. REZAGO, QUEMCHI-QUINCHAO Y QUELLON	190.995.000	143.246.250	47.748.750	47.748.750	0	0	RS	TERMINADO
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.000.000	0	2.369.762.598	2.449.000.000	79.237.402	0	RS***	EJECUCION
24	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA B) GLOSA 03 GESTIÓN HÍDRICA (Subtítulo 24.03.014)	140.080.000	0	0	140.080.000	140.080.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							36.285.189.266	15.305.116.625	2.955.284.969	3.669.103.850	713.818.881	17.310.968.791		
TOTAL PROVINCIALES							36.285.189.266	15.305.116.625	2.955.284.969	3.669.103.850	713.818.881	17.310.968.791		
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE							121.548.161.891	40.695.473.271	14.278.184.083	21.405.174.332	7.126.990.249	59.386.377.688		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CHAITEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	4.255.389.000	25.800.000	0	200.000.000	200.000.000	4.029.589.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058788	REPOSICION AMBULANCIAS COMUNA DE CHAITEN	172.000.000	0	0	17.200.000	17.200.000	0	RS*	LICITACION
TOTAL							4.427.389.000	25.800.000	0	217.200.000	217.200.000	4.029.589.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042493	MEJORAMIENTO DIVERASS CALLES SECTOR SUR, CHAITEN	6.383.540.000	0	0	0	0	6.383.540.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							6.383.540.000	0	0	0	0	6.383.540.000		
TOTAL COMUNA DE CHAITEN							10.810.929.000	25.800.000	0	217.200.000	217.200.000	10.413.129.000		
						COMUNA DE FUTALEUFU								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	75.660.000	0	50.398.000	50.398.000	0	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.415.585.000	44.597.047	0	100.000.000	100.000.000	1.270.987.953	RS	EJECUCION
TOTAL							1.659.803.000	220.257.047	0	168.558.000	168.558.000	1.270.987.953		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056911	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES COMUNA DE FUTALEUFU	722.117.000	0	411.710.008	411.710.008	0	310.406.992	RS*	EJECUCION
26	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	126.844.817	0	118.893.527	126.844.817	7.951.290	0	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073440	MEJORAMIENTO PASEO ACCESO PONIENTE, COMUNA DE FUTALEUFU	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.078.961.817	0	530.603.535	538.554.825	7.951.290	540.406.992		
TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU							2.738.764.817	220.257.047	530.603.535	707.112.825	176.509.290	1.811.394.945		
						COMUNA DE HUALAIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	88.920.096	0	165.875.904	165.875.904	0	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.966.390.000	1.324.404.045	376.150.739	588.469.982	212.319.243	53.515.973	RS	EJECUCION
TOTAL							2.221.186.000	1.413.324.141	376.150.739	754.345.886	378.195.147	53.515.973		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	30386191	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE HORNOPIREN, HUALAIHUE	81.700.000	15.600.000	0	66.100.000	66.100.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30397627	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA, COMUNA DE HUALAIHUE	1.446.756.000	696.150	2.500.000	50.000.000	47.500.000	1.396.059.850	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40053338	CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS RIO NEGRO HORNOPIREN, HUALAIHUE	115.300.000	0	0	30.000.000	30.000.000	85.300.000	RS	ADJUDICADA
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40065407	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COMUNA DE HUALAIHUE	341.685.000	0	0	170.842.500	170.842.500	170.842.500	RS*	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129886	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE HUALAIHUE	344.715.000	0	0	35.000.000	35.000.000	309.715.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40077324	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIO PUBLICO SECTOR LOS CANELOS, HORNOPIRÉN, COMUNA DE HUALAIHUÉ	328.738.000	0	0	0	0	328.738.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.658.894.000	16.296.150	2.500.000	351.942.500	349.442.500	2.290.655.350		
TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE							4.880.080.000	1.429.620.291	378.650.739	1.106.288.386	727.637.647	2.344.171.323		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PALENA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.400.871.686	0	20.563.374	20.563.374	28.313.940	RS	EJECUCION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	87.175.000	87.175.000	28.500.000	RS*	EJECUCION
TOTAL							1.579.749.000	1.415.196.686	0	107.738.374	107.738.374	56.813.940		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40072992	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACION, COLEGIO ROBERTO WHITE GESELL DE PALENA	541.587.000	0	4.200.000	100.000.000	95.800.000	441.587.000	RS	ADJUDICACION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40007928	CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA	4.529.799.000	0	0	250.000.000	250.000.000	4.279.799.000	RS	CONVENIO
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40076387	REPOSICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	187.635.000	0	0	0	0	187.635.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.259.021.000	0	4.200.000	350.000.000	345.800.000	4.909.021.000		
TOTAL COMUNA DE PALENA							6.838.770.000	1.415.196.686	4.200.000	457.738.374	453.538.374	4.965.834.940		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	16.612.042.000	4.059.795.859	699.710.924	2.417.815.781	1.718.104.857	10.134.430.360	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	34.164.961.000	9.817.932.092	4.714.159.904	4.714.159.904	0	19.632.869.004	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	50.292.204.000	13.369.891.477	0	400.000.000	400.000.000	36.522.312.523	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	1.000.000	1.000.000	28.599.000	S/R	SIN RS 2024
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	466.312.658	780.000.000	313.687.342	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							101.878.806.000	27.247.619.428	5.880.183.486	8.312.975.685	2.432.792.199	66.318.210.887		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063704	REPOSICION EQUIPOS RAYOS X OSTEOPULMONARES HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	769.914.000	0	0	247.462.830	247.462.830	358.012.623	RS*	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							769.914.000	0	0	247.462.830	247.462.830	358.012.623		
TOTAL PROVINCIALES							102.648.720.000	27.247.619.428	5.880.183.486	8.560.438.515	2.680.255.029	66.676.223.510		
TOTAL PROVINCIA DE PALENA							127.917.263.817	30.338.493.452	6.793.637.760	11.048.778.100	4.255.140.340	86.210.753.718		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						REGIONALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	12.180.626	12.180.626	401.763.374	RS*	DETENIDO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	238.315.217	337.979.497	99.664.280	337.978.503	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	208.722.500	0	11.161.500	11.161.500	0	RS*	EJECUCION
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	6.400.000.000	0	157.578.087	6.400.000.000	6.242.421.913	0	RS***	EJECUCION
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	0	RS***	
24	03-011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	Aplicación letra c) glosa 03 Residuos Sólidos Domiciliarios	372.507.000	0	0	372.507.000	372.507.000	0	RS***	
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	0	6.748.352.446	8.000.000.000	1.251.647.554	0	RS**	EJECUCION
TOTAL							16.282.293.000	208.722.500	7.144.245.750	15.333.828.623	8.189.582.873	739.741.877		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	627.486.611	521.486.615	532.193.710	10.707.095	462.961.679	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40032367	DIAGNOSTICO DE COND. NATURALES VARIOS SECTORES ZONAS DE REZAGO NORTE, REGION DE LOS LAGOS	1.512.982.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.462.982.000	RS	EJECUCION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	202.468.625	202.468.625	56.031.375	RS*	LICITACION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	238.000.000	RS*	CONVENIO
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	28.992.305	28.992.305	541.512.695	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	149.000.000	149.000.000	11.075.636.000	RS	EXPROPIACIONES
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	15.000.000	15.000.000	518.060.000	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40046973	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVA ZONA PRIMARIA EXTRAPUERTO EMPORMONTT, PUERTO MONTT	3.614.118.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.613.118.000	RS	CONVENIO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	142.300.000	0	0	142.300.000	142.300.000	0	RS*	LICITACION
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	102.567.000	0	0	102.567.000	102.567.000	0	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40055362	ANALISIS PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LOS LAGOS	323.520.000	0	0	5.000.000	5.000.000	318.520.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064760	CONSERVACION POLIDEPORTIVO ARENA PUERTO MONTT	1.803.653.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.303.653.000	S/R	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40036420	HABILITACION Centro Cardioquirúrgico para Macro Zona Sur Austral	2.494.106.000	442.023.638	738.003.707	1.029.999.999	291.996.292	1.022.082.363	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40056853	CONSTRUCCION CAMPUS SALUD, INGENIERÍA Y ARTES, ULAGOS, PUERTO MONTT	6.641.168.000	0	0	100.000.000	100.000.000	6.541.168.000	RS	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	50.000.000	50.000.000	5.434.512.000	RS	EJECUCION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40067537	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA CUATRO CUARTELES FRONTERIZOS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS	167.421.000	0	0	167.421.000	167.421.000	0	RS*	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072933	ADQUISICION UNIDAD DESPLIEGUE POLICIA MARITIMA PARA GOB MARITIMA DE PTO MONTT	740.660.000	0	0	0	0	740.660.000	RS*	CONVENIO
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072938	ADQUISICION TECNOLOGIA NO INVASIVA PARA EL AEROPUERTO EL TEPUAL	146.321.000	0	0	0	0	146.321.000	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40073955	ACTUALIZACION DISEÑO DE INDICADORES Y METAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION REGIONAL CAMBIO CLIMATICO (PARCC) LOS LAGOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							37.735.671.000	1.069.510.249	1.259.490.322	3.090.942.639	1.831.452.317	33.575.218.112		
TOTAL REGIONAL							54.017.964.000	1.278.232.749	8.403.736.072	18.424.771.262	10.021.035.190	34.314.959.989		
						PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD								
24	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000	0	RS***	EJECUCION
33	RTE A BO	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072971	TRANSFERENCIA A JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE	3.231.105.000	0	3.050.000.000	3.231.105.000	181.105.000	0	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	EJECUCION	FRPD	PROVISIÓN FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO (SIN DISTRIBUIR)	3.503.147.000	0	0	3.503.147.000	3.503.147.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
33	03	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION		FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL (SIN DISTRIBUIR)	6.026.658.000	0	0	6.026.658.000	6.026.658.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
TOTAL							17.260.910.000	0	3.050.000.000	17.260.910.000	14.210.910.000	0		
TOTAL							17.260.910.000	0	3.050.000.000	17.260.910.000	14.210.910.000	0		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROGRAMAS DE ARRASTRE								
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	200.000.000	200.000.000	650.811.191	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	239.073.000	0	33.150.000	33.150.000	50.577.000	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	1.388.809.167	0	119.308.000	119.308.000	531.882.833	RS**	EJECUCION
33	03	TRANSPORTE	FRPD	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.823.578.319	0	1.750.122.000	1.750.122.000	11.406.299.681	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.878	428.154.116	0	748.375.000	748.375.000	3.020.762	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.001.000	608.377.496	0	640.355.000	640.355.000	1.268.504	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.001.000	345.714.459	0	351.681.000	351.681.000	2.605.541	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	385.283.360	0	299.178.000	299.178.000	15.538.640	RS**	EJECUCION
33	03	PESCA	FRPD	INDESPA	40063557	TRANSFERENCIA PROGRAMA TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.900.000.000	604.099.000	133.103.073	1.295.901.000	1.162.797.927	1.000.000.000	RS**	EJECUCION
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	SERNATUR	40064817	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.750.000.000	450.150.010	0	1.299.836.000	1.299.836.000	13.990	RS**	EJECUCION
33	03	TRANSPORTE	FAR	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	91.000.000	91.000.000	7.691.000.000	RS**	EJECUCION/MODIF CONV PROGRAMACION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	29.375.709	0	1.145.024.000	1.145.024.000	291	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.960	183.817.960	0	26.183.000	26.183.000	0	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	CORFO	40067360	CAPACITACION CENTRO TECNOLOGICO PARA LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGION DE LOS LAGOS	4.850.000.000	0	0	1.321.000.000	1.321.000.000	3.529.000.000	RS**	EJECUCION
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	40075384	TRANSFERENCIA CONECTACOOOP CIRCULAR, PROGRAMA DE INCUBACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA DESARROLLAR	266.852.000	20.416.000	0	147.133.000	147.133.000	99.303.000	RS**	EJECUCION
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad San Sebastián	40075417	TRANSFERENCIA SOLUCIONES SOCIO SANITARIAS PARA LA VISITACIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE ÁREA	243.000.000	20.416.000	0	214.302.000	214.302.000	8.282.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Santiago de Chile	40075430	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA	300.000.000	1.000.000	0	114.777.000	114.777.000	184.223.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Chile	40075429	TRANSFERENCIA VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO DE COSECHA DE AGUA SUBSUPERFICIAL Y DESARROLLO DE EST	174.060.000	0	0	103.875.000	103.875.000	70.185.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	40075416	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO MARÍTIMO PORTUARIO EN EL MARCO	300.000.000	752.000	0	218.405.000	218.405.000	80.843.000	RS**	EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE							43.204.664.838	7.760.205.405	133.103.073	10.119.605.000	9.986.501.927	25.324.854.433		
						PROGRAMAS SALUD								
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.214.000	583.423.000	0	24.790.000	24.790.000	1.000	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	558.564.000	458.564.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	504.035.000	0	454.800.000	454.800.000	615.165.000	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40063903	PROTECCION DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA PROVINCIA DE PALENA y COCHAMÓ	878.618.605	0	0	321.087.000	321.087.000	557.531.605	RS**	CONVENIO
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40063898	PROTECCION DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA PROVINCIA LLANQUIHUE	1.289.643.265	0	0	435.799.000	435.799.000	853.844.265	RS**	CONVENIO
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40065461	PROTECCION Y APOYO SALUD INTEGRAL E INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA	1.305.293.570	0	0	0	0	1.305.293.570	RS**	RES EN TRAMITE GORE
TOTAL PROGRAMAS SALUD							6.814.333.440	2.026.022.000	0	1.456.476.000	1.456.476.000	3.331.835.440		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROGRAMAS NUEVOS								
24	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	SENDA	40072688	PREVENCION SENDA - GORE LOS LAGOS: MÁS COMUNIDAD, MÁS PREVENCIÓN	333.537.000	0	0	156.724.000	156.724.000	176.813.000	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SAG Región de Los Lagos	40063864	CONTROL PROGRAMA COMUNITARIO DE CONTROL DE VISÓN AMERICANO EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	452.992.000	0	0	0	0	452.992.000	RS**	RES APROBACION EN CONTRALORIA
33	03	PESCA	LIBRE	CORFO	40064703	CAPACITACION TRANSFERENCIA PRODUCTIVA Y ECONOMIA CIRCULAR PARA LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN	1.600.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.550.000.000	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	ProChile	40071275	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	248.500.000	0	0	0	0	248.500.000	RS**	RES APROBACION EN CONTRALORIA
24	09	MULTISECTORIAL	LIBRE	GORE Los Lagos	40077562	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" PR3101021001- EX ANTE	710.745.000	0	0	108.500.000	108.500.000	602.245.000	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SAG Región de Los Lagos	40060694	ERRADICACION MEJORA DEL ACTUAL STATUS SANITARIO DE BRUCELOSIS BOVINA REGION DE LOS LAGOS	987.876.000	0	0	0	0	987.876.000	RS**	RES EN TRAMITE
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							4.333.650.000	0	0	315.224.000	315.224.000	4.018.426.000		

						PROGRAMAS FRPD - Ciencia-Tecnología, Conocimiento e Innovación								
33	01	PESCA	FRPD	Universidad Austral de Chile	50000231	PREDICCIÓN Y MANEJO INTELIGENTE DE CALIGIDOSIS: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UNA SALMONICULTURA SOSTENIBLE	300.000.000	0	0	166.399.000	166.399.000	133.601.000	RS**	CONVENIO
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Católica de Chile	50000235	INICIO DE UN PLAN PILOTO DE VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS Y VRS BOVINA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	300.000.000	0	0	92.390.000	92.390.000	207.610.000	RS**	CONVENIO
33	01	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	Corporación Instituto Profesional Santo Tomás	50000240	MONTE VERDE EL ORIGEN, INNOVACIÓN DESDE EL PATRIMONIO	251.878.000	0	0	147.785.000	147.785.000	104.093.000	RS**	CONVENIO
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	Universidad San Sebastián	50000244	GESTIÓN HÍDRICA SUSTENTABLE EN CENTROS DE SALUD: ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES Y PATÓGENOS MULTIRRESISTENTES UTILIZANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS	270.000.000	0	0	71.542.000	71.542.000	198.458.000	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	50000248	PLATAFORMA MULTI-ÓMICA PARA LA MITILICULTURA SOSTENIBLE: SOLUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS AL DESAFÍO DE LA FIJACIÓN Y EL DESPRENDIMIENTO DE SEMILLAS DE MYTILUS CHILENSIS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	265.500.000	0	0	22.429.000	22.429.000	243.071.000	RS**	CONVENIO
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	50000252	CENTRO DE FORMACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL: INNOVA PUERTO MONTT	282.000.000	0	0	108.081.000	108.081.000	173.919.000	RS**	CONVENIO
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	Universidad de Los Lagos	50000254	DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE HUELLA DE CARBONO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS PRINCIPALES FRUTALES Y CULTIVOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	300.000.000	0	0	44.249.000	44.249.000	255.751.000	RS**	CONVENIO
33	01	EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO	FRPD	Universidad San Sebastián	50000258	MENTES CIRCULARES Y SOSTENIBLES: INNOVANDO DESDE LA EDUCACIÓN PARA EL FUTURO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	610.000.000	0	0	155.744.000	155.744.000	454.256.000	RS**	CONVENIO
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							2.579.378.000	0	0	808.619.000	808.619.000	1.770.759.000		

TOTAL PROGRAMAS	56.932.026.278	9.786.227.405	133.103.073	12.699.924.000	12.566.820.927	34.445.874.873
------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)	74.192.936.278	9.786.227.405	3.183.103.073	29.960.834.000	26.777.730.927	34.445.874.873
---	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2025	624.273.278.014	186.143.242.619	45.403.597.858	114.575.108.000	69.171.510.142	323.167.678.248
------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
S/R=SIN RATE 2025

RESUMEN FRIL AL 31-05-2026

Etiquetas de fila	CANTIDAD	COSTO	G. AÑOS ANT.	COMPROMISO 2026	PAGADO 2026	SALDO PAGAR 2026
CHILOE	34	5.144.350.660	692.324.815	4.451.868.333	2.747.624.873	1.704.243.460
ANCUD	4	448.365.152	0	448.365.152	280.665.844	167.699.308
CASTRO	3	455.593.254	28.621.434	426.971.820	127.532.601	299.439.219
CHONCHI	2	450.199.226	7.497.000	442.702.226	227.180.714	215.521.512
CURACO	3	440.272.458	0	440.272.458	327.061.703	113.210.755
DALCAHUE	2	477.630.925	56.325.817	421.305.108	289.392.376	131.912.732
PUQUELDON	5	730.134.586	188.749.770	541.384.816	211.668.313	329.716.503
QUEILEN	5	709.129.919	232.446.098	476.683.821	318.038.282	158.645.539
QUELLON	3	466.027.570	0	465.870.058	383.355.055	82.515.003
QUEMCHI	3	362.787.339	58.147.493	304.639.846	185.839.556	118.800.290
QUINCHAO	4	604.210.231	120.537.203	483.673.028	396.890.429	86.782.599
LLANQUIHUE	18	3.053.638.680	513.303.866	2.529.478.719	1.717.713.082	811.765.637
CALBUCO	1	193.990.679	184.252.023	9.738.656	0	9.738.656
COCHAMO	3	461.449.257	0	461.449.257	245.046.894	216.402.363
FRESIA	2	299.258.334	0	299.258.334	180.996.600	118.261.734
FRUTILLAR	3	440.856.627	127.515.782	313.340.845	208.311.293	105.029.552
LLANQUIHUE	2	298.358.263	0	298.358.263	182.609.323	115.748.940
LOS MUERMOS	1	301.795.166	0	301.795.166	275.112.610	26.682.556
MAULLIN	3	497.427.500	201.536.061	285.035.344	174.028.990	111.006.354
PTO MONTT	1	289.386.686	0	289.386.686	217.741.761	71.644.925
PTO VARAS	2	271.116.168	0	271.116.168	233.865.611	37.250.557
OSORNO	16	2.570.592.636	546.482.768	2.024.109.868	1.416.024.427	608.085.441
OSORNO	2	265.503.327	0	265.503.327	178.395.787	87.107.540
PUERTO OCTAY	2	301.880.556	0	301.880.556	272.840.609	29.039.947
PURRANQUE	3	479.567.475	187.582.660	291.984.815	265.783.572	26.201.243
PUYEHUE	3	466.349.982	135.834.768	330.515.214	282.057.236	48.457.978
RIO NEGRO	2	301.597.345	0	301.597.345	180.114.874	121.482.471
S.J. COSTA	2	482.988.835	143.724.068	339.264.767	60.563.003	278.701.764
SAN PABLO	2	272.705.116	79.341.272	193.363.844	176.269.346	17.094.498
PALENA	14	2.669.263.015	973.187.851	1.699.596.697	881.925.991	817.670.706
CHAITEN	2	467.078.830	0	470.600.363	177.232.555	293.367.808
FUTALEUFU	5	898.791.792	499.340.520	399.451.272	315.515.506	83.935.766
HUALAIHUE	3	443.754.409	109.788.640	333.965.769	205.653.449	128.312.320
PALENA	4	859.637.984	364.058.691	495.579.293	183.524.481	312.054.812
Total general	82	13.437.844.991	2.725.299.300	10.705.053.617	6.763.288.373	3.941.765.244

PROVISION	PROVINCIA	COMUNA	NOMBRE PROYECTO	CODIGO BIP	MONTO CONTRATO	TOTAL PAGADO 2010 - 2025	COMPROMISO AÑO VIGENTE	TOTAL PAGADO 2026	SALDO PAGAR 2026	ESTADO
TRADICIONAL	OSORNO	OSORNO	CONSTRUCCION MARQUESINA BOMBONERA, OSORNO	40073004	150.000.000	0	150.000.000	131.056.967	18.943.033	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	OSORNO	MEJORAMIENTO PLAZA LAS VEGAS, RAHUE ALTO, OSORNO	40072361	115.503.327	0	115.503.327	47.338.820	68.164.507	PARALIZADO
TRADICIONAL	OSORNO	SAN PABLO	REPOSICION PLAZA VILLA LOS JARDINES, COMUNA SAN PABLO	40071489	159.045.583	44.366.770	114.678.813	106.422.295	8.256.518	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	SAN PABLO	MEJORAMIENTO PLAZA LOS ALAMOS SAN PABLO	40071480	113.659.533	34.974.502	78.685.031	69.847.051	8.837.980	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	PUEHUE	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL	40057021	193.175.446	135.834.768	57.340.678	57.340.678	0	TERMINADO
TRADICIONAL	OSORNO	PUEHUE	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES PORVENIR	40073467	136.619.774	0	136.619.774	95.106.680	41.513.094	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	PUEHUE	MEJORAMIENTO PUEBLITO ARTESANAL Y GASTRONOMICO ENTRE LAGOS	40073393	136.554.762	0	136.554.762	129.609.878	6.944.884	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	PUERTO OCTAY	REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS CON LUMINARIAS FV RUTA L	40071496	101.144.000	0	101.144.000	95.010.383	6.133.617	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	PUERTO OCTAY	MEJORAMIENTO PLAZA CARLOS MANCILLA SOLIS PUERTO OCTAY	40072962	200.736.556	0	200.736.556	177.830.226	22.906.330	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	PURRANQUE	REPOSICIÓN HOGAR PROTEGIDO, COMUNA DE PURRANQUE	40057205	193.235.161	187.582.660	5.652.501	0	5.652.501	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	PURRANQUE	REPOSICION HILO PILOTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CENTRO PURRANQUE	40066872	144.000.484	0	144.000.484	144.000.484	0	TERMINADO
TRADICIONAL	OSORNO	PURRANQUE	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE PURRANQUE	40073524	142.331.830	0	142.331.830	121.783.088	20.548.742	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	RIO NEGRO	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CHEUQUEMO RIO NEGRO	40066350	153.406.295	0	153.406.295	90.521.196	62.885.099	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	RIO NEGRO	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CHAN CHAN RIO NEGRO	40066406	148.191.050	0	148.191.050	89.593.678	58.597.372	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	S.J. COSTA	MEJORAMIENTO INTEGRAL POSTA DE SALUD RURAL LOMA DE LA PIEDRA	40056981	193.862.175	143.724.068	50.138.107	0	50.138.107	EJECUCION
TRADICIONAL	OSORNO	S.J. COSTA	MEJORAMIENTO PASEO Y CALLE SIMPSON . MAICOLPUE SAN JUAN DE LA	40059331	289.126.660	0	289.126.660	60.563.003	228.563.657	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	PTO MONTT	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE VIAL SECTOR CENTRO PUERTO	40057076	289.386.686	0	289.386.686	217.741.761	71.644.925	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	PTO VARAS	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIEL SEGUNDO VILLARROEL. COMUNA PTO V	40071028	116.254.621	0	116.254.621	106.021.991	10.232.630	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	PTO VARAS	CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR DEL PUENTE, COMUNA DE PUERTO VAR	40039109	154.861.547	0	154.861.547	127.843.620	27.017.927	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	COCHAMO	CONSTRUCCION SEÑALETICA INDICATIVA AREAS URBANAS DE COCHAMO	40071809	149.175.289	0	149.175.289	86.591.517	62.583.772	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	COCHAMO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIBERA SUR, COMUNA DE COCHAMO	40072177	144.621.371	0	144.621.371	49.312.385	95.308.986	EJECUCION
PRODUCTIVO	LLANQUIHUE	COCHAMO	CONSTRUCCION CENTRO DE COMERCIALIZACION RURAL LLANADA GRAN	40072182	167.652.597	0	167.652.597	109.142.992	58.509.605	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	CALBUCO	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DAITAO, COMUNA DE CALBUCO	40057149	193.990.679	184.252.023	9.738.656	0	9.738.656	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	MAULLIN	MEJORAMIENTO PLAZA 22 DE MAYO Y ESPACIO PÚBLICO, QUENUIR, COMUNA DE	40057250	193.997.000	175.335.912	7.804.993	7.804.993	0	TERMINADO
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	MAULLIN	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CORHABIT CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	40071129	202.287.000	18.369.899	183.917.101	100.068.134	83.848.967	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	MAULLIN	CONSTRUCCION SEÑALETICA PARA IDENTIFICACION DE CALLES, COMUNA DE MA	40072983	101.143.500	7.830.250	93.313.250	66.155.863	27.157.387	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO MULTIPROPOSITO LOS MUERMOS	40073240	301.795.166	0	301.795.166	275.112.610	26.682.556	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	FRESIA	MEJORAMIENTO PLAZA DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA	40072919	154.000.000	0	154.000.000	141.777.602	12.222.398	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	FRESIA	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR LA ISLA COMUNA DE FRI	40072608	145.258.334	0	145.258.334	39.218.998	106.039.336	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO TENIENTE MERINO, COMUNA DE LLAN	40057070	174.913.805	0	174.913.805	123.665.982	51.247.823	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	CONSTRUCCION Y REPOSICION SEÑALETICA VIAL EN DIV ZONAS URBANA	40065763	123.444.458	0	123.444.458	58.943.341	64.501.117	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	CONSTRUCCIÓN ESPACIO DE ENTRENAMIENTO PARA DISCIPLINAS ARTÍS	40057129	150.417.209	127.515.782	22.901.427	22.901.427	0	TERMINADO
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	CONSTRUCCION CASA PSICOSOCIAL, COMUNA DE FRUTILLAR	40071277	149.631.548	0	149.631.548	86.837.973	62.793.575	EJECUCION
TRADICIONAL	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	CONSTRUCCION CASA PARA PERSONAS MAYORES COMUINA DE FRUTRIL	40071223	140.807.870	0	140.807.870	98.571.893	42.235.977	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	CASTRO	MEJORAMIENTO PASEO COSTANERO, COMUNA DE CASTRO	40072669	162.158.028	0	162.158.028	80.470.927	81.687.101	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	CASTRO	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y AREA VERDE INES DE BAZAN, COMUNA	40072442	148.619.249	21.067.165	127.552.084	31.045.315	96.506.769	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	CASTRO	MEJORAMIENTO AREAS VERDE VILLA ALTOS DE CHILOE COMUNA DE CAS	40072426	144.815.977	7.554.269	137.261.708	16.016.359	121.245.349	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	ANCUD	MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN DIV SECTORES DE QUETA	40070823	101.143.289	0	101.143.289	75.802.328	25.340.961	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	ANCUD	HABILITACION PEATONAL PASAJE RIQUELME, COMUNA DE ANCUD	40071164	92.520.581	0	92.520.581	62.425.692	30.094.889	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	ANCUD	REPOSICION Y HABILITACION PLAZA DE JUEGOS CHACAO	40072481	96.218.792	0	96.218.792	53.803.292	42.415.500	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	ANCUD	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA HISTORICO EN DIV SECTORES DE LA COMUNA	40073214	158.482.490	0	158.482.490	88.634.532	69.847.958	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	QUEMCHI	MEJORAMIENTO PLAZA DE QUICAVI, COMUNA DE QUEMCHI	40070862	59.356.839	29.682.337	29.674.502	29.674.502	0	TERMINADO
TRADICIONAL	CHILOE	QUEMCHI	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS SECTOR ALTO DE QUEMCHI	40070767	197.600.000	0	197.600.000	90.135.916	107.464.084	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUEMCHI	REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE QUEMCHI	40070860	105.830.500	28.465.156	77.365.344	66.029.138	11.336.206	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	DALCAHUE	CONSERVACION MUSEO HISTORICO ETNOGRAFICO, CIUDAD DE DALCAHUE	40071609	161.500.924	5.933.638	155.567.286	107.554.282	48.013.004	EJECUCION

PROVISION	PROVINCIA	COMUNA	NOMBRE PROYECTO	CODIGO BIP	MONTO CONTRATO	TOTAL PAGADO 2010 - 2025	COMPROMISO AÑO VIGENTE	TOTAL PAGADO 2026	SALDO PAGAR 2026	ESTADO
TRADICIONAL	CHILOE	DALCAHUE	MEJORAMIENTO ENTORNO Y SEGURIDAD ESTADIO, CIUDAD DE DALCAHUE	40071605	316.130.001	50.392.179	265.737.822	181.838.094	83.899.728	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	CURACO	CUBIERTA CULTURAL PARQUE LOS MOLINOS, CURACO DE VELEZ	40071617	160.531.482	0	160.531.482	47.320.727	113.210.755	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	CURACO	CONSTRUCCION ALUMBRADO FOTOVOLTAICO SECTOR TOLQUIEN, CURACO	40071285	160.044.285	0	160.044.285	160.044.285	0	TERMINADO
TRADICIONAL	CHILOE	CURACO	CONSTRUCCION MIRADOR PARQUE PALQUI CURACO DE VELEZ	40072329	119.696.691	0	119.696.691	119.696.691	0	TERMINADO
TRADICIONAL	CHILOE	QUINCHAO	CONSTRUCCION CAMARINES, BAÑOS CANCHA SECTOR ISLA LIN LIN, COMUNA DE QUINCHAO	40057107	132.822.222	120.537.203	12.285.019	12.285.019	0	TERMINADO
BICENTENARIO	CHILOE	QUINCHAO	MEJORAMIENTO PREDIO MUNICIPAL ROSARIO HUEICHA, COMUNA DE QUINCHAO	40070529	168.108.400	0	168.108.400	157.124.701	10.983.699	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUINCHAO	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ISLA QUENAC, COMUNA DE QUINCHAO	40070533	171.738.818	0	171.738.818	162.393.004	9.345.814	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUINCHAO	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO COMITÉ MARIA AUXILIADORA ISLA LIN LIN, COMUNA DE QUINCHAO	40070531	131.540.791	0	131.540.791	65.087.705	66.453.086	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	CHONCHI	MEJORAMIENTO FERIA DE ARTESANIA, COMUNA DE CHONCHI	40072433	159.998.551	7.497.000	152.501.551	121.728.819	30.772.732	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	CHONCHI	MEJORAMIENTO ESCENARIO Y SERVICIOS SECTOR NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	40072510	290.200.675	0	290.200.675	105.451.895	184.748.780	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	PUQUELDON	MEJORAMIENTO CUARTEL 2A COMPAÑIA DE BOMBEROS DE ALDACHILDO	40056725	165.278.425	24.021.822	141.256.603	0	141.256.603	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	PUQUELDON	CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AVI	40065563	193.996.661	164.727.948	29.268.713	29.268.713	0	TERMINADO
TRADICIONAL	CHILOE	PUQUELDON	MEJORAMIENTO 2 TRAMOS DE CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA PUQUELDON	40070993	101.143.500	0	101.143.500	95.423.213	5.720.287	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	PUQUELDON	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CAMAHUETO LOCALIDAD PUQUELDON	40070992	101.143.500	0	101.143.500	78.259.636	22.883.864	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	PUQUELDON	MEJORAMIENTO ENTORNO COSTANERA ALDACHILDO Y SEÑALETICA TURISTICA	40070995	168.572.500	0	168.572.500	8.716.751	159.855.749	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUEILEN	REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE AGONI ALTO, QUEILEN	40038983	154.275.729	138.857.137	15.418.592	15.418.592	0	TERMINADO
TRADICIONAL	CHILOE	QUEILEN	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE APECHE ALTO - PUREO, QUEILEN	40057268	108.641.381	93.588.961	15.052.420	15.052.420	0	TERMINADO
BICENTENARIO	CHILOE	QUEILEN	MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE QUEILEN	40071469	163.651.774	0	163.651.774	77.929.787	85.721.987	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUEILEN	REPOSICION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ANTONIO GRILLE QUEILEN	40066591	182.581.459	0	182.581.459	121.357.201	61.224.258	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUEILEN	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS POBLACION FORJADORE	40071471	99.979.576	0	99.979.576	88.280.282	11.699.294	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUELLON	MEJORAMIENTO SEGURIDAD PEATONAL COMUNA QUELLON	40070644	99.007.405	0	99.007.405	44.873.335	54.134.070	EJECUCION
TRADICIONAL	CHILOE	QUELLON	REPOSICION PARADEROS SECTORES RESIDENCIALES COMUNA QUELLON	40070643	199.540.785	0	199.540.785	171.159.852	28.380.933	EJECUCION
BICENTENARIO	CHILOE	QUELLON	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HITO CERO, COMUNA DE QUELLON	40070642	167.479.380	0	167.321.868	167.321.868	0	TERMINADO
TRADICIONAL	PALENA	CHAITEN	REPOSICION GRADERIAS Y NORMALIZACION RUTA ACCESIBLE ESTADIO MUNICIPAL	40071604	303.428.484	0	303.428.484	68.502.157	234.926.327	EJECUCION
PRODUCTIVO	PALENA	CHAITEN	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AYACARA	40073603	163.650.346	0	167.171.879	108.730.398	58.441.481	EJECUCION
TRADICIONAL	PALENA	HUALAIHUE	CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA LOS TEPUALES, COMUNA DE HUALAIHUE	40070889	162.605.543	0	162.605.543	77.497.297	85.108.246	EJECUCION
TRADICIONAL	PALENA	HUALAIHUE	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA PATAGONIA, COMUNA DE HUALAIHUE	40070884	128.282.848	69.199.613	59.083.235	32.531.700	26.551.535	EJECUCION
PRODUCTIVO	PALENA	HUALAIHUE	CONSTRUCCION MERCADO PRODUCTIVO LOCAL CONTAO	40073532	152.866.018	40.589.027	112.276.991	95.624.452	16.652.539	EJECUCION
PRODUCTIVO	PALENA	FUTALEUFU	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIUSO AGRICOLA EL AZUL, FUTALEUFU	40056946	193.996.999	163.090.041	30.906.958	30.906.958	0	TERMINADO
TRADICIONAL	PALENA	FUTALEUFU	CONSTRUCCIÓN CENTRO MULTIPROPÓSITO EL LÍMITE, FUTALEUFÚ	40058235	193.975.792	184.272.056	9.703.736	0	9.703.736	EJECUCION
TRADICIONAL	PALENA	FUTALEUFU	CONSTRUCCION OFICINAS Y ESPACIOS MULTIDISCIPLINARIOS, FUTALEUFU	40066678	193.997.000	143.480.038	50.516.962	50.516.962	0	TERMINADO
PRODUCTIVO	PALENA	FUTALEUFU	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO AGRICOLA EL ESPOLON	40073043	167.546.085	0	167.546.085	107.436.258	60.109.827	EJECUCION
TRADICIONAL	PALENA	FUTALEUFU	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL LAGUNA ESPEJO	40073294	149.275.916	8.498.385	140.777.531	126.655.328	14.122.203	EJECUCION
PRODUCTIVO	PALENA	PALENA	CONSERVACION Y HABILITACION CENTRO PRODUCTIVO ALTO PALENA	40072767	168.215.484	0	168.215.484	70.358.290	97.857.194	EJECUCION
TRADICIONAL	PALENA	PALENA	CONSTRUCCION CENTRO MULTIFUNCIONAL	40070932	303.430.500	0	303.430.500	89.232.882	214.197.618	EJECUCION
TRADICIONAL	PALENA	PALENA	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO URBANO PALENA	40065848	193.996.000	179.936.758	14.059.242	14.059.242	0	TERMINADO
TRADICIONAL	PALENA	PALENA	CONSTRUCCION ACCESO Y SENDEROS SECTOR LA PUNTILLA PALENA	40065615	193.996.000	184.121.933	9.874.067	9.874.067	0	TERMINADO
