

ESTADO DE SITUACIÓN

Ejecución Presupuestaria FNDR

SEPTIEMBRE 2025


División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional de Los Lagos



www.gorelосlagos.cl



MARCO PRESUPUESTARIO FNDR – Programa 02 2025

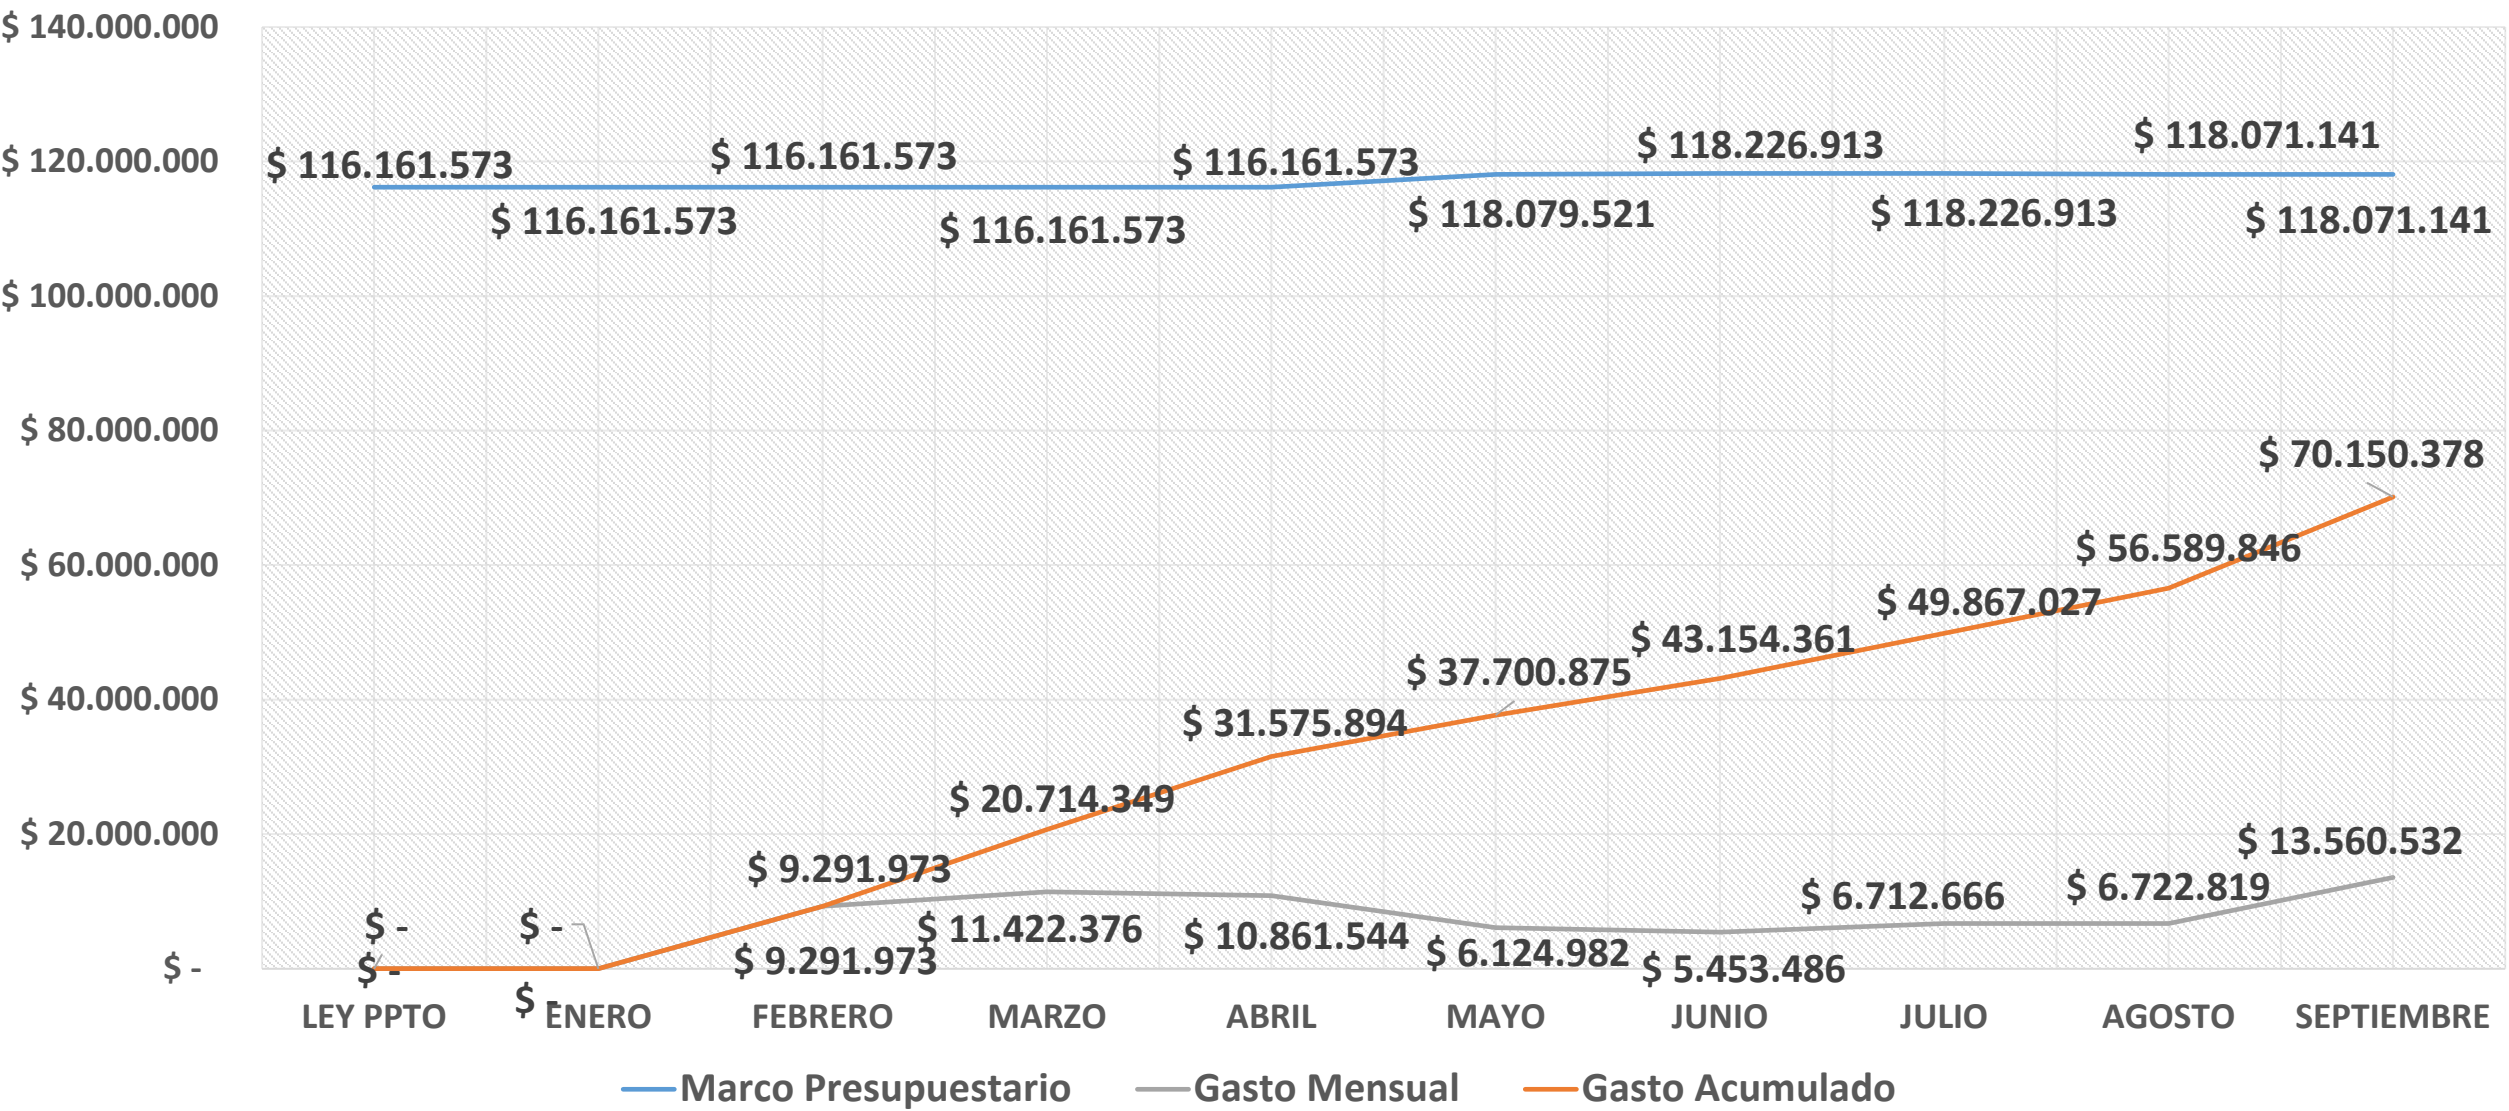

MARCO PRESUPUESTARIO FNDR – Programa 02


Modificaciones Presupuestarias

Modificaciones Presupuestarias	Número Documento	Monto M\$	Observación
PRESUPUESTO INICIAL	Ley N° 21.722 del 13/12/2024	\$ 116.161.573	Resolución Afecta N°40, con toma de razón 07/02/2025
Traspaso Programa 01	Decreto N°201 Toma Razón 24-03-2025	-\$ 1.404.457	Resolución Afecta N°16, con toma de razón 19/05/2025
Rebaja DIPRES	Decreto N°06 Toma Razón 19-02-2025	-\$ 5.808.079	Resolución Afecta N°17, con toma de razón 19/05/2025
Apertura Cuentas de Ingreso	Res. Afecta N°40	\$ 30	Con Toma de Razón 19/05/2025
Deuda Flotante		\$ 15.185.518	A la espera de Decreto DIPRES
Aumento PEDZE	Decreto N°173 Toma Razón 17-03-2025	\$ 9.130.454	Resolución Afecta N°50, con toma de razón 03/06/2025
Transferencia de recursos a INDESPA Zona Contigua	Res. Afecta N°94	-\$ 1.000.000	Resolución Afecta N°94, con toma de razón 31/08/2025
3% EMERGENCIA DIPRES	Res. Afecta N°61	-\$ 3.484.847	Resolución N°166 en CONTRALORIA desde 17-10-2025
Aumento FACR Subdere	Res. Afecta N°77	\$ 147.392	Con toma de razón 09-07-2025
Aumento por Zonas de Rezago	Res. Afecta N°100	\$ 844.228	Resolución Afecta N°100, con toma de razón 31/08/2025
Trans. Consoli. SUBDERE - Programa Mejoramiento Urbano PMU		-\$ 3.666.552	Decreto N°1051 con Toma de Razón - Resolución en trámite GORE
Total		\$ 126.105.260	

Marco Proyectado SIN
Deuda Flotante \$ 110.919.742

Eficiencia Presupuestaria FNDR

Programa 02 - 2025 - % Ejecución

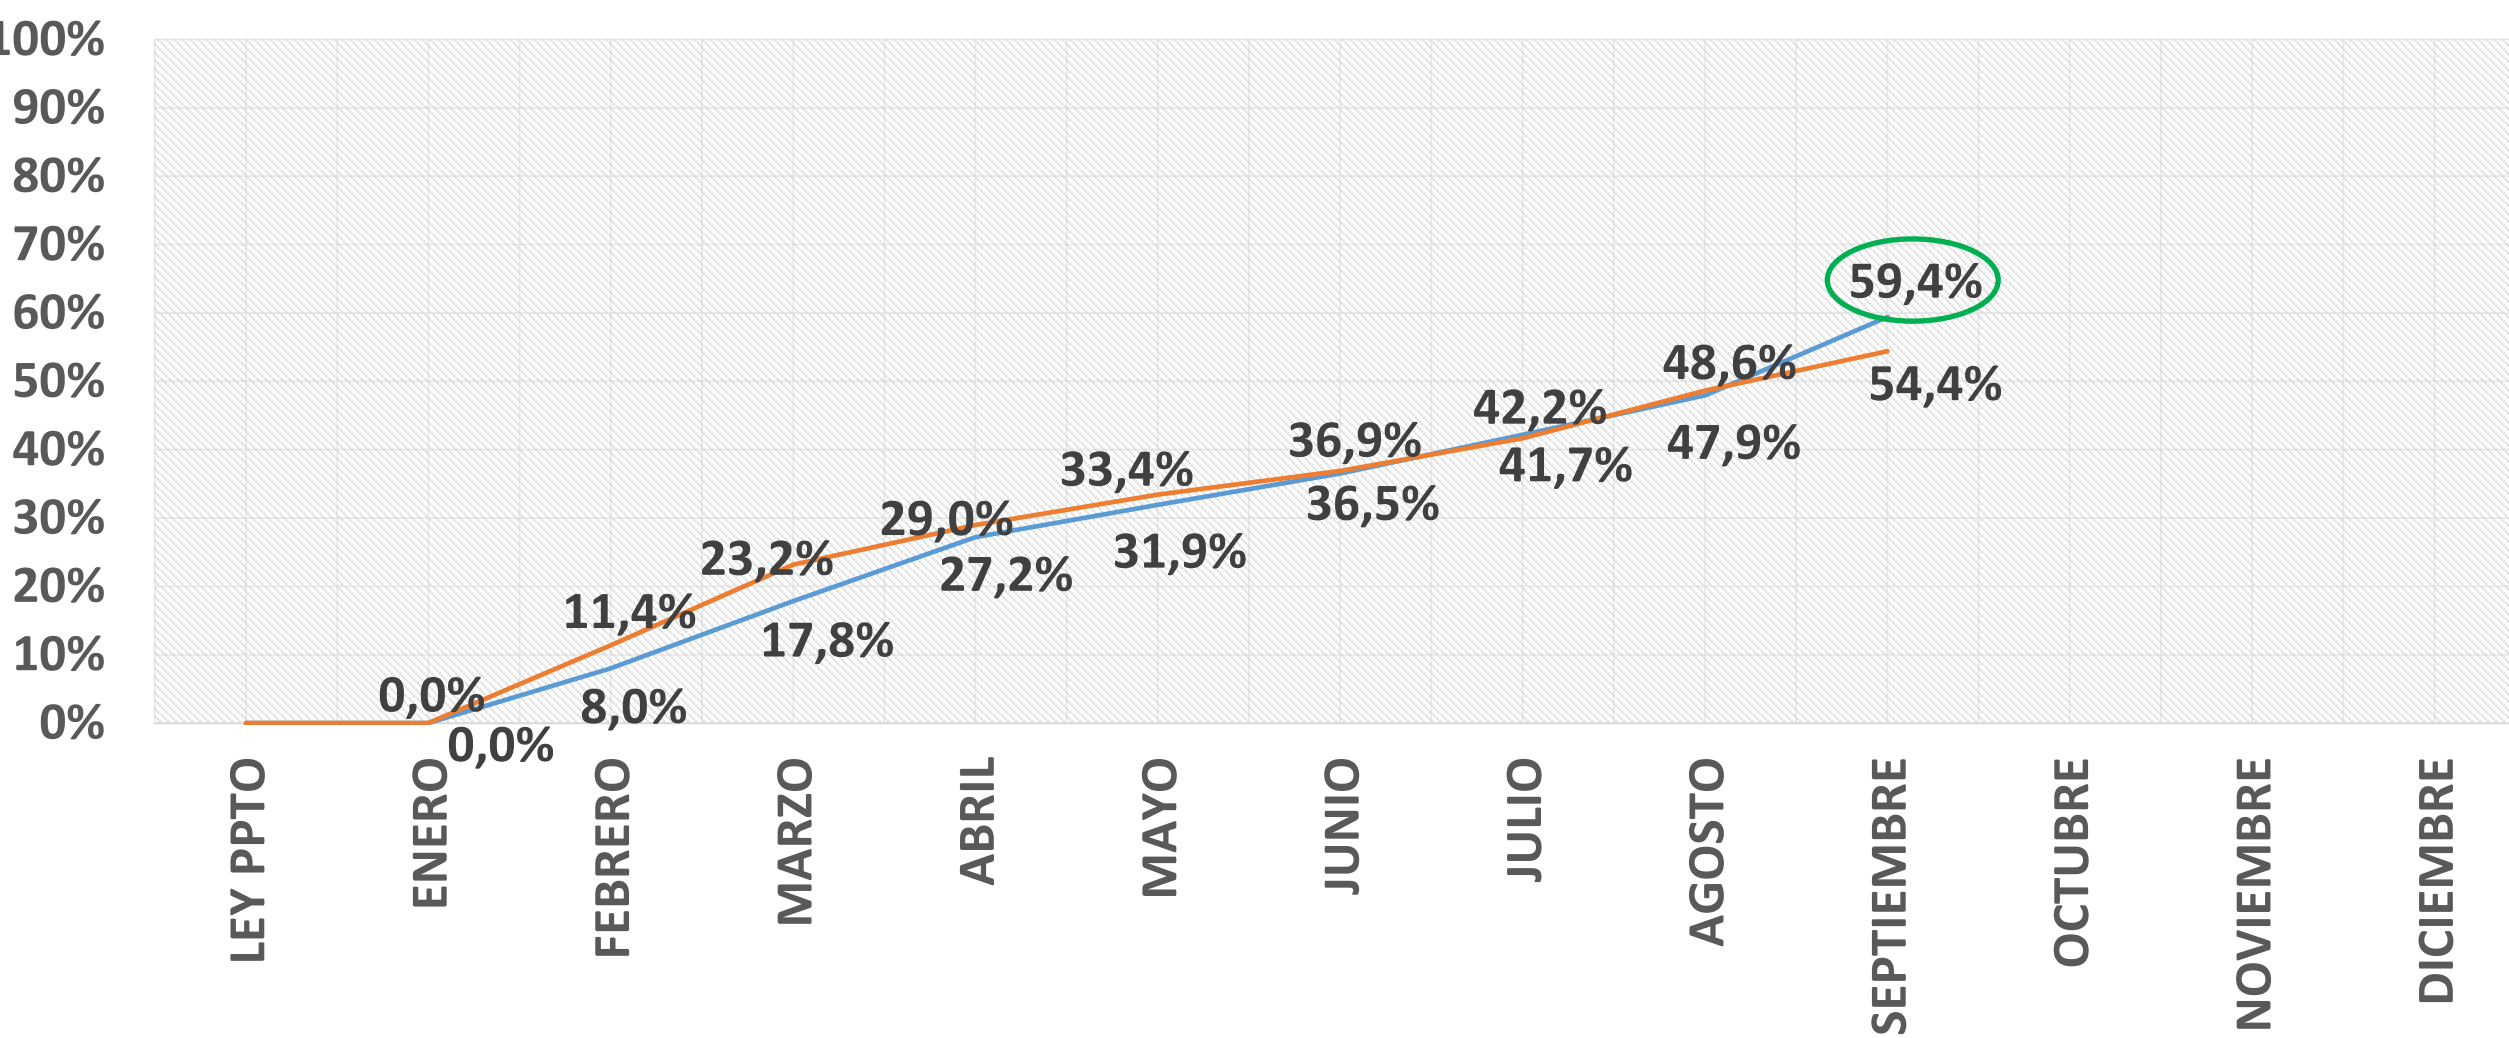


% EJECUCION CON ANTICIPOS Y PRESUPUESTO PROYECTADO 66,8%

PRESUPUESTO PROYECTADO M\$110.919.742 (SIN DEUDA FLOTANTE)


GASTO +ANTICIPOS M\$ 74.119.646

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

al 30 Septiembre

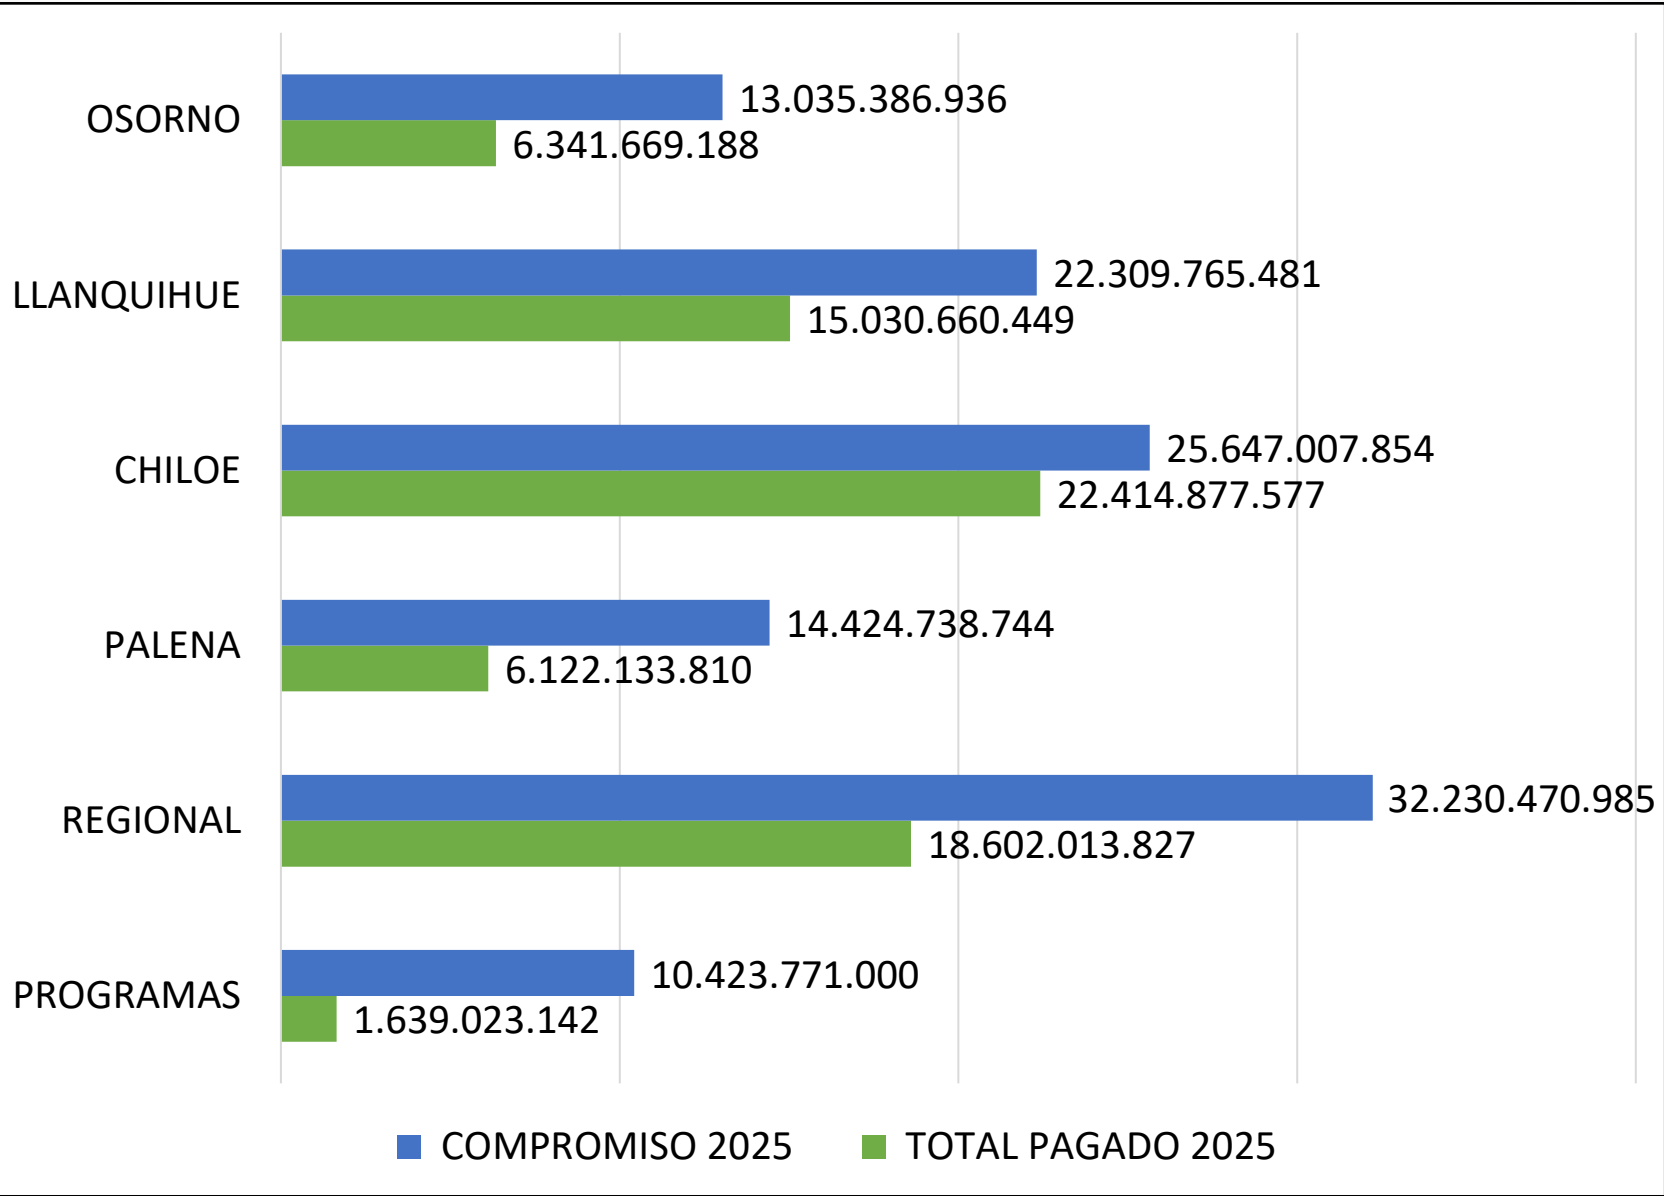

% Distribución por Provincia

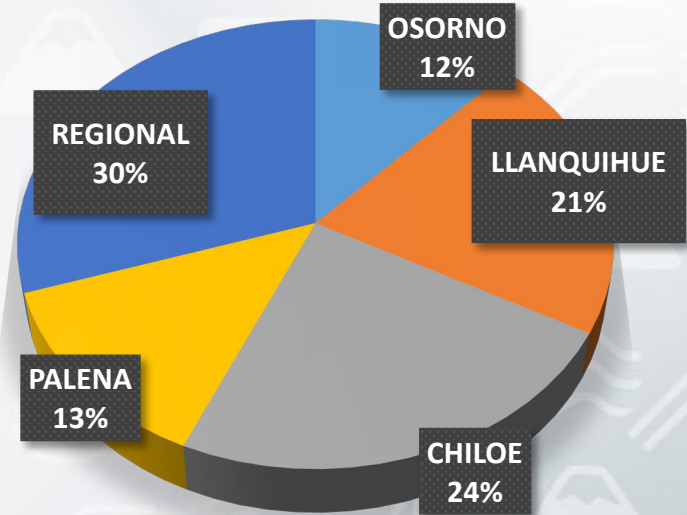

Resumen Ejecución por Provincia

PROVINCIA	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	48,65%	6.693.717.748
LLANQUIHUE	67,37%	7.279.105.032
CHILOE	87,40%	3.232.130.277
PALENA	42,44%	8.302.604.934
REGIONAL	57,72%	13.628.457.158
PPTO TERRITORIAL		39.136.015.149
PROGRAMAS	15,72%	8.784.747.858
TOTAL	59,41%	47.920.763.007

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROVINCIA



Detalle Provincia de Osorno

		COSTO TOTAL			FNDR 2025				
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2025	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	5	11.222.193.000	13%	5.256.446.492	978.738.890	8%	563.076.240	57,53%	415.662.650
OSORNO	27	42.226.525.828	48%	25.595.187.338	4.531.762.648	35%	1.953.590.192	43,11%	2.578.172.456
PTO. OCTAY	4	1.997.081.000	2%	21.934.080	685.912.200	5%	274.620.000	40,04%	411.292.200
PURRANQUE	9	6.824.049.000	8%	857.058.648	2.113.484.676	16%	1.111.057.817	52,57%	1.002.426.859
PUYEHUE	3	9.230.453.000	11%	496.685.030	333.574.970	3%	121.855.665	36,53%	211.719.305
RIO NEGRO	8	7.110.973.102	8%	2.153.175.395	2.451.675.311	19%	1.182.221.440	48,22%	1.269.453.871
SAN JUAN DE LA COSTA	4	7.039.075.000	8%	1.107.987.923	1.257.794.367	10%	1.104.387.800	87,80%	153.406.567
SAN PABLO	4	2.019.694.000	2%	21.991.200	682.443.874	5%	30.860.034	4,52%	651.583.840
TOTAL	64	87.670.043.930	100%	35.510.466.106	13.035.386.936	100%	6.341.669.188	48,65%	6.693.717.748

Detalle Provincia de Llanquihue



		COSTO TOTAL		FNDR 2025					
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2025	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	18	39.860.533.057	26%	20.306.135.623	5.962.218.489	27%	4.627.852.076	78%	1.334.366.413
CALBUCO	9	25.521.336.839	17%	13.560.884.574	3.426.487.794	15%	2.673.375.708	78%	753.112.086
COCHAMO	8	8.035.356.515	5%	220.786.368	504.161.892	2%	33.041.500	7%	471.120.392
FRESIA	12	6.155.703.763	4%	1.281.628.548	2.598.874.102	12%	1.813.960.164	70%	784.913.938
FRUTILLAR	9	14.279.427.442	9%	7.850.491.768	847.941.949	4%	488.733.085	58%	359.208.864
LLANQUIHUE	2	837.845.000	1%	128.969	206.309.345	1%	180.853.448	88%	25.455.897
LOS MUERMOS	7	6.076.075.839	4%	2.155.805.878	1.588.380.139	7%	1.552.988.867	98%	35.391.272
MAULLIN	10	7.434.169.681	5%	0	1.553.033.909	7%	255.600.999	16%	1.297.432.910
P.VARAS	10	14.010.492.597	9%	3.773.478.504	2.858.068.100	13%	2.259.302.797	79%	598.765.303
PROV.LLANQUIHUE	8	28.619.315.420	19%	14.885.389.954	2.764.289.762	12%	1.144.951.805	41%	1.619.337.957
TOTAL	93	150.830.256.153	100%	64.034.730.186	22.309.765.481	100%	15.030.660.449	67%	7.279.105.032

Detalle Provincia de Chiloé



		COSTO TOTAL			FNDR 2025				
PROVINCIA	INIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2025	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	6	34.063.939.170	24%	12.539.253.102	10.775.195.003	43%	9.960.004.630	92%	815.190.373
ANCUD	10	9.553.265.000	7%	2.074.258.198	1.661.507.937	7%	1.438.997.823	87%	222.510.114
CASTRO	5	19.227.056.530	13%	536.983.601	4.851.663.192	19%	4.662.869.192	96%	188.794.000
CHONCHI	14	14.306.954.537	10%	2.120.550.699	2.020.211.493	8%	1.957.169.186	97%	63.042.307
CURACO DE VÉLEZ	8	15.797.279.055	11%	13.110.357.655	1.357.165.417	5%	850.366.179	63%	506.799.238
DALCAHUE	8	10.712.489.005	8%	2.343.744.403	557.218.951	2%	456.017.249	82%	101.201.702
PUQUELDON	3	5.897.666.000	4%	3.436.677.459	441.544.382	2%	19.420.262	4%	422.124.120
QUEILEN	1	3.004.618.000	2%	1.045.300.291	0	0%	0	0%	0
QUELLON	6	3.467.293.476	2%	1.268.038.862	754.527.468	3%	581.739.336	77%	172.788.132
QUEMCHI	5	18.670.164.805	13%	1.190.586.088	1.542.488.509	6%	1.410.763.236	91%	131.725.273
QUINCHAO	5	7.735.651.000	5%	849.750.314	1.214.447.502	5%	1.077.530.484	89%	136.917.018
TOTAL	71	142.436.376.578	100%	40.515.500.672	25.175.969.854	100%	22.414.877.577	89%	2.761.092.277

Detalle Provincia de Palena



		COSTO TOTAL			FNDR 2025				
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2025	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	8	83.613.528.555	84%	22.786.352.025	10.327.302.686	72%	3.438.104.710	33%	6.889.197.976
CHAITEN	4	5.343.879.720	5%	0	690.115.720	5%	393.915.720	57%	296.200.000
FUTALEUFU	7	2.806.174.419	3%	257.729.558	763.291.287	5%	125.326.349	16%	637.964.938
HUALAIHUE	6	3.919.240.000	4%	155.338.121	1.176.818.704	8%	797.010.338	68%	379.808.366
PALENA	4	3.728.439.000	4%	1.653.966.653	1.467.210.347	10%	1.367.776.693	93%	99.433.654
TOTAL	29	99.411.261.694	100%	24.853.386.357	14.424.738.744	100%	6.122.133.810	42%	8.302.604.934

Eficiencia por Provisión

Al 30 Septiembre



		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2025 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2025 - PROGRAMA 02			
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2024	PAGOS 2025	% EJECUCION	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	72.261.701.000	68.081.402.887	57,66%	4.180.298.113	68.081.402.887	38.456.182.093	56,49%	29.625.220.794
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	20.964.772.000	22.033.429.183	18,66%	-1.068.657.183	22.033.429.183	14.208.078.491	64,48%	7.825.350.692
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	9.130.454.000	9.130.454.000	7,73%	0	9.130.454.000	2.932.268.287	32,12%	6.198.185.713
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	844.228.000	444.671.280	0,38%	399.556.720	444.671.280	366.435.924	82,41%	78.235.356
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	14.281.226.000	14.281.226.000	12,10%	0	14.281.226.000	11.741.699.404	82,22%	2.539.526.596
ENERGIZACION	ENERGIZACION	147.392.000	636.902.000	0,54%	-489.510.000	636.902.000	56.559.324	8,88%	580.342.676
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	441.368.000	441.368.000	0,37%	0	441.368.000	0	0,00%	441.368.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	1.827.536.112	1,55%	-1.827.536.112	1.827.536.112	1.648.737.315	90,22%	178.798.797
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	135.316.727	0,11%	-135.316.727	135.316.727	83.216.727	61,50%	52.100.000
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	820.459.811	0,69%	-820.459.811	820.459.811	657.200.428	80,10%	163.259.383
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	238.375.000	0,20%	-238.375.000	238.375.000	0	0,00%	238.375.000
TOTAL	TOTAL	118.071.141.000	118.071.141.000	100%	0	118.071.141.000	70.150.377.993	59%	47.920.763.007

Eficiencia por Subtítulo

Al 30 Septiembre



PROGRAMA 02 - FNDR 2025								
SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2025	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
22 Estudios e investigaciones	2.189.740.000	481.295.999	730.306.000	730.306.000	0,62%	212.730.876	29,13%	517.575.124
24 Transferencias Corrientes	27.207.891.790	4.894.541.000	21.648.159.000	21.648.159.000	18,33%	12.562.624.063	58,03%	9.085.534.937
29 Activos no Financieros	24.296.454.842	5.422.341.939	11.812.526.000	11.812.526.000	10,00%	2.983.517.607	25,26%	8.829.008.393
31 Iniciativas de Inversión	475.068.573.046	159.450.152.679	57.596.861.000	57.596.861.000	48,78%	39.834.594.901	69,16%	17.762.266.099
33 Transferencias de Capital	83.510.563.155	11.304.442.867	26.283.289.000	26.283.289.000	22,26%	14.556.910.546	55,38%	11.726.378.454
	612.273.222.833	181.552.774.484	118.071.141.000	118.071.141.000	100%	70.150.377.993	59%	47.920.763.007

Eficiencia por Sector

Al 30 Septiembre

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2025				
	COSTO	%		COMPROMISO 2025	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2025	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	158.485.029.429	25,88%	39.937.645.158	23.113.543.778	20%	14.366.769.578	62,16%	8.746.774.200
SALUD	125.711.643.984	20,53%	39.663.362.626	17.521.563.488	15%	4.275.300.088	24,40%	13.246.263.400
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	102.496.285.257	16,74%	46.729.158.528	11.756.185.226	10%	9.766.372.717	83,07%	1.989.812.509
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	38.372.666.202	6,27%	19.793.355.993	5.896.682.048	5%	4.546.980.120	77,11%	1.349.701.928
RECURSOS HIDRICOS	38.060.193.011	6,22%	6.872.952.474	4.820.112.903	4%	4.282.109.769	88,84%	538.003.134
MULTISECTORIAL	49.246.158.535	8,04%	6.705.592.989	26.504.167.041	22%	14.966.824.512	56,47%	11.537.342.529
SEGURIDAD PUBLICA	19.866.420.389	3,24%	6.612.006.731	5.880.232.770	5%	3.234.809.052	55,01%	2.645.423.718
DEPORTES	31.128.648.233	5,08%	7.441.718.132	4.330.247.064	4%	3.338.860.979	77,11%	991.386.085
TURISMO Y COMERCIO	7.959.685.913	1,30%	4.115.223.722	1.530.161.000	1%	511.165.686	33,41%	1.018.995.314
ENERGIA	18.021.892.635	2,94%	240.981.999	10.247.270.997	9%	9.438.963.926	92,11%	808.307.071
PESCA	3.400.635.000	0,56%	376.476.000	893.159.000	1%	125.158.091	14,01%	768.000.909
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	9.609.724.245	1,57%	1.722.083.036	2.585.662.685	2%	1.019.699.560	39,44%	1.565.963.125
AGRICULTURA	6.609.549.000	1,08%	1.342.217.096	2.992.153.000	3%	277.363.915	9,27%	2.714.789.085
JUSTICIA	3.304.691.000	0,54%	0	0	0%	0	0,00%	0
TOTAL	612.273.222.833	100%	181.552.774.484	118.071.141.000	100%	70.150.377.993	59%	47.920.763.007

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE OSORNO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	8.031.757.432	6.853.571.165	0	0	0	1.178.186.267	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	455.407.200	455.407.200	2.528.858.684	RE
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.313.257.544	40.525.078	86.742.456	46.217.378	0	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	699.055.000	47.479.757	0	0	0	651.575.243	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	96.812.372	17.479.669	66.934.327	49.454.658	16.253.301	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	94.200.531	94.200.531	160.000.000	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	930.411.000	257.930.691	0	0	0	672.480.309	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	879.226.058	542.453.521	702.738.942	160.285.421	0	RS
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	0	0	3.275.092.000	RS
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	0	0	66.830.000	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	335.327.578	369.227.837	386.901.422	17.673.585	0	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	590.856.677	2.342.513	17.537.323	15.194.810	0	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	345.969.579	13.909.716	19.806.421	5.896.705	0	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	143.613.165	544.698.667	599.669.835	54.971.168	0	RS*
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	346.695.000	35.012.712	296.336.805	311.682.288	15.345.483	0	RS
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	0	644.665.000	644.665.000	0	RS*
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	304.640.000	0	0	304.640.000	304.640.000	0	RS*
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	466.703.000	295.714.117	83.829.443	170.988.883	87.159.440	0	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.748.864.000	2.527.694.676	20.825.000	221.169.324	200.344.324	0	RS
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	5.082.704.000	4.435.576.009	21.961.943	347.127.991	325.166.048	300.000.000	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	571.333.000	510.541.223	0	0	0	60.791.777	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	1.012.364.034	0	101.550.705	101.550.705	13.126.261	RS
TOTAL							39.050.143.828	25.595.187.338	1.953.590.192	4.531.762.648	2.578.172.456	8.923.193.842	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042947	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE CHILLÁN , ENTRE AV. REPÚBLICA Y C.TEMUCO,OSORNO	1.398.169.000	0	0	0	0	1.398.169.000	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40039803	CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA DE BOMBEROS CANCURA, OSORNO	593.692.000	0	0	0	0	593.692.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	429.057.000	0	0	0	0	429.057.000	RS
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40059081	CONSERVACION FERIA PEDRO AGUIRRE CERDA OSORNO	507.089.000	0	0	0	0	507.089.000	RS*
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40062270	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIÓN JUAN DE DIOS GUAJARDO, OSORNO	204.510.000	0	0	0	0	204.510.000	RS*
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40054690	REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA PAMPA SHILLING, OSORNO	43.865.000	0	0	0	0	43.865.000	RS
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							3.176.382.000	0	0	0	0	3.176.382.000	
TOTAL COMUNA DE OSORNO							42.226.525.828	25.595.187.338	1.953.590.192	4.531.762.648	2.578.172.456	12.099.575.842	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE PUERTO OCTAY							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	274.620.000	0	274.620.000	274.620.000	0	0	RS*
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	21.934.080	0	312.939.200	312.939.200	741.276.720	RS
						TOTAL	1.350.770.000	21.934.080	274.620.000	587.559.200	312.939.200	741.276.720	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40051437	CONSERVACION DE 16 CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTORES RURALES, COMUNA DE PUERTO OCTAY	547.958.000	0	0	0	0	547.958.000	RS*
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041628	ADQUISICION AMBULANCIA EMERGENCIA BASICA CECOSF CASCADAS, COMUNA PUERTO OCTAY	98.353.000	0	0	98.353.000	98.353.000	0	RS*
						TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	646.311.000	0	0	98.353.000	98.353.000	547.958.000	
						TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	1.997.081.000	21.934.080	274.620.000	685.912.200	411.292.200	1.289.234.720	
						COMUNA DE PURRANQUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	0	0	15.920.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	227.781.021	474.777.602	835.505.979	360.728.377	300.000.000	RE
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	608.357.627	374.041.710	661.772.373	287.730.663	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	250.000.000	250.000.000	893.244.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.170.070.000	0	262.238.505	358.406.324	96.167.819	811.663.676	RS
						TOTAL	4.991.371.000	857.058.648	1.111.057.817	2.113.484.676	1.002.426.859	2.020.827.676	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40047721	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS ANGELES, PURRANQUE	44.625.000	0	0	0	0	24.625.000	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40033259	REPOSICION CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PURRANQUE	1.316.863.000	0	0	0	0	1.316.863.000	RS
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40049317	HABILITACION SUMINISTRO DE EE.EE SECTOR EL MIRADOR, COMUNA DE PURRANQUE	471.190.000	0	0	0	0	471.190.000	RS
						TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.832.678.000	0	0	0	0	1.812.678.000	
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	6.824.049.000	857.058.648	1.111.057.817	2.113.484.676	1.002.426.859	3.833.505.676	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE PUYEHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	496.685.030	83.335.365	137.202.970	53.867.605	0	RS*
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	38.520.300	196.372.000	157.851.700	0	RS
TOTAL							830.260.000	496.685.030	121.855.665	333.574.970	211.719.305	0	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	0	0	8.400.193.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							8.400.193.000	0	0	0	0	8.400.193.000	
TOTAL COMUNA DE PUYEHUE							9.230.453.000	496.685.030	121.855.665	333.574.970	211.719.305	8.400.193.000	
						COMUNA DE RIO NEGRO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.108.970.437	649.038.348	366.423.838	459.932.089	93.508.251	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	873.314.083	55.033.496	140.369.917	85.336.421	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.214.537.665	261.216.964	752.772.106	953.320.701	200.548.595	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	13.320.000	7.992.000	590.524.000	582.532.000	500.000.000	RS
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	356.286.000	356.286.000	0	0	0	0	RS*
TOTAL							4.797.322.102	2.153.175.395	1.182.221.440	2.144.146.707	961.925.267	500.000.000	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052927	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR MILLACURA, COMUNA DE RIO NEGRO	485.593.000	0	0	0	0	485.593.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032117	CONSERVACION CAMINOS VECINALES DE ÑANCUÁN CHANCHAN, SAN FLORENTINO Y QUISQUELELFUN, RÍO NEGRO	1.022.266.000	0	0	307.528.604	307.528.604	714.737.396	RS*
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	30097977	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA RIO NEGRO	805.792.000	0	0	0	0	805.792.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.313.651.000	0	0	307.528.604	307.528.604	2.006.122.396	
TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO							7.110.973.102	2.153.175.395	1.182.221.440	2.451.675.311	1.269.453.871	2.506.122.396	
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.065.959.000	26.644.784	993.624.504	1.127.519.506	133.895.002	3.911.794.710	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.211.618.000	1.081.343.139	110.763.296	130.274.861	19.511.565	0	RE
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	0	0	511.498.000	RS
TOTAL							6.789.075.000	1.107.987.923	1.104.387.800	1.257.794.367	153.406.567	4.423.292.710	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40066529	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD SAN JUAN DE LA COSTA	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	
TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							7.039.075.000	1.107.987.923	1.104.387.800	1.257.794.367	153.406.567	4.673.292.710	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE SAN PABLO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	21.991.200	0	325.597.175	325.597.175	738.158.625	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	0	30.860.034	30.860.034	0	21.026.966	RS
						TOTAL	1.137.634.000	21.991.200	30.860.034	356.457.209	325.597.175	759.185.591	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40057739	ADQUISICION ADQUISICIÓN CAMION MULTIPROPOSITO PARA RSD, PODAS Y LUMINARIAS, SAN PABLO	481.273.000	0	0	325.986.665	325.986.665	155.286.335	RS*
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	126.701.000	0	0	0	0	126.701.000	RS*
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	274.086.000	0	0	0	0	274.086.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	882.060.000	0	0	325.986.665	325.986.665	556.073.335	
						TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	2.019.694.000	21.991.200	30.860.034	682.443.874	651.583.840	1.315.258.926	
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	0	0	2.905.590.000	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	4.121.575.186	0	0	0	2.015.622.814	CF
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	114.230.580	115.500.974	173.939.420	58.438.446	0	RS
22	11	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	156.502.624	77.497.376	78.331.376	834.000	0	RS*
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.066.954.000	605.691.102	307.638.800	395.468.094	87.829.294	65.794.804	RS*
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	544.703.000	213.703.000	62.439.090	331.000.000	268.560.910	0	RS**
						TOTAL	11.222.193.000	5.256.446.492	563.076.240	978.738.890	415.662.650	4.987.007.618	
						TOTAL PROVINCIALES	11.222.193.000	5.256.446.492	563.076.240	978.738.890	415.662.650	4.987.007.618	
						TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	87.670.043.930	35.510.466.106	6.341.669.188	13.035.386.936	6.693.717.748	39.104.190.888	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE PUERTO MONTT							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	7.149.625.971	1.406.917.766	1.841.863.029	434.945.263	200.000.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	4.060.161.100	3.306.635.616	639.720.759	753.525.484	113.804.725	0	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	81.500.000	81.500.000	93.510.000	12.010.000	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	673.218.000	15.250.000	0	55.000.000	55.000.000	602.968.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	673.217.000	15.250.000	0	59.610.000	59.610.000	598.357.000	RS
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	569.701.000	398.460.976	0	146.473.024	146.473.024	24.767.000	RS*
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.362.125.000	883.195.617	0	283.068.383	283.068.383	195.861.000	RS*
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.674.762.581	8.456.217.443	16.167.951	218.545.138	202.377.187	0	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.484.881.860	0	1.493.363.293	1.493.363.293	0	991.518.567	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	0	0	2.791.798.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	996.585.000	0	0	0	0	996.585.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.305.404.000	0	0	0	0	1.305.404.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	0	0	977.955.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.934.861.516	0	990.182.307	1.017.260.138	27.077.831	917.601.378	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	0	0	246.329.000	RS
TOTAL							36.117.498.057	20.306.135.623	4.627.852.076	5.962.218.489	1.334.366.413	9.849.143.945	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30034826	REPOSICION POSTA ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.305.092.000	0	0	0	0	1.305.092.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	1.263.261.000	0	0	0	0	1.263.261.000	RS
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40067945	MEJORAMIENTO CALLE CALETERA AV. PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	898.600.000	0	0	0	0	898.600.000	RS
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40059380	HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR PELLINES DEL SALTO, PUERTO MONTT	276.082.000	0	0	0	0	276.082.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.743.035.000	0	0	0	0	3.743.035.000	
TOTAL COMUNA DE P. MONTT							39.860.533.057	20.306.135.623	4.627.852.076	5.962.218.489	1.334.366.413	13.592.178.945	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE CALBUCO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO, CALBUCO	16.168.723.293	12.378.872.293	1.812.937.266	2.083.616.634	270.679.368	1.706.234.366	RS
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	0	0	577.874.105	RS
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	93.500.000	0	16.500.000	16.500.000	0	RS*
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	51.759.840	860.438.442	902.582.160	42.143.718	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.297.936.000	0	0	54.862.000	54.862.000	1.243.074.000	RS
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	0	0	984.384.000	RS*
						TOTAL	21.130.011.839	13.560.884.574	2.673.375.708	3.057.560.794	384.185.086	4.511.566.471	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40055239	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES VILLARROEL Y C. CONDELL, CALBUCO	2.800.863.000	0	0	0	0	2.800.863.000	RS
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40060299	REPOSICION EQUIPO MAMOGRAFO HOSPITAL CALBUCO	368.927.000	0	0	368.927.000	368.927.000	0	RS*
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40055163	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA PULUQUI	1.221.535.000	0	0	0	0	1.221.535.000	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.391.325.000	0	0	368.927.000	368.927.000	4.022.398.000	
						TOTAL COMUNA DE CALBUCO	25.521.336.839	13.560.884.574	2.673.375.708	3.426.487.794	753.112.086	8.533.964.471	
						COMUNA DE COCHAMO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PEDZE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	31.157.800	31.157.800	30.000.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	35.438.512	35.438.512	38.273.720	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	480.875.535	0	0	0	0	480.875.535	RS*
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	0	0	2.847.592.000	RS
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	103.142.400	0	185.996.580	185.996.580	0	RS*
						TOTAL	3.869.406.515	220.072.368	0	252.592.892	252.592.892	3.396.741.255	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	714.000	16.967.500	149.454.000	132.486.500	1.399.286.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	16.074.000	102.115.000	86.041.000	1.460.998.000	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ	1.053.383.000	0	0	0	0	1.053.383.000	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.165.950.000	714.000	33.041.500	251.569.000	218.527.500	3.913.667.000	
						TOTAL COMUNA DE COCHAMO	8.035.356.515	220.786.368	33.041.500	504.161.892	471.120.392	7.310.408.255	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE FRESIA							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	0	0	131.524.386	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	66.023.294	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.458.555.698	0	399.630.837	601.297.904	201.667.067	857.257.794	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	926.571.733	987.774.000	61.202.267	0	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	450.067.163	254.071.267	350.444.837	96.373.570	0	RS*
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	99.925.361	99.925.361	551.046.639	RS*
						TOTAL	4.926.922.763	1.281.628.548	1.580.273.837	2.039.442.102	459.168.265	1.605.852.113	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40036932	ADQUISICION AMBULANCIA PARA CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA	143.990.000	0	143.990.000	143.990.000	0	0	RS*
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30079814	ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMUNA DE FRESIA.	118.121.000	0	89.696.327	118.121.000	28.424.673	0	RS*
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40060779	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR BOTIJA, COMUNA DE FRESIA	309.810.000	0	0	297.321.000	297.321.000	12.489.000	RS
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40060003	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR AGUA BUENA, COMUNA DE FRESIA	351.666.000	0	0	0	0	351.666.000	RS
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40060652	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PASO EL LEON, COMUNA DE FRESIA	103.798.000	0	0	0	0	103.798.000	RS
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40059227	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLICO ALTO, COMUNA DE FRESIA	201.396.000	0	0	0	0	201.396.000	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.228.781.000	0	233.686.327	559.432.000	325.745.673	669.349.000	
						TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.155.703.763	1.281.628.548	1.813.960.164	2.598.874.102	784.913.938	2.275.201.113	
						COMUNA DE FRUTILLAR							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.628.052.844	6.608.656.815	0	19.396.029	19.396.029	0	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	362.566.601	0	0	0	87.005.399	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	516.522.280	379.211.908	385.397.720	6.185.812	0	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	0	0	59.165.826	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	72.000.000	108.000.000	108.000.000	0	220.000.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	1.222.519.000	24.954.300	0	0	0	1.197.564.700	RS
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40031422	REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA DE FRUTILLAR	238.375.000	0	0	238.375.000	238.375.000	0	RS*
						TOTAL	10.165.396.442	7.850.491.768	487.211.908	751.168.749	263.956.841	1.563.735.925	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025466	MEJORAMIENTO AVENIDA ARTURO ALESSANDRI NORTE, COMUNA DE FRUTILLAR	4.033.866.000	0	1.521.177	96.773.200	95.252.023	3.937.092.800	RS
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40069547	REPOSICION VEHÍCULOS MUNICIPALES COMUNA DE FRUTILLAR	80.165.000	0	0	0	0	80.165.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.114.031.000	0	1.521.177	96.773.200	95.252.023	4.017.257.800	
						TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	14.279.427.442	7.850.491.768	488.733.085	847.941.949	359.208.864	5.580.993.725	
						COMUNA DE LLANQUIHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	436.621.000	128.969	180.853.448	206.309.345	25.455.897	230.182.686	RS
						TOTAL	436.621.000	128.969	180.853.448	206.309.345	25.455.897	230.182.686	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054960	ADQUISICION EQUIPO MAMOGRAFO HOSPITAL DE LLANQUIHUE	401.224.000	0	0	0	0	401.224.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	401.224.000	0	0	0	0	401.224.000	
						TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	837.845.000	128.969	180.853.448	206.309.345	25.455.897	631.406.686	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE LOS MUERMOS							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	106.650.000	91.234.475	0	0	0	15.415.525	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.546.425.858	556.757.937	0	0	0	989.667.921	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.109.211.025	83.216.727	85.316.727	2.100.000	2.545.376	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	298.602.441	680.013.925	697.682.412	17.668.487	0	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	48.099.200	63.124.000	15.024.800	0	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	100.000.000	741.659.015	742.257.000	597.985	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS
TOTAL							6.076.075.839	2.155.805.878	1.552.988.867	1.588.380.139	35.391.272	2.331.889.822	
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS							6.076.075.839	2.155.805.878	1.552.988.867	1.588.380.139	35.391.272	2.331.889.822	
						COMUNA DE MAULLIN							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	62.456.000	0	0	0	0	62.456.000	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	311.252.939	311.252.939	957.543.742	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	0	0	0	929.674.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.166.683.000	0	3.034.999	337.196.970	334.161.971	829.486.030	RS
TOTAL							4.399.473.681	0	3.034.999	648.449.909	645.414.910	3.751.023.772	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40009537	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL EMPALME, MAULLIN	252.566.000	0	252.566.000	252.566.000	0	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30134574	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	1.165.130.000	0	0	0	0	1.165.130.000	RS
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	366.003.000	0	0	366.003.000	366.003.000	0	RS*
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	286.015.000	0	0	286.015.000	286.015.000	0	RS*
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	964.982.000	0	0	0	0	964.982.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.034.696.000	0	252.566.000	904.584.000	652.018.000	2.130.112.000	
TOTAL COMUNA DE MAULLIN							7.434.169.681	0	255.600.999	1.553.033.909	1.297.432.910	5.881.135.772	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE PUERTO VARAS							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.391.441.000	1.076.381.867	0	0	0	4.315.059.133	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.192.357.990	2.055.584.476	32.393.515	136.773.514	104.379.999	0	RS
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	70.000.000	50.000.000	50.000.000	0	80.000.000	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.185.683.550	9.094.921	631.175.517	634.412.059	3.236.542	542.176.570	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	139.696.328	788.298.873	924.953.952	136.655.079	0	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	422.452.924	29.078.853	70.479.853	41.401.000	0	RS*
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	56.559.324	339.581.000	283.021.676	530.513.000	RS
TOTAL							11.397.159.597	3.773.210.516	1.587.506.082	2.156.200.378	568.694.296	5.467.748.703	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	267.988	267.588	267.588	0	286.210.424	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	0	0	1.331.403.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	995.184.000	0	671.529.127	701.600.134	30.071.007	293.583.866	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.613.333.000	267.988	671.796.715	701.867.722	30.071.007	1.911.197.290	
TOTAL COMUNA DE P.VARAS							14.010.492.597	3.773.478.504	2.259.302.797	2.858.068.100	598.765.303	7.378.945.993	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.235.178.791	0	1.000.000	1.000.000	125.352.209	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	124.859.073	207.627.404	82.768.331	0	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	6.278.871.000	191.791.026	0	0	0	6.087.079.974	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.184.812.000	3.510.187.737	238.480.327	674.624.263	436.143.936	0	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.872.840.798	0	5.500.000	5.500.000	0	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	119.176.269	0	0	0	143.084.731	RS
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	151.217.000	604.863.790	RS**
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	1.182.946.698	133.062.612	1.025.771.302	892.708.690	0	RS*
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	648.549.793	0	648.549.793	648.549.793	0	0	RS***
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***
TOTAL							24.610.060.420	14.885.389.954	1.144.951.805	2.764.289.762	1.619.337.957	6.960.380.704	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	662.322.000	0	0	0	0	662.322.000	RS*
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	33.618.000	0	0	0	0	33.618.000	RS*
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40067969	CONSTRUCCION ETAPA 3, RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA	3.313.315.000	0	0	0	0	3.313.315.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							4.009.255.000	0	0	0	0	4.009.255.000	
TOTAL PROVINCIALES							28.619.315.420	14.885.389.954	1.144.951.805	2.764.289.762	1.619.337.957	10.969.635.704	
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE							150.830.256.153	64.034.730.186	15.030.660.449	22.309.765.481	7.279.105.032	64.485.760.486	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE ANCUD							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.529.030.843	0	0	0	499.139.157	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	96.278.062	440.139.440	440.139.440	0	831.585.498	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	1.333.461.000	448.949.293	0	0	0	884.511.707	RS
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	311.458.000	0	0	222.510.000	222.510.000	88.948.000	RS*
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.222.405.000	0	998.858.383	998.858.497	114	223.546.503	RS
TOTAL							6.263.497.000	2.074.258.198	1.438.997.823	1.661.507.937	222.510.114	2.527.730.865	

						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014527	MEJORAMIENTO CALLE BAQUEDANO Y COSTANERA NORTE, COMUNA DE ANCUD	669.290.000	0	0	0	0	669.290.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30093353	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA DE SALUD RURAL SECTOR NAL, COMUNA DE ANCUD	1.459.839.000	0	0	0	0	1.459.839.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40057328	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR CARACOLES, ANCUD	238.808.000	0	0	0	0	238.808.000	RS
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40041526	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ANCUD	818.371.000	0	0	0	0	818.371.000	RS
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40045547	CONSTRUCCION CUARTEL 2A COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	103.460.000	0	0	0	0	103.460.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.289.768.000	0	0	0	0	3.289.768.000	

TOTAL COMUNA DE ANCUD	9.553.265.000	2.074.258.198	1.438.997.823	1.661.507.937	222.510.114	5.817.498.865
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

						COMUNA DE CASTRO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	815.003.000	444.783.294	0	0	0	370.219.706	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.530	92.144.278	10.238.252	10.238.252	0	0	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	56.029	4.652.630.940	4.652.630.940	0	10.532.757.031	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	2.394.442.000	0	0	0	0	2.394.442.000	RS
TOTAL							18.497.271.530	536.983.601	4.662.869.192	4.662.869.192	0	13.297.418.737	

						INICIATIVAS NUEVAS							
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	128.911.000	0	0	128.911.000	128.911.000	0	RS*
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	600.874.000	0	0	59.883.000	59.883.000	550.874.000	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							729.785.000	0	0	188.794.000	188.794.000	550.874.000	

TOTAL COMUNA DE CASTRO	19.227.056.530	536.983.601	4.662.869.192	4.851.663.192	188.794.000	13.848.292.737
------------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE CHONCHI							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	1.146.455.958	13.158.794	23.765.042	10.606.248	0	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	92.764.367	56.313.682	0	36.450.685	36.450.685	0	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	719.208.346	1.659.487.935	1.659.487.935	0	2.408.727.719	RS
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	RS*
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	489.402.000	0	0	0	0	489.402.000	RS*
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	0	0	0	0	3.727.724.000	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	477.016.000	0	0	0	0	477.016.000	RS
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	211.848.635	0	211.848.635	211.848.635	0	0	RS*
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	151.246.535	88.572.713	62.673.822	62.673.822	0	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	0	0	1.290.291.000	RS
						TOTAL	12.517.937.537	2.120.550.699	1.957.169.186	2.004.226.119	47.056.933	8.393.160.719	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052247	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE CHONCHI	555.683.000	0	0	0	0	444.546.400	RS
29	03	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40044681	REPOSICION DE BUSES ESCUELA ESPECIAL AMANECER, COMUNA DE CHONCHI	303.444.000	0	0	15.985.374	15.985.374	200.000.000	RS*
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40010316	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA HUILLINCO, COMUNA DE CHONCHI	603.419.000	0	0	0	0	603.419.000	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040291	CONSERVACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE CHONCHI	326.471.000	0	0	0	0	326.471.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.789.017.000	0	0	15.985.374	15.985.374	1.574.436.400	
						TOTAL COMUNA DE CHONCHI	14.306.954.537	2.120.550.699	1.957.169.186	2.020.211.493	63.042.307	9.967.597.119	
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.748.130.000	3.084.151.010	659.982.151	663.978.990	3.996.839	0	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	1.017.657.055	1.014.228.480	3.428.575	3.428.575	0	0	RS*
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	63.434.666	63.540.933	106.267	97.926.067	RS
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	566.165	37.253.459	39.194.591	1.941.132	355.190.244	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ	9.476.208.000	9.011.412.000	86.267.328	86.267.328	0	378.528.672	RS
						TOTAL	14.798.413.055	13.110.357.655	850.366.179	856.410.417	6.044.238	831.644.983	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40064171	REPOSICION VEHICULO RECICLAJE MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	61.669.000	0	0	61.669.000	61.669.000	0	RS*
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	173.145.000	0	0	173.145.000	173.145.000	0	RS*
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	265.941.000	0	0	265.941.000	265.941.000	0	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063532	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES, CURACO DE VELEZ	498.111.000	0	0	0	0	498.111.000	RS*
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40051701	REPOSICION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA BOMBEROS DE HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ	115.920.000	0	0	0	0	115.920.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056255	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	790.967.000	0	0	0	0	790.967.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.905.753.000	0	0	500.755.000	500.755.000	1.404.998.000	
						TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	16.704.166.055	13.110.357.655	850.366.179	1.357.165.417	506.799.238	2.236.642.983	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE DALCAHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.239.772.005	1.239.772.005	0	0	0	0	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.395.245.000	743.754.582	228.545.268	228.545.268	0	422.945.150	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	352.117.816	76.456.683	76.456.683	0	117.321.501	RS*
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	0	8.950.000	8.950.000	0	2.961.083.000	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	8.100.000	8.100.000	33.784.000	25.684.000	0	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	0	133.965.298	209.483.000	75.517.702	940.000.000	RS*
						TOTAL	7.342.313.005	2.343.744.403	456.017.249	557.218.951	101.201.702	4.441.349.651	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40061640	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CALEN, COMUNA DE DALCAHUE	1.284.197.000	0	0	0	0	1.284.197.000	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40054303	AMPLIACION REDES DE A. POTABLE, ALCANT Y CONSTR. MURO DE CONTENC. AVDA. MOCOPULLI, DALCAHUE	2.085.979.000	0	0	0	0	2.085.979.000	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.370.176.000	0	0	0	0	3.370.176.000	
						TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	10.712.489.005	2.343.744.403	456.017.249	557.218.951	101.201.702	7.811.525.651	
						COMUNA DE PUQUELDON							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	17.100.000	55.000.000	37.900.000	552.261.159	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	1.574.814.000	6.480.393	2.320.262	284.707.607	282.387.345	1.283.626.000	RS
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	717.773.000	593.250.434	0	24.286.566	24.286.566	100.236.000	RS*
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	305.443.000	144.571.791	0	77.550.209	77.550.209	83.321.000	RS*
						TOTAL	5.897.666.000	3.436.677.459	19.420.262	441.544.382	422.124.120	2.019.444.159	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	601.053.000	0	0	109.179.000	109.179.000	491.874.000	RS*
29	05	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	361.859.000	0	0	361.859.000	361.859.000	0	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	962.912.000	0	0	471.038.000	471.038.000	491.874.000	
						TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	6.860.578.000	3.436.677.459	19.420.262	912.582.382	893.162.120	2.511.318.159	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE QUEILEN							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	3.004.618.000	1.045.300.291	0	0	0	1.959.317.709	RS
						TOTAL	3.004.618.000	1.045.300.291	0	0	0	1.959.317.709	
						TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.004.618.000	1.045.300.291	0	0	0	1.959.317.709	
						COMUNA DE QUELLON							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	776.435.000	181.604.142	493.592.226	594.830.858	101.238.632	0	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	0	0	10.350.000	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	0	0	23.060.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.074.276.330	1.021.253.520	53.022.810	53.022.810	0	0	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	0	0	1.411.317.146	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	23.416.200	35.124.300	106.673.800	71.549.500	0	RS
						TOTAL	3.467.293.476	1.268.038.862	581.739.336	754.527.468	172.788.132	1.444.727.146	
						TOTAL COMUNA DE QUELLON	3.467.293.476	1.268.038.862	581.739.336	754.527.468	172.788.132	1.444.727.146	
						COMUNA DE QUEMCHI							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*
33	03-100	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	50.000.000	50.000.000	13.709.596.000	RS
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	0	0	597.792.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	579.097.727	0	81.725.273	81.725.273	0	RS*
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.652.208.000	0	1.410.763.236	1.410.763.236	0	241.444.764	RS
						TOTAL	17.695.809.805	1.190.586.088	1.410.763.236	1.542.488.509	131.725.273	14.962.735.208	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063487	CONSERVACION DE CAMINOS ISLAS TAUCULON, AULIN Y BUTACHAUQUES, COMUNA DE QUEMCHI.	974.355.000	0	0	0	0	331.202.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	974.355.000	0	0	0	0	331.202.000	
						TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	18.670.164.805	1.190.586.088	1.410.763.236	1.542.488.509	131.725.273	15.293.937.208	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE QUINCHAO							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.310.834.000	849.750.314	371.314.315	401.083.686	29.769.371	60.000.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.330.536.000	0	0	53.641.508	53.641.508	1.276.894.492	RS
						TOTAL	2.641.370.000	849.750.314	371.314.315	454.725.194	83.410.879	1.336.894.492	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	706.216.169	759.722.308	53.506.139	1.540.516.692	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	0	0	441.291.000	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40067325	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO	2.352.751.000	0	0	0	0	2.352.751.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.094.281.000	0	706.216.169	759.722.308	53.506.139	4.334.558.692	
						TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	7.735.651.000	849.750.314	1.077.530.484	1.214.447.502	136.917.018	5.671.453.184	
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	3.477.985.000	527.771.961	0	0	0	2.950.213.039	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.955.228.139	0	55.721.295	55.721.295	10.000.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.707.826.752	0	0	0	3.394.498.248	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.815.731.250	2.590.865.991	2.590.865.991	0	4.262.658.759	RS
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.048.403.000	0	559.298.027	1.048.403.000	489.104.973	0	RS*
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	305.704.084	0	305.704.084	305.704.084	0	0	RS*
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	6.484.338.652	0	6.406.855.958	6.484.338.652	77.482.694	0	RS***
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	583.995.000	478.195.000	0	105.800.000	105.800.000	0	RS**
24	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA B) GLOSA 03 GESTIÓN HÍDRICA (Subtítulo 24.03.014)	176.220.000	54.500.000	49.531.820	121.720.000	72.188.180	0	RS***
						TOTAL	33.869.176.170	12.539.253.102	9.912.255.880	10.712.553.022	800.297.142	10.617.370.046	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40062497	DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO INFRAEST. PORTUARIA 04 SECT. REZAGO, QUEMCHI-QUINCHAO Y QUELLON	194.763.000	0	47.748.750	62.641.981	14.893.231	132.121.019	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	194.763.000	0	47.748.750	62.641.981	14.893.231	132.121.019	
						TOTAL PROVINCIALES	34.063.939.170	12.539.253.102	9.960.004.630	10.775.195.003	815.190.373	10.749.491.065	
						TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	144.306.175.578	40.515.500.672	22.414.877.577	25.647.007.854	3.232.130.277	77.311.801.826	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE CHAITEN							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	25.800.000	150.000.000	124.200.000	3.795.766.000	RS
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40053350	REPOSICION 4 CAMIONETAS Y UN MINIBUS Y ADQUISICION 3 CAMIONETAS, COMUNA DE CHAITEN	368.115.720	0	368.115.720	368.115.720	0	0	RS*
						TOTAL	4.313.881.720	0	393.915.720	518.115.720	124.200.000	3.795.766.000	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40047728	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE CHAITÉN	857.998.000	0	0	0	0	857.998.000	RS
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058788	REPOSICION AMBULANCIAS COMUNA DE CHAITEN	172.000.000	0	0	172.000.000	172.000.000	0	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.029.998.000	0	0	172.000.000	172.000.000	857.998.000	
						TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.343.879.720	0	393.915.720	690.115.720	296.200.000	4.653.764.000	
						COMUNA DE FUTALEUFU							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	75.660.000	0	50.398.000	50.398.000	0	RS*
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O´HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	40.466.860	0	24.722.140	24.722.140	0	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	41.602.698	2.994.349	290.186.547	287.192.198	980.798.755	RS
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053669	REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CTI COMUNA DE FUTALEUFÚ	167.604.419	0	122.332.000	167.604.000	45.272.000	419	RS*
						TOTAL	1.789.599.419	257.729.558	125.326.349	551.070.687	425.744.338	980.799.174	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40024235	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA DE FUTALEUFÚ	323.568.000	0	0	64.713.600	64.713.600	258.854.400	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056911	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES COMUNA DE FUTALEUFU	693.007.000	0	0	147.507.000	147.507.000	245.500.000	RS*
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.016.575.000	0	0	212.220.600	212.220.600	504.354.400	
						TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	2.806.174.419	257.729.558	125.326.349	763.291.287	637.964.938	1.485.153.574	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						COMUNA DE HUALAIHUE							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	13.233.960	0	21.240.000	21.240.000	59.726.040	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	18.350.000	43.550.000	43.550.000	0	5.440.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	43.215.060	54.771.392	11.556.332	200.024.608	RS
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.859.148.000	123.754.161	710.245.278	990.917.312	280.672.034	744.476.527	RS
						TOTAL	2.275.484.000	155.338.121	797.010.338	1.110.478.704	313.468.366	1.009.667.175	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	30386191	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE HORNOPIREN, HUALAIHUE	81.700.000	0	0	16.340.000	16.340.000	65.360.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30397627	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA, COMUNA DE HUALAIHUE	1.446.756.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.396.756.000	RS
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40053338	CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS RIO NEGRO HORNOPIREN, HUALAIHUE	115.300.000	0	0	0	0	115.300.000	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.643.756.000	0	0	66.340.000	66.340.000	1.577.416.000	
						TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	3.919.240.000	155.338.121	797.010.338	1.176.818.704	379.808.366	2.587.083.175	
						COMUNA DE PALENA							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.398.659.654	2.212.032	51.089.346	48.877.314	0	RS
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	50.000.000	50.000.000	65.675.000	RS*
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	240.981.999	1.365.564.661	1.366.121.001	556.340	0	RS
						TOTAL	3.186.852.000	1.653.966.653	1.367.776.693	1.467.210.347	99.433.654	65.675.000	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40072992	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACION, COLEGIO ROBERTO WHITE GESELL DE PALENA	541.587.000	0	0	0	0	541.587.000	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	541.587.000	0	0	0	0	541.587.000	
						TOTAL COMUNA DE PALENA	3.728.439.000	1.653.966.653	1.367.776.693	1.467.210.347	99.433.654	607.262.000	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						PROVINCIALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	16.612.042.000	624.428.871	2.899.652.821	3.829.648.854	929.996.033	12.157.964.275	RS
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	32.787.705.000	8.752.521.057	0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.035.183.943	RS
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.364.388.997	4.603.434	1.000.000.000	995.396.566	17.081.164.003	RS
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	497.019.555	0	497.019.555	497.019.555	0	0	RS***
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	0	0	29.599.000	S/R
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	81.842.000	45.013.100	36.828.900	36.828.900	0	0	RS
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	5.000.000	5.000.000	737.950.000	RS
TOTAL							82.196.710.555	22.786.352.025	3.438.104.710	9.368.497.309	5.930.392.599	50.041.861.221	
						INICIATIVAS NUEVAS							
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063704	REPOSICION EQUIPOS RAYOS X OSTEOPULMONARES HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	769.914.000	0	0	311.901.377	311.901.377	358.012.623	RS*
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063754	REPOSICION 4 AMBULANCIAS COMUNAS DE PALENA, FUTALEUFU, CHAITEN Y HUALAIHUE	28.532.000	0	0	28.532.000	28.532.000	0	RS*
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063754	REPOSICION 4 AMBULANCIAS COMUNAS DE PALENA, FUTALEUFU, CHAITEN Y HUALAIHUE	618.372.000	0	0	618.372.000	618.372.000	0	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.416.818.000	0	0	958.805.377	958.805.377	358.012.623	
TOTAL PROVINCIALES							83.613.528.555	22.786.352.025	3.438.104.710	10.327.302.686	6.889.197.976	50.399.873.844	
TOTAL PROVINCIA DE PALENA							99.411.261.694	24.853.386.357	6.122.133.810	14.424.738.744	8.302.604.934	59.733.136.593	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						REGIONALES							
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO							
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	255.410.840	255.410.840	420.547.160	RS*
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.428.974.263	1.154.796.921	274.177.342	274.177.342	0	0	RS*
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	31.308.375	125.233.500	188.575.625	63.342.125	0	RS*
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40052706	ADQUISICION VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS DRONES Y ACCESORIOS	193.034.060	0	193.034.060	193.034.060	0	0	RS*
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.199.954.000	0	2.229.747.847	8.199.954.000	5.970.206.153	0	RS***
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	206.852.000	0	0	206.852.000	206.852.000	0	RS***
24	03-011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	Aplicación letra c) glosa 03 Residuos Sólidos Domiciliarios	380.000.000	0	350.000.000	380.000.000	30.000.000	0	RS***
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	14.281.226.000	0	11.741.699.404	14.281.226.000	2.539.526.596	0	RS**
						TOTAL	25.999.826.323	1.186.105.296	14.913.892.153	23.984.229.867	9.070.337.714	829.491.160	
						INICIATIVAS NUEVAS							
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	0	193.453.674	193.453.674	0	1.429.188.326	RS
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40032367	DIAGNOSTICO DE COND. NATURALES VARIOS SECTORES ZONAS DE REZAGO NORTE, REGION DE LOS LAGOS	1.512.982.000	0	0	0	0	1.512.982.000	RS
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	158.500.999	158.500.999	99.999.001	RS*
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	95.000.000	95.000.000	158.000.000	RS*
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	185.252.500	185.252.500	385.252.500	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	84.636.000	84.636.000	11.140.000.000	RS
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	166.529.945	166.529.945	366.530.055	RS*
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40046973	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVA ZONA PRIMARIA EXTRAPUERTO EMPORMONTT, PUERTO MONTT	3.614.118.000	0	0	54.118.000	54.118.000	3.560.000.000	RS
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	142.300.000	0	0	142.300.000	142.300.000	0	RS*
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	102.567.000	0	0	102.567.000	102.567.000	0	RS*
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40055362	ANALISIS PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LOS LAGOS	323.520.000	0	0	78.000.000	78.000.000	245.520.000	RS*
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40056926	ADQUISICION EQUIPAMIENTO OFTALMOLOGIA, PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA	88.845.000	0	0	88.845.000	88.845.000	0	RS*
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40056926	ADQUISICION EQUIPAMIENTO OFTALMOLOGIA, PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA	113.358.000	0	0	53.358.000	53.358.000	60.000.000	RS*
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064760	CONSERVACION POLIDEPORTIVO ARENA PUERTO MONTT	1.803.653.000	0	0	300.000.000	300.000.000	1.503.653.000	S/R
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40036420	HABILITACION Centro Cardioquirúrgico para Macro Zona Sur Austral	5.616.373.000	0	0	300.000.000	300.000.000	5.316.373.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40056853	CONSTRUCCION CAMPUS SALUD, INGENIERÍA Y ARTES, ULAGOS, PUERTO MONTT	6.641.168.000	0	0	200.000.000	200.000.000	6.441.168.000	RS
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	43.680.000	43.680.000	6.441.168.001	RS
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	39.905.739.000	0	193.453.674	2.246.241.118	2.052.787.444	38.659.833.883	
						TOTAL REGIONAL	65.905.565.323	1.186.105.296	15.107.345.827	26.230.470.985	11.123.125.158	39.489.325.043	

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025	
						PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD								
24	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	3.200.000.000	0	2.318.480.000	3.200.000.000	881.520.000	0	RS***	
33	RTE A BO	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40065863	TRANSFERENCIA A JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE	2.800.000.000	0	1.176.188.000	2.800.000.000	1.623.812.000	0	RS**	
33		03	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	718.102.000	0	0	441.368.000	441.368.000	276.734.000	RS**
						TOTAL	6.718.102.000	0	3.494.668.000	6.441.368.000	2.946.700.000	276.734.000		
						TOTAL	6.718.102.000	0	3.494.668.000	6.441.368.000	2.946.700.000	276.734.000		
						PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS								
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	40.000.000	40.000.000	124.123.740	RS**	
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	20.000.000	20.000.000	70.367.052	RS**	
						TOTAL PATAGONIA VERDE	740.000.000	485.509.208	0	60.000.000	60.000.000	194.490.792		
						PROGRAMAS DE ARRASTRE								
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	200.000.000	200.000.000	650.811.191	RS**	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.852	513.268.852	0	186.532.000	186.532.000	0	RS**	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.059	599.944.059	0	24.885.000	24.885.000	0	RS**	
33	03	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.770.022	1.989.811.022	0	222.959.000	222.959.000	0	RS**	
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	100.000.000	100.000.000	109.477.000	RS**	
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	274.427.603	1.039.985.000	765.557.397	150.783.960	RS**	
33	03	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	121.235.450	1.845.147.000	1.723.911.550	11.433.160.193	RS**	
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	539.559.220	341.018.220	198.541.000	198.541.000	0	0	RS**	
33	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	375.000.000	375.000.000	0	0	RS**	
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	199.681.000	30.559.000	30.559.000	0	0	RS**	
33	01	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	57.584.000	57.584.000	0	0	RS**	
33	01	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	413.117.000	413.117.000	0	0	RS**	
33	01	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	125.158.091	125.159.000	909	0	RS**	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.002	358.714.002	0	21.533.000	21.533.000	0	RS**	
						TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE	27.995.690.155	10.810.456.811	1.595.622.144	4.841.001.000	3.245.378.856	12.344.232.344		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2025
						PROGRAMAS ARRASTRE							
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.214.000	486.571.000	0	121.643.000	121.643.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	146.000.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	69.422.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS COSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	105.171.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	RS**
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	454.800.000	0	RS**
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.000	2.927.848	446.614	474.918.000	474.471.386	701.703.152	RS**
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.000.000	600.000	453.863	614.300.000	613.846.137	635.100.000	RS**
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.000.000	1.000.000	1.500.806	350.500.000	348.999.194	348.500.000	RS**
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	2.949.000	535.029	452.450.000	451.914.971	244.601.000	RS**
33	03	PESCA	LIBRE	INDESPA	40063557	TRANSFERENCIA PROGRAMA TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.900.000.000	1.000.000	0	768.000.000	768.000.000	2.131.000.000	RS**
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40064817	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.750.000.000	0	40.464.686	448.464.000	407.999.314	1.301.536.000	RS**

PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2025	COMPROMISO 2025	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO
FAR	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	91.000.000	91.000.000	7.691.000.000
LIBRE	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	0	0	173.700.000	173.700.000	1.000.700.000
LIBRE	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.000	0	0	209.300.000	209.300.000	700.000
LIBRE	CORFO	40067360	CAPACITACION CENTRO TECNOLOGICO PARA LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGION DE LOS LAGOS	4.850.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	4.840.000.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE COCHAMO	40071749	TRANSFERENCIA CAPACIDADES PARA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA-SUSTENTABLE, SECTOR RIO PUELO	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY	40072652	CAPACITACION DESTINO OCTAY 2025; VIVE, SIENTE, DESCUBRE	60.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	12.000.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	40072663	TRANSFERENCIA PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA SALA DE PROCESOS APÍCOLAS, COMUNA DE FRESIA	60.000.000	0	0	52.000.000	52.000.000	8.000.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	40072166	TRANSFERENCIA EQUIPAMIENTO HABILITANTES PARA EMPRENDEDORES TURÍSTICOS DEL TERRITORIO RIBERA NORTE DEL RIO MAULLIN	60.000.000	0	0	29.382.000	29.382.000	30.618.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	40072525	TRANSFERENCIA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD LOCAL "CIUDAD CREATIVA DE LA MÚSICA" EN ARTESANOS	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	40073425	CAPACITACION RUTA DEL MAR: EMPRENDE, CONECTA Y FORMALIZA	60.000.000	0	0	15.572.000	15.572.000	44.428.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	40073448	DIFUSION Y DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE PUERTO VARAS	60.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	40072668	CAPACITACION POTENCIACIÓN COMERCIAL Y PROD. PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS DE PUYEHUE	60.000.000	0	0	3.201.000	3.201.000	56.799.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA	40072624	CAPACITACION FONDO MUJERES ARTESANAS	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	40074107	RECUPERACION HORTICOLA, NUEVOS MERCADOS, NUEVOS HORIZONTES	60.000.000	0	0	16.875.000	16.875.000	43.125.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE CASTRO	40073481	DIFUSION ARTESANIA LOCAL DE LA COMUNA DE CASTRO	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON	40072632	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE CALIDAD TURÍSTICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE ISLA LEMUY	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE QUELLON	40072296	TRANSFERENCIA FOMENTO AL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS SOSTENIBLES, QUELLON	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
LIBRE	MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU	40073409	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN TURISMO AVENTURA FUTALEUFÚ	60.000.000	0	0	11.672.000	11.672.000	48.328.000
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS				28.696.128.000	4.156.619.848	43.400.998	5.081.402.000	5.038.001.002	19.458.106.152
TOTAL PROGRAMAS				57.431.818.155	15.452.585.867	1.639.023.142	9.982.403.000	8.343.379.858	31.996.829.288
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)				64.149.920.155	15.452.585.867	5.133.691.142	16.423.771.000	11.290.079.858	32.273.563.288
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2025				612.273.222.833	181.552.774.484	70.150.377.993	118.071.141.000	47.920.763.007	312.397.778.124

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
S/R=SIN RATE 2025
