

ESTADO DE SITUACIÓN

Ejecución Presupuestaria FNDR

Julio 2026

División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional de Los Lagos



GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS




CORE
Consejo Regional de Los Lagos




www.gorelосlagos.cl

MARCO PRESUPUESTARIO FNDR – Programa 02 2026

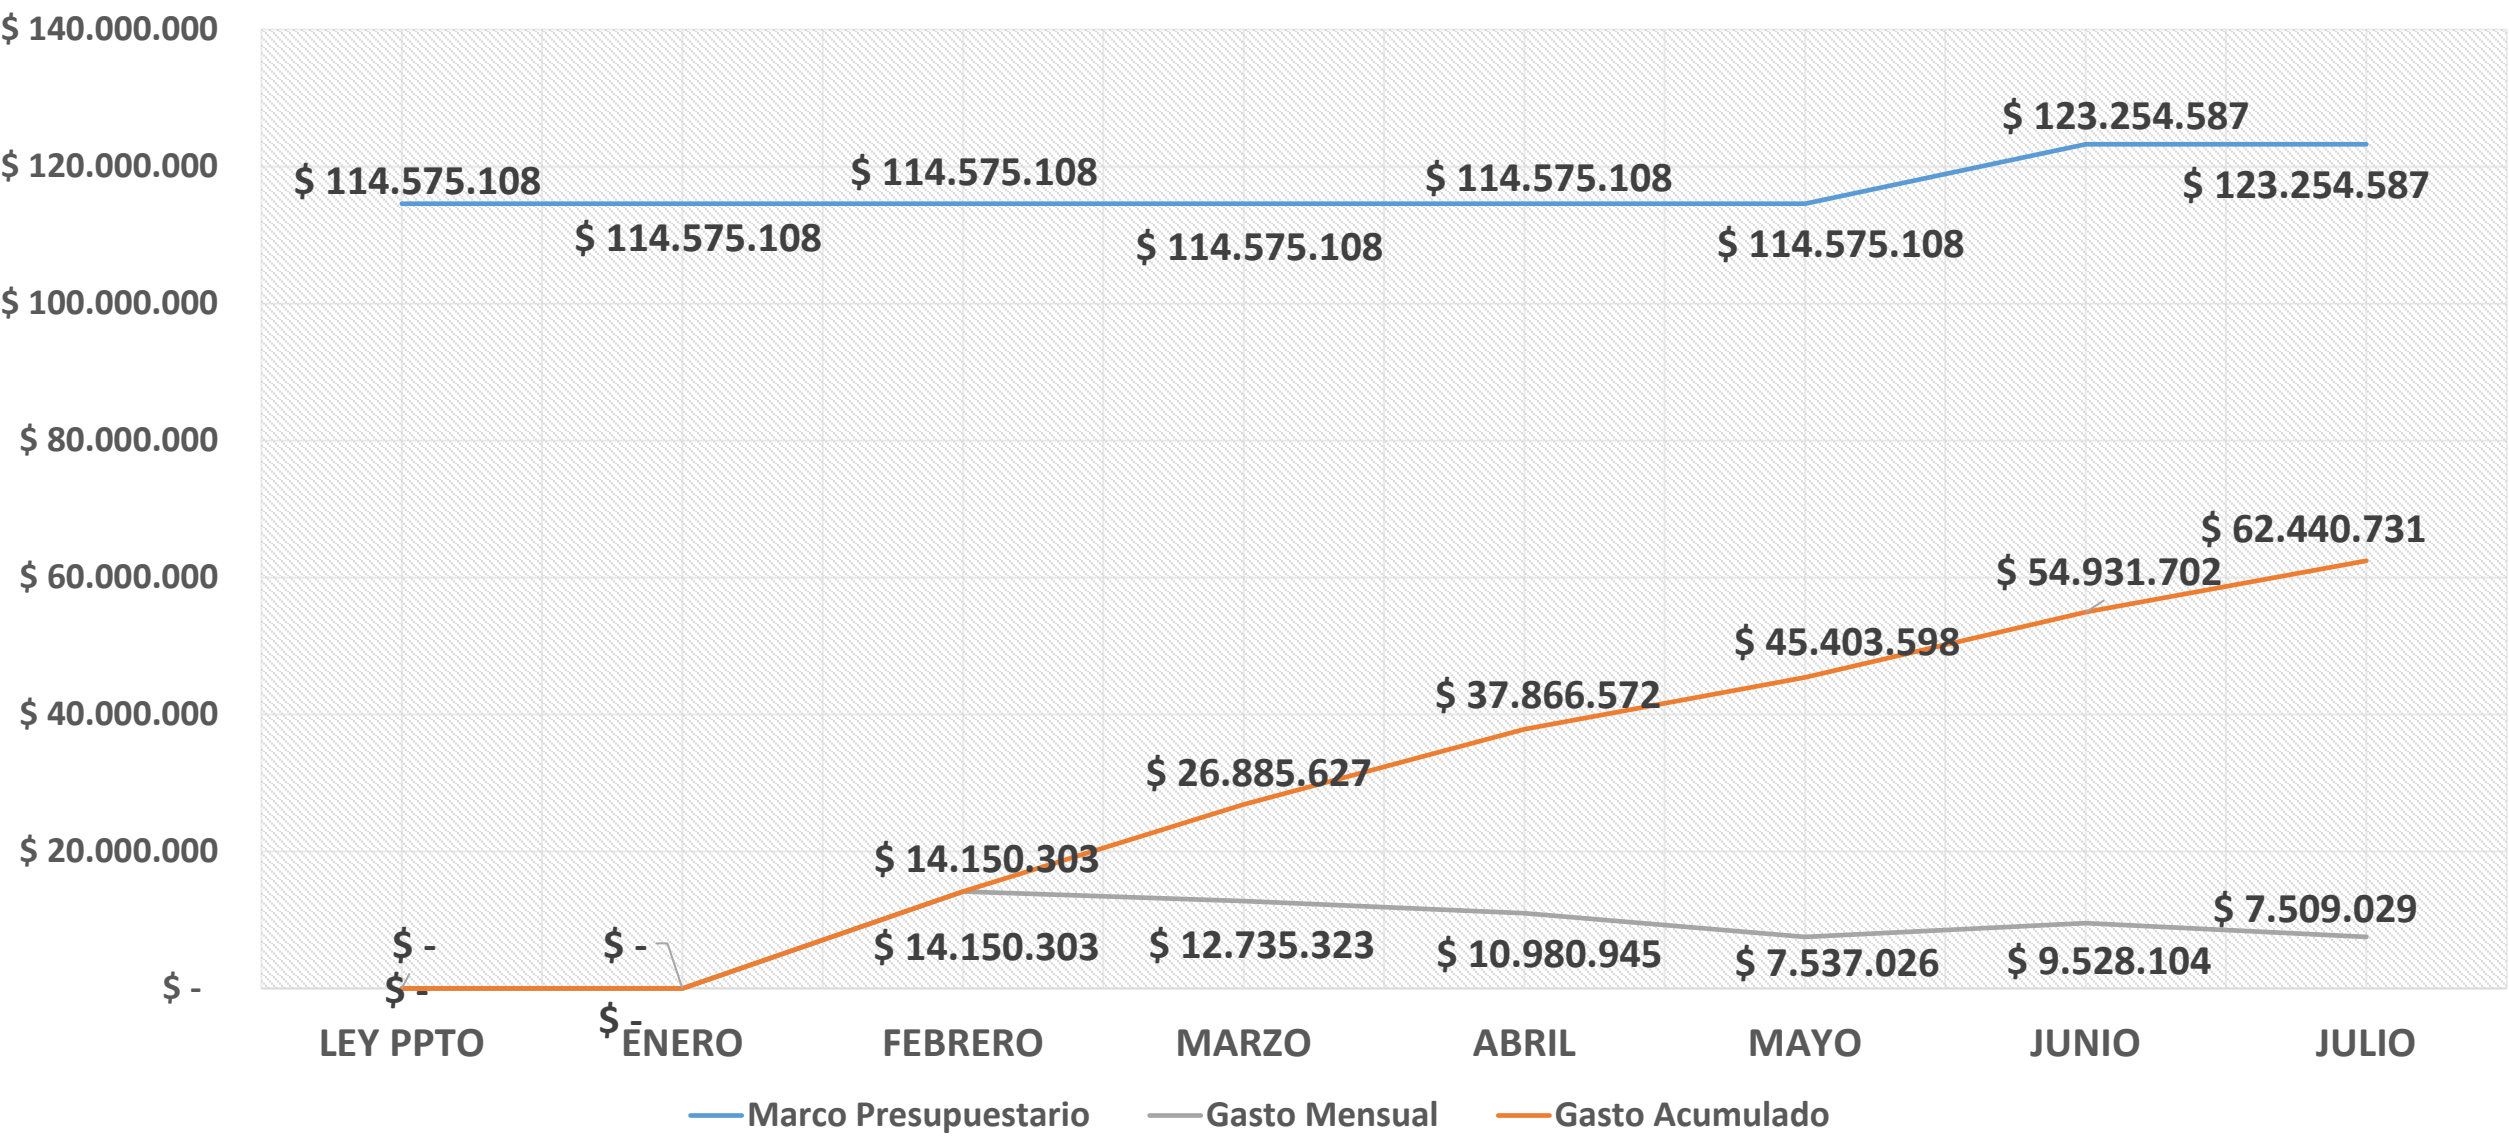


EFICIENCIA PRESUPUESTARIA FNDR

Programa 02 2026

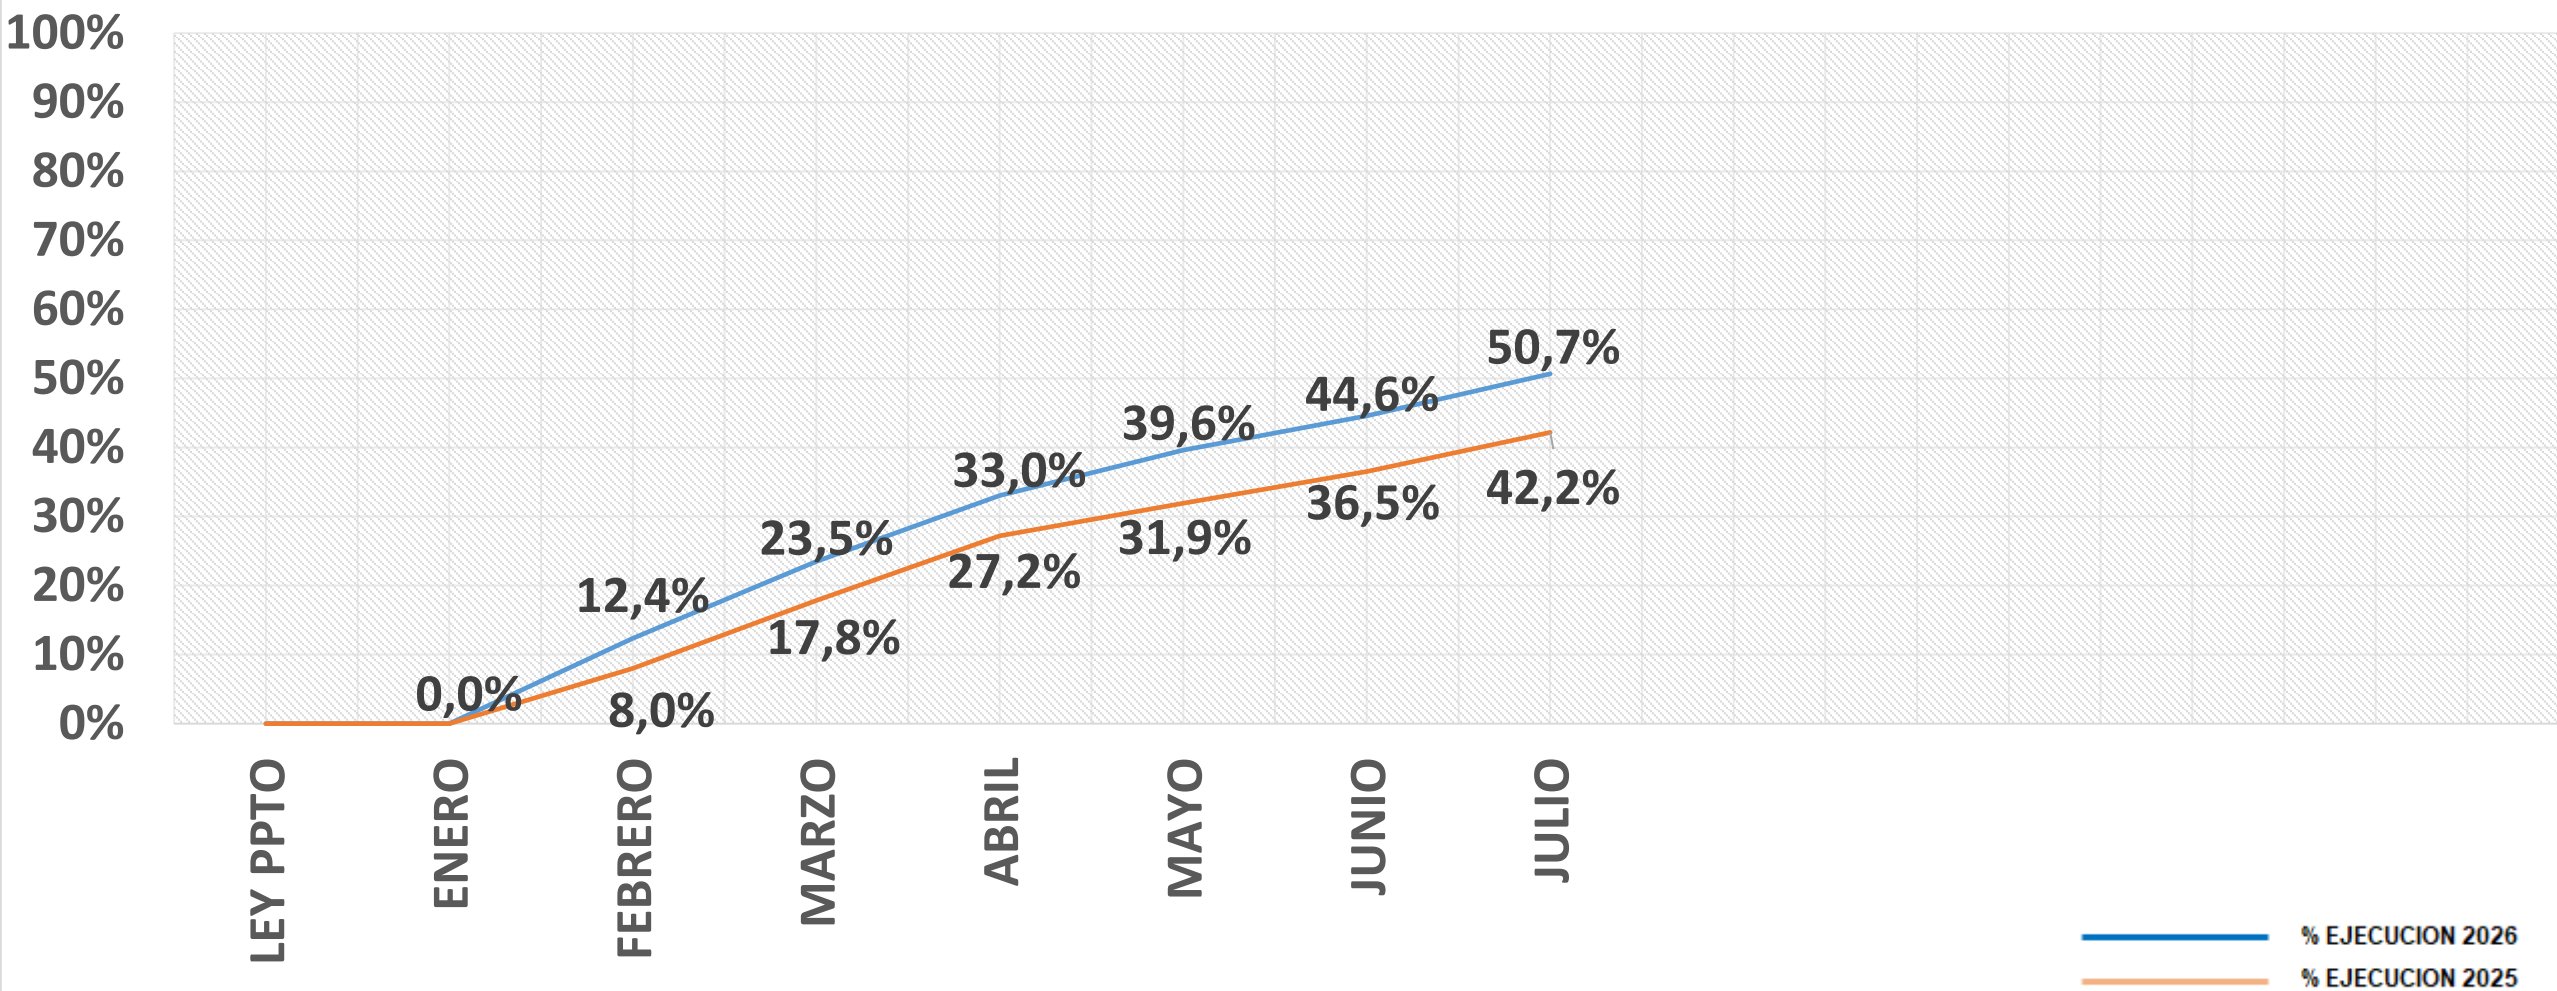


Eficiencia Presupuestaria por Provincia

al 31 Julio

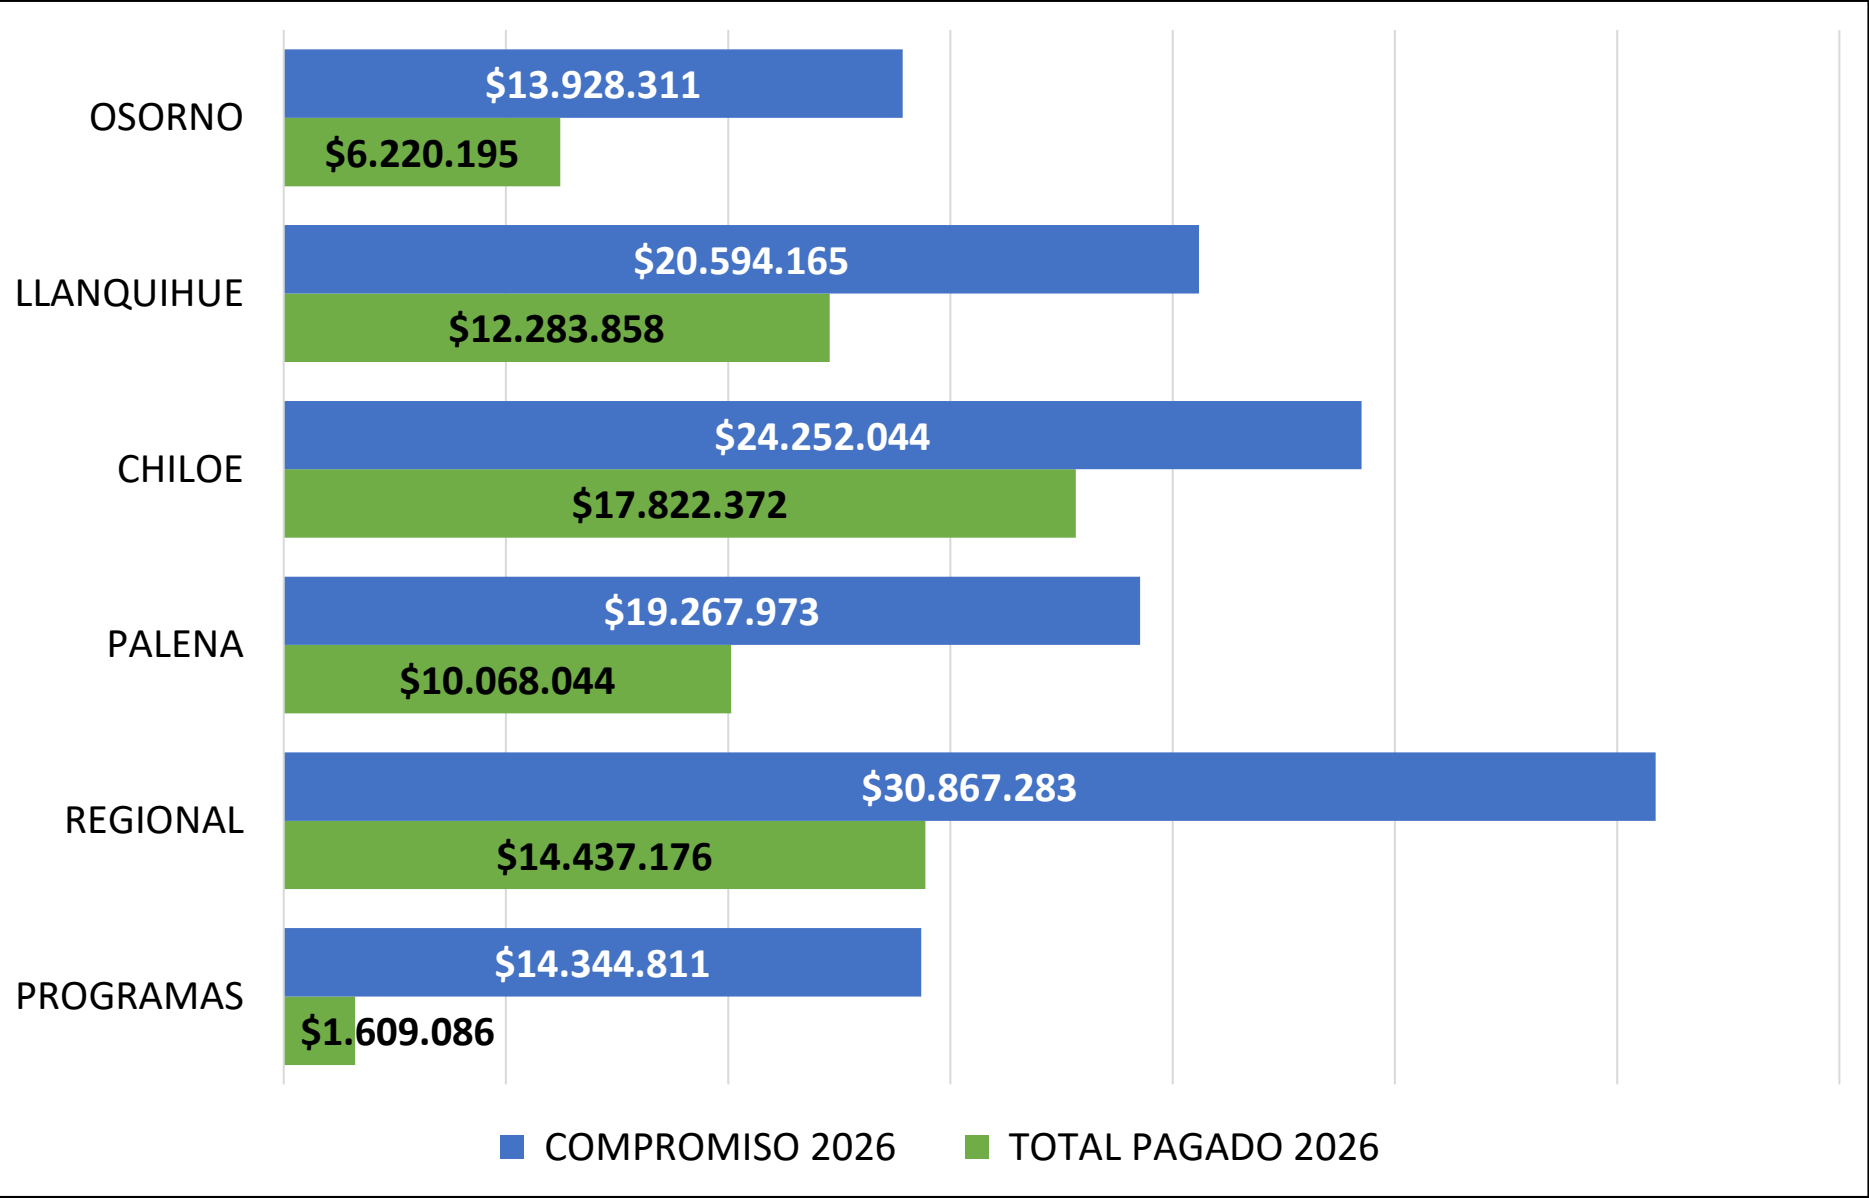

% Distribución por Provincia

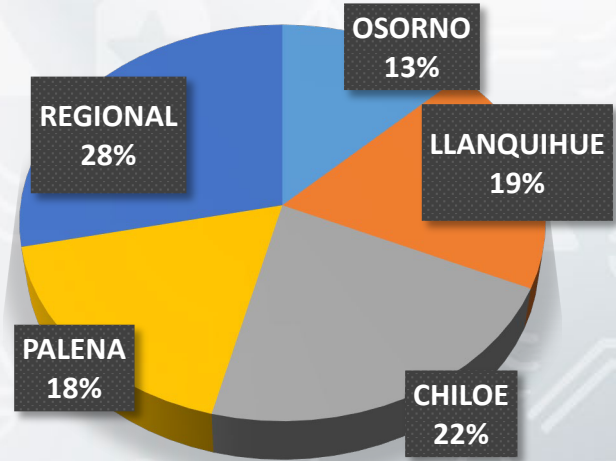

Resumen Ejecución por Provincia

PROVINCIA	% EJE.	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	44,66%	7.708.115.708
LLANQUIHUE	59,65%	8.310.307.415
CHILOE	73,49%	6.429.671.636
PALENA	52,25%	9.199.928.788
REGIONAL	46,77%	16.430.107.413
PPTO TERRITORIAL		48.078.130.960
PROGRAMAS	11,22%	12.735.725.210
TOTAL	50,66%	60.813.856.170

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROVINCIA



Detalle Provincia de Osorno



PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
		COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	32	58.364.041.270	54%	28.584.693.652	6.049.641.681	43%	2.896.256.705	47,87%	3.153.384.976
PTO. OCTAY	5	3.288.180.000	3%	266.506.973	828.755.107	6%	301.941.106	36,43%	526.814.001
PURRANQUE	6	6.592.068.000	6%	2.372.200.594	1.675.842.162	12%	1.017.212.299	60,70%	658.629.863
PUYEHUE	3	8.923.043.000	8%	623.540.695	153.867.605	1%	0	0,00%	153.867.605
RIO NEGRO	8	7.277.724.912	7%	3.649.719.245	1.610.795.942	12%	389.310.581	24,17%	1.221.485.361
SAN JUAN DE LA COSTA	7	9.562.516.482	9%	2.552.398.902	1.696.000.000	12%	641.106.131	37,80%	1.054.893.869
SAN PABLO	7	2.713.978.750	3%	52.851.234	738.936.716	5%	537.909.750	72,80%	201.026.966
PROV. OSORNO	4	10.643.148.201	10%	5.362.729.887	1.174.471.701	8%	436.458.634	37,16%	738.013.067
TOTAL	72	107.364.700.615	100%	43.464.641.182	13.928.310.914	100%	6.220.195.206	44,66%	7.708.115.708

Detalle Provincia de Llanquihue



PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
		COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	24	48.444.476.984	32%	25.250.067.910	3.092.514.529	15%	1.408.759.909	46%	1.683.754.620
CALBUCO	7	24.310.479.089	16%	15.323.922.326	2.104.938.481	10%	1.770.740.362	84%	334.198.119
COCHAMO	11	12.190.572.418	8%	433.252.857	1.524.037.511	7%	591.029.139	39%	933.008.372
FRESIA	6	7.030.631.303	5%	1.396.135.315	589.787.891	3%	290.952.982	49%	298.834.909
FRUTILLAR	10	8.520.641.598	6%	1.018.490.915	4.976.832.713	24%	2.983.446.595	60%	1.993.386.118
LLANQUIHUE	2	778.151.000	1%	201.612.460	481.387.011	2%	381.387.011	79%	100.000.000
LOS MUERMOS	2	4.042.643.858	3%	556.757.937	789.667.921	4%	507.775.953	64%	281.891.968
MAULLIN	11	7.420.155.681	5%	6.248.174	1.479.566.976	7%	755.205.004	51%	724.361.972
P.VARAS	12	14.950.146.009	10%	6.296.286.982	3.599.153.505	17%	2.651.829.109	74%	947.324.396
PROV.LLANQUIHUE	7	21.752.762.316	15%	10.097.399.684	1.956.278.801	9%	942.731.860	48%	1.013.546.941
TOTAL	92	149.440.660.256	100%	60.580.174.560	20.594.165.339	100%	12.283.857.924	60%	8.310.307.415

Detalle Provincia de Chiloé



PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
		COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
ANCUD	12	10.411.219.509	9%	4.117.579.407	1.986.214.378	8%	1.032.852.450	52%	953.361.928
CASTRO	7	21.520.547.856	18%	7.387.331.510	8.476.978.389	35%	7.752.361.849	91%	724.616.540
CHONCHI	14	15.819.867.367	13%	3.186.877.673	4.013.287.363	17%	2.341.316.746	58%	1.671.970.617
CURACO DE VELEZ	6	2.416.529.433	2%	438.653.115	794.510.318	3%	223.020.571	28%	571.489.747
DALCAHUE	13	12.271.322.060	10%	1.451.921.643	1.694.746.395	7%	1.069.845.274	63%	624.901.121
PUQUELDON	6	7.831.434.785	6%	3.471.097.721	1.557.946.561	6%	1.216.165.671	78%	341.780.890
QUEILEN	3	3.723.922.000	3%	1.045.300.291	50.000.000	0%	0	0%	50.000.000
QUELLON	5	2.292.531.146	2%	158.846.000	543.634.413	2%	0	0%	543.634.413
QUEMCHI	3	3.330.105.789	3%	1.485.286.866	369.555.923	2%	115.965.189	31%	253.590.734
QUINCHAO	5	8.329.400.355	7%	2.647.462.420	1.315.355.935	5%	864.597.015	66%	450.758.920
PROV. CHILOE	6	32.921.401.210	27%	15.305.116.625	3.449.814.042	14%	3.206.247.316	93%	243.566.726
TOTAL	80	120.868.281.510	100%	40.695.473.271	24.252.043.717	100%	17.822.372.081	73%	6.429.671.636

Detalle Provincia de Palena



PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
		COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
CHAITEN	3	10.810.929.000	8%	25.800.000	67.200.000	0%	0	0%	67.200.000
FUTALEUFU	6	2.654.424.646	2%	220.257.047	865.019.646	4%	779.950.356	90%	85.069.290
HUALAIHUE	8	4.880.080.000	4%	1.429.620.291	839.562.482	4%	492.158.187	59%	347.404.295
PALENA	5	6.838.770.000	5%	1.415.196.686	318.722.709	2%	160.082.777	50%	158.639.932
PROV. PALENA	5	102.646.356.000	80%	27.247.619.428	17.177.467.757	89%	8.635.852.486	50%	8.541.615.271
TOTAL	27	127.830.559.646	100%	30.338.493.452	19.267.972.594	100%	10.068.043.806	52%	9.199.928.788

Eficiencia por Provisión

Al 31 Julio

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2026 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2026 - PROGRAMA 02			
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2026	PAGOS 2026	% EJECUCION	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	61.693.350.000	62.880.939.816	51,02%	-1.187.589.816	62.880.939.816	34.618.065.972	55,05%	28.262.873.844
FATP	FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL	21.235.317.000	18.775.147.221	15,23%	2.460.169.779	18.775.147.221	8.464.048.818	45,08%	10.311.098.403
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	15.827.049.000	15.750.879.131	12,78%	76.169.869	15.750.879.131	7.578.860.217	48,12%	8.172.018.914
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	2.764.019.989	2,24%	-2.764.019.989	2.764.019.989	1.732.382.633	62,68%	1.031.637.356
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	10.000.000.000	10.000.000.000	8,11%	0	10.000.000.000	7.944.815.238	79,45%	2.055.184.762
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	744.315.931	0,60%	-744.315.931	744.315.931	739.784.531	99,39%	4.531.400
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	14.498.871.000	12.037.224.000	9,77%	2.461.647.000	12.037.224.000	1.339.513.498	11,13%	10.697.710.502
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	0	0,00%	0	0	0	#¡DIV/0!	0
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	105.947.977	0,09%	-105.947.977	105.947.977	0	0,00%	105.947.977
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	196.112.935	0,16%	-196.112.935	196.112.935	23.259.923	11,86%	172.853.012
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
TOTAL	TOTAL	123.254.587.000	123.254.587.000	100%	0	123.254.587.000	62.440.730.830	51%	60.813.856.170

Eficiencia por Subtítulo

Al 31 Julio

PROGRAMA 02 - FNDR 2026								
SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
22 Estudios e investigaciones	2.223.026.750	392.207.500	469.292.000	469.292.000	0,38%	39.062.250	8,32%	430.229.750
24 Transferencias Corrientes	26.974.387.440	2.026.022.000	17.958.174.000	17.958.174.000	14,57%	4.891.652.840	27,24%	13.066.521.160
26 Otros Gastos Corrientes	128.351.000	0	128.351.000	128.351.000	0,10%	120.399.710	93,81%	7.951.290
29 Activos no Financieros	27.212.033.729	5.529.299.633	11.356.612.000	11.356.612.000	9,21%	6.257.176.916	55,10%	5.099.435.084
31 Iniciativas de Inversión	510.725.484.048	170.435.508.081	65.616.538.000	65.616.538.000	53,24%	38.798.110.378	59,13%	26.818.427.622
33 Transferencias de Capital	65.820.806.838	7.760.205.405	27.725.620.000	27.725.620.000	22,49%	12.334.328.736	44,49%	15.391.291.264
	633.084.089.805	186.143.242.619	123.254.587.000	123.254.587.000	100%	62.440.730.830	51%	60.813.856.170

Eficiencia por Sector

Al 31 Julio



SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
	COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	192.440.844.045	30,40%	46.612.552.431	25.991.341.549	21%	12.096.420.046	46,54%	13.894.921.503
SALUD	119.682.996.600	18,90%	38.867.194.368	24.931.164.217	20%	12.606.125.218	50,56%	12.325.038.999
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	103.393.438.583	16,33%	44.364.850.249	15.158.283.053	12%	10.937.486.481	72,16%	4.220.796.572
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	41.023.066.380	6,48%	21.648.131.762	1.195.912.237	1%	737.984.451	61,71%	457.927.786
RECURSOS HIDRICOS	24.833.768.947	3,92%	6.488.019.994	2.620.918.671	2%	1.297.265.968	49,50%	1.323.652.703
MULTISECTORIAL	51.387.743.263	8,12%	5.842.343.514	26.259.215.781	21%	10.380.961.320	39,53%	15.878.254.461
SEGURIDAD PUBLICA	21.915.683.749	3,46%	7.640.562.234	7.289.385.448	6%	4.899.178.329	67,21%	2.390.207.119
DEPORTES	34.716.476.243	5,48%	7.627.485.640	6.258.287.280	5%	4.021.311.271	64,26%	2.236.976.009
TURISMO Y COMERCIO	4.410.469.000	0,70%	1.681.338.819	1.647.621.000	1%	208.028.642	12,63%	1.439.592.358
ENERGIA	9.596.636.000	1,52%	125.778.069	5.638.104.773	5%	4.303.158.194	76,32%	1.334.946.579
PESCA	4.800.000.000	0,76%	604.099.000	1.512.300.000	1%	133.103.073	8,80%	1.379.196.927
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	15.708.724.117	2,48%	1.484.547.941	2.588.155.991	2%	701.102.991	27,09%	1.887.053.000
AGRICULTURA	5.869.551.878	0,93%	3.156.338.598	2.158.897.000	2%	118.604.846	5,49%	2.040.292.154
JUSTICIA	3.304.691.000	0,52%	0	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000
TOTAL	633.084.089.805	100%	186.143.242.619	123.254.587.000	100%	62.440.730.830	51%	60.813.856.170

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE OSORNO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/TERMINADOS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.880.905.650	7.880.905.650	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	22.210.242.780	5.657.190.512	659.639.825	2.845.817.885	2.186.178.060	13.707.234.383	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	699.055.000	47.479.757	0	50.000.000	50.000.000	601.575.243	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	112.067.112	15.501.123	64.707.959	49.206.836	17.028.929	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	329.270.698	0	79.000.000	79.000.000	102.979.302	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	923.093.864	502.435.848	420.658.016	420.658.016	0	0	RS	TERMINADO
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	5.000.000	5.000.000	3.270.092.000	RS	REEVALUACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	501.181.920	501.181.920	0	143.483.080	RS*	TERMINADO
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	199.921.071	0	199.921.071	199.921.071	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	1.012.364.034	33.772.200	114.676.966	80.904.766	0	RS	TERMINADO
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40039803	CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA DE BOMBEROS CANCURA, OSORNO	593.692.000	0	312.905.296	513.692.000	200.786.704	80.000.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.437.647.360	1.388.058.496	49.588.864	49.588.864	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042947	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE CHILLÁN , ENTRE AV. REPÚBLICA Y C.TEMUCO,OSORNO	1.456.900.000	0	447.118.647	609.512.019	162.393.372	847.387.981	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.421.679.579	1.421.679.579	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	704.555.415	704.555.415	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	593.199.190	593.199.190	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	359.879.295	359.879.295	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	688.311.832	688.311.832	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	331.349.517	331.349.517	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.548.519.676	2.548.519.676	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.457.537.952	4.457.537.952	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	549.889.089	549.889.089	0	0	0	0	RS	TERMINADO
TOTAL							52.808.231.270	28.584.693.652	2.640.286.962	5.453.756.700	2.813.469.738	18.769.780.918		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	429.057.000	0	0	100.000.000	100.000.000	329.057.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40059081	CONSERVACION FERIA PEDRO AGUIRRE CERDA OSORNO	507.089.000	0	80.827.656	301.987.890	221.160.234	205.101.110	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40062270	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIÓN JUAN DE DIOS GUAJARDO, OSORNO	204.510.000	0	163.172.087	168.032.091	4.860.004	36.477.909	RS*	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40054690	REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA PAMPA SHILLING, OSORNO	43.865.000	0	11.970.000	23.865.000	11.895.000	20.000.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059784	REPOSICION CALLE PARALELA HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FRANCKE OSORNO	1.113.363.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.112.363.000	RS	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40066467	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SANTÍSIMA TRINIDAD	257.572.000	0	0	1.000.000	1.000.000	256.572.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	50000852	CONSTRUCCION CANCHA CENTRO DEPORTIVO V CENTENARIO	1.756.123.000	0	0	0	0	1.756.123.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40062857	REPOSICION DE VEREDAS CALLE DAVID ROSAS, OSORNO	320.782.000	0	0	0	0	320.782.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40066566	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN EL ESFUERZO II	273.671.000	0	0	0	0	273.671.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40061659	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA POBL. MOYANO, OSORNO	316.804.000	0	0	0	0	316.804.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40062712	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA ALTO ESPERANZA	332.974.000	0	0	0	0	332.974.000	RS	CONVENIO
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							5.555.810.000	0	255.969.743	595.884.981	339.915.238	4.959.925.019		
TOTAL COMUNA DE OSORNO							58.364.041.270	28.584.693.652	2.896.256.705	6.049.641.681	3.153.384.976	23.729.705.937		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PUERTO OCTAY								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.158.223.000	21.934.080	0	250.000.000	250.000.000	886.288.920	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40051437	CONSERVACION DE 16 CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTORES RURALES, COMUNA DE PUERTO OCTAY	570.975.000	244.572.893	301.941.106	326.402.107	24.461.001	0	RS*	TERMINADO
						TOTAL	1.729.198.000	266.506.973	301.941.106	576.402.107	274.461.001	886.288.920		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041628	ADQUISICION AMBULANCIA EMERGENCIA BASICA CECOSF CASCADAS, COMUNA PUERTO OCTAY	98.353.000	0	0	98.353.000	98.353.000	0	RS*	2DA LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1.197.961.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.147.961.000	RS	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40075708	MEJORAMIENTO MULTICACHA TECHADA ESCUELA ALBERTO HURTADO COMUNDA DE PUERTO OCTAY	262.668.000	0	0	104.000.000	104.000.000	158.668.000	RS*	LICITACION
						TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.558.982.000	0	0	252.353.000	252.353.000	1.306.629.000		
						TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	3.288.180.000	266.506.973	301.941.106	828.755.107	526.814.001	2.192.917.920		
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.593.749.000	865.213.301	332.704.324	550.000.000	217.295.676	178.535.699	RS	REEVALUACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.176.646.000	1.056.428.269	67.241.545	80.000.000	12.758.455	40.217.731	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.232.931.000	0	19.055.418	218.544.000	199.488.582	1.014.387.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.170.070.000	450.559.024	598.211.012	710.435.380	112.224.368	9.075.596	RS	TERMINADO
						TOTAL	5.173.396.000	2.372.200.594	1.017.212.299	1.558.979.380	541.767.081	1.242.216.026		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40047721	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS ANGELES, PURRANQUE	46.499.000	0	0	15.000.000	15.000.000	24.625.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40033259	REPOSICION CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PURRANQUE	1.372.173.000	0	0	101.862.782	101.862.782	1.270.310.218	RS	EJECUCION
						TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.418.672.000	0	0	116.862.782	116.862.782	1.294.935.218		
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	6.592.068.000	2.372.200.594	1.017.212.299	1.675.842.162	658.629.863	2.537.151.244		
						COMUNA DE PUYEHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	585.020.395	0	48.867.605	48.867.605	0	RS*	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	38.520.300	0	55.000.000	55.000.000	102.851.700	RS	EJECUCION
						TOTAL	830.260.000	623.540.695	0	103.867.605	103.867.605	102.851.700		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.092.783.000	0	0	50.000.000	50.000.000	8.042.783.000	RS	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	8.092.783.000	0	0	50.000.000	50.000.000	8.042.783.000		
						TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	8.923.043.000	623.540.695	0	153.867.605	153.867.605	8.145.634.700		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE RIO NEGRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.147.632.000	1.054.667.638	26.203.341	54.251.065	28.047.724	38.713.297	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.003.769.912	999.242.248	4.413.507	4.527.664	114.157	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.299.153.000	1.054.987.961	111.715.516	240.292.625	128.577.109	3.872.414	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	21.312.000	5.328.000	319.689.986	314.361.986	762.842.014	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032117	CONSERVACION CAMINOS VECINALES DE ÑANCUÁN CHANCHAN, SAN FLORENTINO Y QUISQUELELFUN, RÍO NEGRO	1.065.206.000	519.509.398	241.650.217	545.696.602	304.046.385	0	RS*	TERMINADO
						TOTAL	5.619.604.912	3.649.719.245	389.310.581	1.164.457.942	775.147.361	805.427.725		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052927	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR MILLACURA, COMUNA DE RIO NEGRO	505.990.000	0	0	50.000.000	50.000.000	455.990.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	30097977	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA RIO NEGRO	805.792.000	0	0	50.000.000	50.000.000	755.792.000	RS	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073026	REPOSICION DOS CAMIONES TOLVA PARA LA COMUNA DE RÍO NEGRO	346.338.000	0	0	346.338.000	346.338.000	0	RS*	ADJUDICACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.658.120.000	0	0	446.338.000	446.338.000	1.211.782.000		
						TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	7.277.724.912	3.649.719.245	389.310.581	1.610.795.942	1.221.485.361	2.017.209.725		
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.908.118.000	1.358.927.420	641.106.131	1.445.000.000	803.893.869	3.104.190.580	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.193.471.482	1.193.471.482	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	0	0	511.498.000	RS	SIN RATE DESDE 2024/NO SE FINANCIARA
						TOTAL	7.613.087.482	2.552.398.902	641.106.131	1.445.000.000	803.893.869	3.615.688.580		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40066529	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD SAN JUAN DE LA COSTA	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071828	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUIZAS-CHEUQUEMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA	1.002.049.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.001.049.000	RS*	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40062700	ADQUISICION VEHÍCULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	159.900.000	0	0	0	0	159.900.000	RS*	LICITACION
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40071248	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PURRAHUE-PUFAYO COMPLEMENTARIO SAN JUAN DE LA COSTA	537.480.000	0	0	0	0	537.480.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.949.429.000	0	0	251.000.000	251.000.000	1.698.429.000		
						TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	9.562.516.482	2.552.398.902	641.106.131	1.696.000.000	1.054.893.869	5.314.117.580		
						COMUNA DE SAN PABLO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.131.350.000	21.991.200	0	99.000.000	99.000.000	1.010.358.800	RS	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	30.860.034	0	1.026.966	1.026.966	20.000.000	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	126.140.000	0	126.140.000	126.140.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	258.973.750	0	258.973.750	258.973.750	0	0	RS*	TERMINADO
						TOTAL	1.568.350.750	52.851.234	385.113.750	485.140.716	100.026.966	1.030.358.800		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40069510	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES VARIOS DEPARTAMENTOS, SAN PABLO	152.796.000	0	152.796.000	152.796.000	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40070438	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES PUTABLA, QUILEN Y CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO	406.477.000	0	0	1.000.000	1.000.000	405.477.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40074170	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO, SECTOR MAILE, COMUNA DE SAN PABLO	286.355.000	0	0	100.000.000	100.000.000	186.355.000	RS*	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055485	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, CAI, COMUNA DE SAN PABLO	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.145.628.000	0	152.796.000	253.796.000	101.000.000	891.832.000		
						TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	2.713.978.750	52.851.234	537.909.750	738.936.716	201.026.966	1.922.190.800		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	267.076.134	1.005.089.201	738.013.067	1.900.500.799	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	4.121.575.186	0	0	0	2.015.622.814	CF	LIQUIDACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	283.080.799	283.080.799	0	0	0	0	RS	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.082.712.402	913.329.902	169.382.500	169.382.500	0	0	RS*	TERMINADO
24	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO COMUNA DE PUERTO OCTAY	189.823.000	0	0	0	0	189.823.000	RS***	RES EN TRAMITE
TOTAL							10.643.148.201	5.362.729.887	436.458.634	1.174.471.701	738.013.067	4.105.946.613		
TOTAL PROVINCIALES							10.643.148.201	5.362.729.887	436.458.634	1.174.471.701	738.013.067	4.105.946.613		
TOTAL PROVINCIA DE OSORNO							107.364.700.615	43.464.641.182	6.220.195.206	13.928.310.914	7.708.115.708	49.964.874.519		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.968.439.987	8.964.989.987	3.450.000	3.450.000	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	4.060.161.100	3.978.756.124	7.758.800	81.404.976	73.646.176	0	RS*	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	791.422.000	15.250.000	0	50.000.000	50.000.000	726.172.000	RS	REEVALUACION
31	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	676.991.000	15.250.000	0	50.000.000	50.000.000	611.741.000	RS	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	840.037.624	0	0	305.549.315	305.549.315	534.488.309	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.362.125.000	883.195.617	0	114.692.383	114.692.383	364.237.000	RS*	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.779.570.158	8.472.385.394	167.707.122	212.707.122	45.000.000	94.477.642	RS	EJECUCION/ETO-EPO
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.484.881.860	1.624.763.093	701.740.129	860.118.767	158.378.638	0	RE	EJECUCION/ETO-EPO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	262.200	0	86.143.945	86.143.945	2.705.391.855	RS	EXPROPIACIONES
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	1.000.117.739	0	0	50.000.000	50.000.000	950.117.739	RS	RESCILIACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.309.135.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.259.135.000	RS	ADMISIBILIDAD MIDESOF
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	980.175.000	0	0	50.000.000	50.000.000	930.175.000	RS	ADMISIBILIDAD
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.934.861.516	1.293.352.495	528.103.858	641.509.021	113.405.163	0	RS*	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	30.000.000	30.000.000	216.329.000	RS	CONVENIO
TOTAL							36.226.044.984	25.248.204.910	1.408.759.909	2.585.575.529	1.176.815.620	8.392.264.545		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30034826	REPOSICION POSTA ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.396.009.000	1.863.000	0	50.000.000	50.000.000	1.344.146.000	RS	ADMISIBILIDAD/MIDESOF
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	1.263.261.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.213.261.000	RS	SIN RS/MIDESOF
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40067945	MEJORAMIENTO CALLE CALETERA AV. PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	898.600.000	0	0	50.000.000	50.000.000	848.600.000	RS	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129873	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL PUERTO MONTT	225.461.000	0	0	25.000.000	25.000.000	200.461.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071848	MEJORAMIENTO CALLE GÉNESIS E INMACULADA, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.530.350.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.529.350.000	RS	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40070609	ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE MIXTO SEGURIDAD PÚBLICA, COMUNA DE PUERTO MONTT	330.939.000	0	0	330.939.000	330.939.000	0	RS*	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40072266	CONSERVACION CENTRO SERVICIOS SALUD COMUNAL	1.602.366.000	0	0	0	0	1.602.366.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40072645	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS SECTOR VICUÑA MACKENNA POBLACION MIRASOL, PUERTO MONTT	328.060.000	0	0	0	0	328.060.000	RS*	LICITACION
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40072616	ADQUISICION EQUIPO DE BACHEO, COMUNA DE PUERTO MONTT	374.017.000	0	0	0	0	374.017.000	RS*	CONVENIO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40074666	MEJORAMIENTO CASONA EX BANCO LLANQUIHUE PARQUE LA PALOMA PUERTO MONTT	269.369.000	0	0	0	0	269.369.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004334	CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							12.218.432.000	1.863.000	0	506.939.000	506.939.000	11.709.630.000		
						TOTAL COMUNA DE P. MONTT	48.444.476.984	25.250.067.910	1.408.759.909	3.092.514.529	1.683.754.620	20.101.894.545		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CALBUCO								
						INIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO, CALBUCO	16.168.723.293	14.193.669.885	526.698.021	555.257.380	28.559.359	1.419.796.028	RS	EJECUCION/ETO
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.666.209.546	1.036.752.441	0	0	0	629.457.105	RS	LIQUIDACION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	109.282.250	93.500.000	15.782.250	15.782.250	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.359.482.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.309.482.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	844.800.986	984.384.000	139.583.014	0	RS*	EJECUCION
						TOTAL	20.288.081.089	15.323.922.326	1.387.281.257	1.605.423.630	218.142.373	3.358.735.133		
						INIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40055239	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES VILLARROEL Y C. CONDELL, CALBUCO	2.800.863.000	0	0	100.000.000	100.000.000	2.700.863.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40055163	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA PULUQUI	1.221.535.000	0	383.459.105	399.514.851	16.055.746	822.020.149	RS	EJECUCION
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.022.398.000	0	383.459.105	499.514.851	116.055.746	3.522.883.149		
						TOTAL COMUNA DE CALBUCO	24.310.479.089	15.323.922.326	1.770.740.362	2.104.938.481	334.198.119	6.881.618.282		
						COMUNA DE COCHAMO								
						INIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PEDZE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	0	0	61.157.800	RS	LIQUIDADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	0	0	0	0	122.370.000	RS	LIQUIDADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	480.875.535	40.561.764	208.881.757	340.313.771	131.432.014	100.000.000	RS*	EJECUCION
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	369.691.642	649.691.642	280.000.000	2.197.900.358	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	288.865.700	277.916.143	10.949.557	10.949.557	0	0	RS*	TERMINADO
26	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	1.506.183	0	1.506.183	1.506.183	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.556.268.000	29.558.750	0	0	0	1.526.709.250	RS	LIQUIDADO
						TOTAL	5.426.907.418	416.308.857	591.029.139	1.002.461.153	411.432.014	4.008.137.408		
						INIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.569.748.000	16.944.000	0	50.000.000	50.000.000	1.502.804.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ	1.053.383.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.003.383.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40070102	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL POCOIHUEN, COCHAMO	3.769.266.000	0	0	50.308.358	50.308.358	3.718.957.642	RS	LICITACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	332.627.000	0	0	332.627.000	332.627.000	0	RS*	ADJUDICACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	38.641.000	0	0	38.641.000	38.641.000	0	RS*	TERMINADO
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.763.665.000	16.944.000	0	521.576.358	521.576.358	6.225.144.642		
						TOTAL COMUNA DE COCHAMO	12.190.572.418	433.252.857	591.029.139	1.524.037.511	933.008.372	10.233.282.050		
						COMUNA DE FRESIA								
						INIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	131.524.386	131.524.386	0	RS	MODIF CONVENIO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	66.023.294	RS	LIQUIDADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.779.772.238	564.573.930	290.952.982	392.166.305	101.213.323	823.032.003	RS	EJECUCION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	65.097.200	65.097.200	585.874.800	RS*	LICITACION
						TOTAL	3.459.853.303	1.396.135.315	290.952.982	588.787.891	297.834.909	1.474.930.097		
						INIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30435722	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, FRESIA	3.300.950.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.299.950.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40075634	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS RÍOS, COMUNA DE FRESIA	269.828.000	0	0	0	0	269.828.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	3.570.778.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.569.778.000		
						TOTAL COMUNA DE FRESIA	7.030.631.303	1.396.135.315	290.952.982	589.787.891	298.834.909	5.044.708.097		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE FRUTILLAR								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	362.566.601	0	87.005.399	87.005.399	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	234.000.000	0	166.000.000	166.000.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	1.222.519.000	154.611.365	515.215.663	725.313.652	210.097.989	342.593.983	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025466	MEJORAMIENTO AVENIDA ARTURO ALESSANDRI NORTE, COMUNA DE FRUTILLAR	4.033.866.000	1.521.177	2.468.230.932	3.179.351.823	711.120.891	852.993.000	RS	EJECUCION
TOTAL							6.430.914.598	1.018.490.915	2.983.446.595	4.216.836.700	1.233.390.105	1.195.586.983		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071230	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CASMA, COMUNA DE FRUTILLAR	228.318.000	0	0	70.000.000	70.000.000	158.318.000	RS	LICITACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	485.755.000	0	0	485.755.000	485.755.000	0	RS	EJECUCION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	103.582.000	0	0	103.582.000	103.582.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40069991	CONSTRUCCION MÓDULOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED DE SALUD COMUNAL DE FRUTILLAR	336.469.000	0	0	50.000.000	50.000.000	286.469.000	RS	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40066152	CONSTRUCCION ESPACIO DE ENTRENAMIENTO PARA LAS ARTES MARCIALES, COMUNA DE FRUTILLAR.	315.077.000	0	0	50.659.013	50.659.013	264.417.987	RS	EJECUCION
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40056836	ADQUISICION EQUIPO EQUIPAMIENTO PABELLON HOSPITAL DE FRUTILLAR	119.940.000	0	0	0	0	119.940.000	RS*	CONVENIO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40056836	ADQUISICION EQUIPO EQUIPAMIENTO PABELLON HOSPITAL DE FRUTILLAR	500.586.000	0	0	0	0	500.586.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.089.727.000	0	0	759.996.013	759.996.013	1.329.730.987		
TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR							8.520.641.598	1.018.490.915	2.983.446.595	4.976.832.713	1.993.386.118	2.525.317.970		
						COMUNA DE LLANQUIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	436.621.000	201.612.460	39.857.011	139.857.011	100.000.000	95.151.529	RS	EJECUCION
TOTAL							436.621.000	201.612.460	39.857.011	139.857.011	100.000.000	95.151.529		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054960	ADQUISICION EQUIPO MAMOGRAFO HOSPITAL DE LLANQUIHUE	341.530.000	0	341.530.000	341.530.000	0	0	RS*	TERMINADO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							341.530.000	0	341.530.000	341.530.000	0	0		
TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE							778.151.000	201.612.460	381.387.011	481.387.011	100.000.000	95.151.529		
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.546.425.858	556.757.937	501.558.203	689.667.921	188.109.718	300.000.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.274.261.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40049194	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA II, COMUNA DE LOS MUERMOS	1.171.957.000	0	6.217.750	50.000.000	43.782.250	1.121.957.000	RS	EJECUCION
TOTAL							4.042.643.858	556.757.937	507.775.953	789.667.921	281.891.968	2.696.218.000		
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS							4.042.643.858	556.757.937	507.775.953	789.667.921	281.891.968	2.696.218.000		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	10.000.000	10.000.000	127.618.000	RS	REEVALUACION-CON RATE OT
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	62.456.000	0	0	15.000.000	15.000.000	47.456.000	RS	LICITACION DESIERTA
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	106.879.668	106.879.668	1.161.917.013	RS*	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	656.197.004	809.674.000	153.476.996	120.000.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.169.469.000	3.034.999	4.998.000	89.874.001	84.876.001	1.076.560.000	RS	EJECUCION
TOTAL							3.568.013.681	3.034.999	661.195.004	1.031.427.669	370.232.665	2.533.551.013		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30134574	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	1.167.917.000	3.213.175	0	50.000.000	50.000.000	1.114.703.825	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	366.003.000	0	0	100.516.808	100.516.808	265.486.192	RS*	REEVALUACION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	286.015.000	0	94.010.000	182.335.000	88.325.000	103.680.000	RS*	REEVALUACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	964.982.000	0	0	10.000.000	10.000.000	954.982.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40057978	REPOSICION 3RA. COMISARIA MAULLIN	378.161.000	0	0	24.000.000	24.000.000	354.161.000	RS	CONVENIO
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073466	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE MAULLÍN	300.000.000	0	0	81.287.499	81.287.499	218.712.501	RS*	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40054481	CONSTRUCCION SSR SECTOR PUERTO GODOY, COMUNA DE MAULLÍN	389.064.000	0	0	0	0	389.064.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.852.142.000	3.213.175	94.010.000	448.139.307	354.129.307	3.400.789.518		
TOTAL COMUNA DE MAULLIN							7.420.155.681	6.248.174	755.205.004	1.479.566.976	724.361.972	5.934.340.531		
						COMUNA DE PUERTO VARAS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.391.441.000	1.076.381.867	1.524.037.968	2.227.786.286	703.748.318	2.087.272.847	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.192.357.990	2.133.693.520	45.070.620	58.664.470	13.593.850	0	RS	EJECUCION/ETO
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	160.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	RS	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.347.083.550	1.080.697.996	248.353.554	266.385.554	18.032.000	0	RS	EJECUCION/ETO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	927.995.201	0	0	0	136.655.079	RS	PARALIZADA
31	02	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	125.778.069	739.784.531	744.315.931	4.531.400	0	RS	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	845.787.189	791.204.753	54.582.436	54.582.436	0	0	RS	TERMINADO
TOTAL							11.911.414.009	6.295.751.406	2.651.829.109	3.391.734.677	739.905.568	2.223.927.926		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	535.576	0	4.000.000	4.000.000	282.210.424	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.362.466.000	0	0	80.000.000	80.000.000	1.282.466.000	RS	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40064856	CONSERVACION VÍAS URBANAS DE PUERTO VARAS	920.256.000	0	0	1.000.000	1.000.000	919.256.000	RS	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073778	MEJORAMIENTO MERCADO PIO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS	326.450.000	0	0	61.209.414	61.209.414	265.240.586	RS	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40027764	CONSTRUCCION PARQUE QUEBRADA HONDA DE PUERTO VARAS	142.814.000	0	0	61.209.414	61.209.414	81.604.586	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.038.732.000	535.576	0	207.418.828	207.418.828	2.830.777.596		
TOTAL COMUNA DE P.VARAS							14.950.146.009	6.296.286.982	2.651.829.109	3.599.153.505	947.324.396	5.054.705.522		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.898.127.708	3.898.127.708	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	6.278.871.000	191.791.026	0	50.000.000	50.000.000	6.037.079.974	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.184.812.000	4.028.330.807	66.824.500	156.481.193	89.656.693	0	RS	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	119.176.269	43.140.000	43.140.000	0	99.944.731	RS	EJECUCION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	1.859.973.874	0	50.000.000	50.000.000	298.744.126	RS*	REEVALUACION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	869.289.808	0	145.399.560	869.289.808	723.890.248	0	RS***	EJECUCION
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							17.752.079.516	10.097.399.684	255.364.060	1.218.911.001	963.546.941	6.435.768.831		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	658.308.000	0	658.308.000	658.308.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	29.059.800	0	29.059.800	29.059.800	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40067969	CONSTRUCCION ETAPA 3, RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA	3.313.315.000	0	0	50.000.000	50.000.000	3.263.315.000	RS	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							4.000.682.800	0	687.367.800	737.367.800	50.000.000	3.263.315.000		
TOTAL PROVINCIALES							21.752.762.316	10.097.399.684	942.731.860	1.956.278.801	1.013.546.941	9.699.083.831		
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE							149.440.660.256	60.580.174.560	12.283.857.924	20.594.165.339	8.310.307.415	68.266.320.357		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE ANCUD								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.642.222.023	0	105.947.977	105.947.977	280.000.000	RE	REEVALUACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.370.127.000	536.417.502	0	81.816.127	81.816.127	751.893.371	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	1.389.476.000	808.091.051	374.228.786	581.384.949	207.156.163	0	RS	EJECUCION EQUIP. Y EQUIPAM.
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	311.244.500	0	311.244.500	311.244.500	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.387.920.009	1.130.848.831	257.071.178	257.071.178	0	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40057328	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR CARACOLES, ANCUD	238.808.000	0	75.308.776	238.808.000	163.499.224	0	RS	EJECUCION
TOTAL							6.725.745.509	4.117.579.407	1.017.853.240	1.576.272.731	558.419.491	1.031.893.371		

						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014527	MEJORAMIENTO CALLE BAQUEDANO Y COSTANERA NORTE, COMUNA DE ANCUD	669.290.000	0	14.999.210	50.000.000	35.000.790	619.290.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30093353	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA DE SALUD RURAL SECTOR NAL, COMUNA DE ANCUD	1.459.839.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.409.839.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40045547	CONSTRUCCION CUARTEL 2A COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	103.460.000	0	0	50.000.000	50.000.000	53.460.000	RS	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	566.881.000	0	0	108.902.147	108.902.147	457.978.853	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	422.079.000	0	0	101.039.500	101.039.500	321.039.500	RS*	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071987	REPOSICIÓN TALLER DE OPERACIONES.	309.972.000	0	0	50.000.000	50.000.000	259.972.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40045547	CONSTRUCCION CUARTEL 2A COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	153.953.000	0	0	0	0	153.953.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.685.474.000	0	14.999.210	409.941.647	394.942.437	3.275.532.353		

TOTAL COMUNA DE ANCUD							10.411.219.509	4.117.579.407	1.032.852.450	1.986.214.378	953.361.928	4.307.425.724		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--	--

						COMUNA DE CASTRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	844.703.000	542.161.724	85.587.605	102.541.276	16.953.671	200.000.000	RS	EJECUCION EQUIP. Y EQUIPAM.
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	6.845.169.786	7.153.305.002	7.522.551.195	369.246.193	817.723.019	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	2.394.442.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.344.442.000	RS	REEVALUACION
TOTAL							18.424.589.000	7.387.331.510	7.238.892.607	7.675.092.471	436.199.864	3.362.165.019		

						INICIATIVAS NUEVAS								
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	128.911.000	0	32.783.386	128.911.000	96.127.614	0	RS*	REEVALUACION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	480.685.856	0	480.685.856	480.685.856	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40070257	MEJORAMIENTO PLAZA JAVIERA CARRERA CASTRO	336.417.000	0	0	50.000.000	50.000.000	286.417.000	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40043234	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL, COMUNA DE CASTRO	1.221.768.000	0	0	142.289.062	142.289.062	1.079.478.938	RS*	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40043234	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL, COMUNA DE CASTRO	601.586.000	0	0	0	0	601.586.000	RS*	CONVENIO
31	02	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40070963	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AGUAS SUPERFICIALES, PESCADERIA, FERIA JOSÉ SANDOVAL GOMEZ, FERIA YUMBEL	326.591.000	0	0	0	0	326.591.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.095.958.856	0	513.469.242	801.885.918	288.416.676	2.294.072.938		

TOTAL COMUNA DE CASTRO							21.520.547.856	7.387.331.510	7.752.361.849	8.476.978.389	724.616.540	5.656.237.957		
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--	--

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	92.764.367	61.313.682	0	23.712.000	23.712.000	7.738.685	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	3.123.618.991	1.090.452.049	1.663.805.009	573.352.960	0	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	1.945.000	837.412.445	1.242.318.234	404.905.789	2.483.460.766	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	2.394.442.000	0	71.317.505	171.317.505	100.000.000	2.223.124.495	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.240.291.000	RS	EJECUCION-ADECUACION
TOTAL							12.292.645.367	3.186.877.673	1.999.181.999	3.151.152.748	1.151.970.749	5.954.614.946		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052247	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE CHONCHI	555.683.000	0	0	50.000.000	50.000.000	444.546.400	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40010316	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA HUILLINCO, COMUNA DE CHONCHI	603.419.000	0	279.953.247	403.556.452	123.603.205	199.862.548	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040291	CONSERVACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE CHONCHI	326.471.000	0	62.181.500	98.178.163	35.996.663	228.292.837	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071482	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTOR NORESTE, COMUNA DE CHONCHI	806.312.000	0	0	1.000.000	1.000.000	805.312.000	RS	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039346	REPOSICION DE 2 AMBULANCIAS BASICAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	309.400.000	0	0	309.400.000	309.400.000	0	RS	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40066148	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR PUCATUE HUICHA, COMUNA DE CHONCHI	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064061	MEJORAMIENTO INTEGRAL MULTICANCHA Y AREA VERDE BAHÍA YAL, COMUNA DE CHONCHI	200.937.000	0	0	0	0	200.937.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064059	MEJORAMIENTO INTEGRAL MULTICANCHA Y ÁREA VERDE RÍO HUITAUQUE, COMUNA DE CHONCHI	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40073904	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO SARGENTO CANDELARIA NORTE, COMUNA DE CHONCHI	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.527.222.000	0	342.134.747	862.134.615	519.999.868	2.603.950.785		
						TOTAL COMUNA DE CHONCHI	15.819.867.367	3.186.877.673	2.341.316.746	4.013.287.363	1.671.970.617	8.558.565.731		
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	190.867.000	103.039.646	39.604.980	87.827.354	48.222.374	0	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	37.849.624	55.466.003	357.101.376	301.635.373	0	RS	EJECUCION
TOTAL							585.818.000	140.889.270	95.070.983	444.928.730	349.857.747	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	166.622.433	166.622.433	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	259.091.000	131.141.412	127.949.588	127.949.588	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063532	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES, CURACO DE VELEZ	498.111.000	0	0	106.632.000	106.632.000	391.479.000	RS*	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40051701	REPOSICION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA BOMBEROS DE HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ	115.920.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100.920.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056255	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	790.967.000	0	0	100.000.000	100.000.000	690.967.000	RS*	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.830.711.433	297.763.845	127.949.588	349.581.588	221.632.000	1.183.366.000		
						TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.416.529.433	438.653.115	223.020.571	794.510.318	571.489.747	1.183.366.000		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.414.744.060	1.209.705.869	173.311.894	205.038.191	31.726.297	0	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	8.950.000	0	50.000.000	50.000.000	2.911.083.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	40.500.000	16.200.000	24.300.000	24.300.000	0	0	RS	TERMINADO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	217.065.774	591.328.380	932.417.226	341.088.846	0	RS*	EJECUCION
						TOTAL	5.574.760.060	1.451.921.643	788.940.274	1.211.755.417	422.815.143	2.911.083.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40061640	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CALEN, COMUNA DE DALCAHUE	1.284.197.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.234.197.000	RS	LICITACION DESIERTA
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40054303	AMPLIACION REDES DE A. POTABLE, ALCANT Y CONSTR. MURO DE CONTENC. AVDA. MOCOPULLI, DALCAHUE	2.085.979.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.985.979.000	RS	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	1.940.477.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.890.477.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40026493	CONSTRUCCION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE DALCAHUE	68.437.000	0	0	2.085.978	2.085.978	66.351.022	RS	REEVALUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40070836	REPOSICION BUS MUNICIPAL, COMUNA DE DALCAHUE	280.905.000	0	280.905.000	280.905.000	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40068201	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE	201.000.000	0	0	0	0	201.000.000	RS*	LICITACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40071265	REPOSICION SEDE SOCIAL Y CAMARINES CLUB DEPORTIVO EL BOSQUE, COMUNA DE DALCAHUE	337.129.000	0	0	0	0	337.129.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40071250	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PULUTAUCO	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40071280	MEJORAMIENTO DOS PLAZAS POBLACION JAIME AMPUERO, CIUDAD DE DALCAHUE	211.438.000	0	0	0	0	211.438.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.696.562.000	0	280.905.000	482.990.978	202.085.978	6.213.571.022		
						TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	12.271.322.060	1.451.921.643	1.069.845.274	1.694.746.395	624.901.121	9.124.654.022		
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.724.474.841	17.100.000	110.000.000	92.900.000	465.161.159	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	1.574.814.000	8.800.655	0	100.000.000	100.000.000	1.466.013.345	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	715.820.434	593.250.434	122.570.000	122.570.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	305.443.000	144.571.791	115.701.320	160.871.209	45.169.889	0	RS*	EJECUCION
						TOTAL	5.895.713.434	3.471.097.721	255.371.320	493.441.209	238.069.889	1.931.174.504		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	599.158.390	0	599.158.390	599.158.390	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	361.635.961	0	361.635.961	361.635.961	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40013816	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON	771.810.000	0	0	103.711.001	103.711.001	668.098.999	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40073338	REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL PUCHILCO COMUNA PUQUELDON	203.117.000	0	0	0	0	203.117.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.935.721.351	0	960.794.351	1.064.505.352	103.711.001	871.215.999		
						TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	7.831.434.785	3.471.097.721	1.216.165.671	1.557.946.561	341.780.890	2.802.390.503		
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709	RS	REEVALUACION
						TOTAL	3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40076306	MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUEILEN	325.000.000	0	0	0	0	325.000.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40041153	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUEILEN	325.000.000	0	0	0	0	325.000.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.723.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	2.628.621.709		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE QUELLON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	5.000.000	5.000.000	1.406.317.146	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	117.081.000	0	0	0	13.009.000	RS	LIQUIDACION
						TOTAL	1.616.582.146	158.846.000	0	38.410.000	38.410.000	1.419.326.146		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	363.037.000	0	0	363.037.000	363.037.000	0	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	312.912.000	0	0	142.187.413	142.187.413	170.724.587	RS*	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	675.949.000	0	0	505.224.413	505.224.413	170.724.587		
						TOTAL COMUNA DE QUELLON	2.292.531.146	158.846.000	0	543.634.413	543.634.413	1.590.050.733		
						COMUNA DE QUEMCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.654.842.789	1.485.286.866	115.965.189	169.555.923	53.590.734	0	RS	EJECUCION EQUIP. Y EQUIPAM
						TOTAL	1.654.842.789	1.485.286.866	115.965.189	169.555.923	53.590.734	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063487	CONSERVACION DE CAMINOS ISLAS TAUCULON, AULIN Y BUTACHAUQUES, COMUNA DE QUEMCHI.	974.355.000	0	0	100.000.000	100.000.000	874.355.000	RS*	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40005528	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	700.908.000	0	0	100.000.000	100.000.000	600.908.000	RS	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.675.263.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.475.263.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	3.330.105.789	1.485.286.866	115.965.189	369.555.923	253.590.734	1.475.263.000		
						COMUNA DE QUINCHAO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.232.082.355	1.231.903.855	178.500	178.500	0	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.822.540.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.722.540.000	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.480.736.000	1.415.558.565	864.418.515	1.065.177.435	200.758.920	0	RS	EJECUCION
						TOTAL	5.535.358.355	2.647.462.420	864.597.015	1.165.355.935	300.758.920	1.722.540.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	391.291.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40067325	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO	2.352.751.000	0	0	100.000.000	100.000.000	2.252.751.000	RS*	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.794.042.000	0	0	150.000.000	150.000.000	2.644.042.000		
						TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	8.329.400.355	2.647.462.420	864.597.015	1.315.355.935	450.758.920	4.366.582.000		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	3.477.985.000	527.771.961	0	100.000.000	100.000.000	2.850.213.039	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	4.955.228.139	4.955.228.139	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	2.707.826.752	2.707.826.752	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	17.878.003.000	6.411.745.496	6.433.274	150.000.000	143.566.726	11.316.257.504	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.091.573.127	559.298.027	532.275.100	532.275.100	0	0	RS*	TERMINADO
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40062497	DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO INFRAEST. PORTUARIA 04 SECT. REZAGO, QUEMCHI-QUINCHAO Y QUELLON	190.995.000	143.246.250	47.748.750	47.748.750	0	0	RS	TERMINADO
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.479.710.192	0	2.479.710.192	2.479.710.192	0	0	RS***	EJECUCION
24	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA B) GLOSA 03 GESTIÓN HÍDRICA (Subtítulo 24.03.014)	140.080.000	0	140.080.000	140.080.000	0	0	RS***	EJECUCION
						TOTAL	32.921.401.210	15.305.116.625	3.206.247.316	3.449.814.042	243.566.726	14.166.470.543		
						TOTAL PROVINCIALES	32.921.401.210	15.305.116.625	3.206.247.316	3.449.814.042	243.566.726	14.166.470.543		
						TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	120.868.281.510	40.695.473.271	17.822.372.081	24.252.043.717	6.429.671.636	55.859.627.922		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CHAITEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	4.255.389.000	25.800.000	0	50.000.000	50.000.000	4.179.589.000	RS	LICITACION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058788	REPOSICION AMBULANCIAS COMUNA DE CHAITEN	172.000.000	0	0	17.200.000	17.200.000	0	RS*	LICITACION
						TOTAL	4.427.389.000	25.800.000	0	67.200.000	67.200.000	4.179.589.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042493	MEJORAMIENTO DIVERASS CALLES SECTOR SUR, CHAITEN	6.383.540.000	0	0	0	0	6.383.540.000	RS*	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.383.540.000	0	0	0	0	6.383.540.000		
						TOTAL COMUNA DE CHAITEN	10.810.929.000	25.800.000	0	67.200.000	67.200.000	10.563.129.000		
						COMUNA DE FUTALEUFU								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	75.660.000	23.280.000	50.398.000	27.118.000	0	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	0	0	18.160.000	RS	LIQUIDADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.415.585.000	44.597.047	0	50.000.000	50.000.000	1.320.987.953	RS	EJECUCION
						TOTAL	1.659.803.000	220.257.047	23.280.000	100.398.000	77.118.000	1.339.147.953		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056911	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES COMUNA DE FUTALEUFU	637.776.829	0	637.776.829	637.776.829	0	0	RS*	TERMINADO
26	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	126.844.817	0	118.893.527	126.844.817	7.951.290	0	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40073440	MEJORAMIENTO PASEO ACCESO PONIENTE, COMUNA DE FUTALEUFU	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	RS*	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	994.621.646	0	756.670.356	764.621.646	7.951.290	230.000.000		
						TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	2.654.424.646	220.257.047	779.950.356	865.019.646	85.069.290	1.569.147.953		
						COMUNA DE HUALAIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	88.920.096	0	25.000.000	25.000.000	140.875.904	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.966.390.000	1.324.404.045	470.737.187	488.469.982	17.732.795	153.515.973	RS	EJECUCION-EQUIP. Y EQUIPAM.
						TOTAL	2.221.186.000	1.413.324.141	470.737.187	513.469.982	42.732.795	294.391.877		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	30386191	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE HORNOPIREN, HUALAIHUE	81.700.000	15.600.000	0	66.100.000	66.100.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30397627	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA, COMUNA DE HUALAIHUE	1.446.756.000	696.150	2.500.000	50.000.000	47.500.000	1.396.059.850	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40053338	CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS RIO NEGRO HORNOPIREN, HUALAIHUE	115.300.000	0	18.921.000	30.000.000	11.079.000	85.300.000	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40065407	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COMUNA DE HUALAIHUE	341.685.000	0	0	144.992.500	144.992.500	196.692.500	RS*	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129886	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE HUALAIHUE	344.715.000	0	0	35.000.000	35.000.000	309.715.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40077324	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIO PUBLICO SECTOR LOS CANELOS, HORNOPIRÉN, COMUNA DE HUALAIHUÉ	328.738.000	0	0	0	0	328.738.000	RS*	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.658.894.000	16.296.150	21.421.000	326.092.500	304.671.500	2.316.505.350		
						TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	4.880.080.000	1.429.620.291	492.158.187	839.562.482	347.404.295	2.610.897.227		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PALENA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.400.871.686	0	20.563.374	20.563.374	28.313.940	RS	EJECUCION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	87.175.000	87.175.000	28.500.000	RS*	EJECUCION
						TOTAL	1.579.749.000	1.415.196.686	0	107.738.374	107.738.374	56.813.940		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40072992	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACION, COLEGIO ROBERTO WHITE GESELL DE PALENA	541.587.000	0	160.082.777	160.984.335	901.558	380.602.665	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40007928	CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA	4.529.799.000	0	0	50.000.000	50.000.000	4.479.799.000	RS	CONVENIO
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40076387	REPOSICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	187.635.000	0	0	0	0	187.635.000	RS*	LICITACION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.259.021.000	0	160.082.777	210.984.335	50.901.558	5.048.036.665		
						TOTAL COMUNA DE PALENA	6.838.770.000	1.415.196.686	160.082.777	318.722.709	158.639.932	5.104.850.605		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	16.612.042.000	4.059.795.859	957.058.658	3.640.616.192	2.683.557.534	8.911.629.949	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	34.164.961.000	9.817.932.092	6.598.521.559	11.589.301.565	4.990.780.006	12.757.727.343	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	50.292.204.000	13.369.891.477	0	400.000.000	400.000.000	36.522.312.523	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	0	0	29.599.000	S/R	SIN RS 2024/TERMINADO
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	568.572.269	780.000.000	211.427.731	0	RS***	EJECUCION
						TOTAL	101.878.806.000	27.247.619.428	8.124.152.486	16.409.917.757	8.285.765.271	58.221.268.815		
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063704	REPOSICION EQUIPOS RAYOS X OSTEOPULMONARES HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	767.550.000	0	511.700.000	767.550.000	255.850.000	255.850.000	RS*	EJECUCION
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	767.550.000	0	511.700.000	767.550.000	255.850.000	255.850.000		
						TOTAL PROVINCIALES	102.646.356.000	27.247.619.428	8.635.852.486	17.177.467.757	8.541.615.271	58.477.118.815		
						TOTAL PROVINCIA DE PALENA	127.830.559.646	30.338.493.452	10.068.043.806	19.267.972.594	9.199.928.788	78.325.143.600		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						REGIONALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	12.180.626	12.180.626	401.763.374	RS*	DETENIDO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	238.315.217	337.979.497	99.664.280	337.978.503	RS*	EJECUCION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40076624	ADQUISICION VEHÍCULOS TRASLADO Y RESGUARDO DE CANES DETECTORES DE DROGAS-BRIANCO (PMO - ONO)	259.301.000	0	0	0	0	259.301.000	RS*	CONVENIO
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	208.722.500	208.722.500	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	6.400.000.000	0	896.413.027	6.400.000.000	5.503.586.973	0	RS***	EJECUCION
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	200.000.000	0	8.305.500	200.000.000	191.694.500	0	RS***	
24	03-011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	Aplicación letra c) glosa 03 Residuos Sólidos Domiciliarios	372.507.000	0	0	372.507.000	372.507.000	0	RS***	
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	10.000.000.000	0	7.944.815.238	10.000.000.000	2.055.184.762	0	RS**	EJECUCION
						TOTAL	18.530.432.500	208.722.500	9.087.848.982	17.322.667.123	8.234.818.141	999.042.877		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	627.486.611	739.060.609	995.155.389	256.094.780	0	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40032367	DIAGNOSTICO DE COND. NATURALES VARIOS SECTORES ZONAS DE REZAGO NORTE, REGION DE LOS LAGOS	1.512.982.000	0	100.772.288	636.731.850	535.959.562	876.250.150	RS	EJECUCION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	202.468.625	202.468.625	56.031.375	RS*	LICITACION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	238.000.000	RS*	CONVENIO
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	28.992.305	28.992.305	541.512.695	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	0	0	11.224.636.000	RS	EXPROPIACIONES
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	15.000.000	15.000.000	518.060.000	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40046973	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVA ZONA PRIMARIA EXTRAPUERTO EMPORMONTT, PUERTO MONTT	3.614.118.000	0	0	0	0	3.614.118.000	RS	CONVENIO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	142.300.000	0	0	142.300.000	142.300.000	0	RS*	LICITACION
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	102.567.000	0	0	102.567.000	102.567.000	0	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40055362	ANALISIS PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LOS LAGOS	323.520.000	0	0	5.000.000	5.000.000	318.520.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064760	CONSERVACION POLIDEPORTIVO ARENA PUERTO MONTT	1.803.653.000	0	0	0	0	1.803.653.000	S/R	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40036420	HABILITACION Centro Cardioquirúrgico para Macro Zona Sur Austral	2.494.106.000	442.023.638	1.075.894.144	1.136.584.144	60.690.000	915.498.218	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40056853	CONSTRUCCION CAMPUS SALUD, INGENIERÍA Y ARTES, ULAGOS, PUERTO MONTT	6.641.168.000	0	0	0	0	6.641.168.000	RS	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	50.000.000	50.000.000	5.434.512.000	RS	EJECUCION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40067537	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA CUATRO CUARTELES FRONTERIZOS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS	167.421.000	0	0	167.421.000	167.421.000	0	RS*	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072933	ADQUISICION UNIDAD DESPLIEGUE POLICIA MARITIMA PARA GOB MARITIMA DE PTO MONTT	740.660.000	0	0	0	0	740.660.000	RS*	LICITACION
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072938	ADQUISICION TECNOLOGIA NO INVASIVA PARA EL AEROPUERTO EL TEPUAL	146.321.000	0	0	0	0	146.321.000	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40073955	ACTUALIZACION DISEÑO DE INDICADORES Y METAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION REGIONAL CAMBIO CLIMATICO (PARCC) LOS LAGOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS*	CONVENIO
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	37.735.671.000	1.069.510.249	1.915.727.041	3.497.220.313	1.581.493.272	33.168.940.438		
						TOTAL REGIONAL	56.266.103.500	1.278.232.749	11.003.576.023	20.819.887.436	9.816.311.413	34.167.983.315		

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL	
						PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD									
24	RTE A BO	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	4.500.000.000	0	383.600.000	4.500.000.000	4.116.400.000	0	RS***	EJECUCION	
33		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072971	TRANSFERENCIA A JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE	3.231.105.000	0	3.050.000.000	3.231.105.000	181.105.000	0	RS**	EJECUCION	
33		03	MULTISECTORIAL	FRPD	EJECUCION	FRPD	PROVISIÓN FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO (SIN DISTRIBUIR)	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
33		03	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION		FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL (SIN DISTRIBUIR)	2.316.291.000	0	0	2.316.291.000	2.316.291.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
TOTAL							11.247.396.000	0	3.433.600.000	11.247.396.000	7.813.796.000	0			
TOTAL							11.247.396.000	0	3.433.600.000	11.247.396.000	7.813.796.000	0			
						PROGRAMAS DE ARRASTRE									
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	200.000.000	200.000.000	650.811.191	RS**	EJECUCION	
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	239.073.000	0	33.150.000	33.150.000	50.577.000	RS**	EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	FRPD	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	1.388.809.167	118.604.846	119.308.000	703.154	531.882.833	RS**	EJECUCION	
33	03	TRANSPORTE	FRPD	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.823.578.319	665.474.937	1.750.122.000	1.084.647.063	11.406.299.681	RS**	EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.878	428.154.116	0	748.375.000	748.375.000	3.020.762	RS**	EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.001.000	608.377.496	0	640.355.000	640.355.000	1.268.504	RS**	EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.001.000	345.714.459	0	351.681.000	351.681.000	2.605.541	RS**	EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	385.283.360	0	299.178.000	299.178.000	15.538.640	RS**	EJECUCION	
33	03	PESCA	FRPD	INDESPA	40063557	TRANSFERENCIA PROGRAMA TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.900.000.000	604.099.000	133.103.073	1.295.901.000	1.162.797.927	1.000.000.000	RS**	EJECUCION	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	SERNATUR	40064817	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.750.000.000	450.150.010	208.028.642	1.299.836.000	1.091.807.358	13.990	RS**	EJECUCION	
33	03	TRANSPORTE	FAR	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	91.000.000	91.000.000	7.691.000.000	RS**	EJECUCION/MODIF CONV PROGRAMACION	
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	29.375.709	0	1.145.024.000	1.145.024.000	291	RS**	EJECUCION	
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.960	183.817.960	0	26.183.000	26.183.000	0	RS**	EJECUCION	
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	CORFO	40067360	CAPACITACION CENTRO TECNOLOGICO PARA LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGION DE LOS LAGOS	4.850.000.000	0	0	1.321.000.000	1.321.000.000	3.529.000.000	RS**	EJECUCION	
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	40075384	TRANSFERENCIA CONECTACOOOP CIRCULAR, PROGRAMA DE INCUBACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA DESARROLLAR	266.852.000	20.416.000	0	147.133.000	147.133.000	99.303.000	RS**	EJECUCION	
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad San Sebastián	40075417	TRANSFERENCIA SOLUCIONES SOCIO SANITARIAS PARA LA VISITACIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE ÁREA	243.000.000	20.416.000	214.302.000	214.302.000	0	8.282.000	RS**	EJECUCION	
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Santiago de Chile	40075430	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA	300.000.000	1.000.000	0	114.777.000	114.777.000	184.223.000	RS**	EJECUCION	
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Chile	40075429	TRANSFERENCIA VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO DE COSECHA DE AGUA SUBSUPERFICIAL Y DESARROLLO DE EST	174.060.000	0	0	103.875.000	103.875.000	70.185.000	RS**	EJECUCION	
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	40075416	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO MARÍTIMO PORTUARIO EN EL MARCO	300.000.000	752.000	0	218.405.000	218.405.000	80.843.000	RS**	EJECUCION	
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE							43.204.664.838	7.760.205.405	1.339.513.498	10.119.605.000	8.780.091.502	25.324.854.433			
						PROGRAMAS SALUD									
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.214.000	583.423.000	24.790.000	24.790.000	0	1.000	RS**	EJECUCION	
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	558.564.000	458.564.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EJECUCION	
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS COSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	32.143.002	120.000.000	87.856.998	0	RS**	EJECUCION	
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	504.035.000	212.639.290	454.800.000	242.160.710	615.165.000	RS**	EJECUCION	
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40063903	PROTECCION DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA PROVINCIA DE PALENA y COCHAMÓ	878.618.605	0	0	321.087.000	321.087.000	557.531.605	RS**	CONVENIO	
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40063898	PROTECCION DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA PROVINCIA LLANQUIHUE	1.289.643.265	0	0	435.799.000	435.799.000	853.844.265	RS**	CONVENIO	
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40065461	PROTECCION Y APOYO SALUD INTEGRAL E INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA	1.305.293.570	0	0	247.477.000	247.477.000	1.057.816.570	RS**	RES EN TRAMITE GORE	
TOTAL PROGRAMAS SALUD							6.814.333.440	2.026.022.000	269.572.292	1.703.953.000	1.434.380.708	3.084.358.440			

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						PROGRAMAS NUEVOS								
24	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	SENDA	40072688	PREVENCION SENDA - GORE LOS LAGOS: MÁS COMUNIDAD, MÁS PREVENCIÓN	333.537.000	0	0	156.724.000	156.724.000	176.813.000	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SAG Región de Los Lagos	40063864	CONTROL PROGRAMA COMUNITARIO DE CONTROL DE VISIÓN AMERICANO EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	452.992.000	0	0	0	0	452.992.000	RS**	RES APROBACION EN CONTRALORIA
33	03	PESCA	LIBRE	CORFO	40064703	CAPACITACION TRANSFERENCIA PRODUCTIVA Y ECONOMIA CIRCULAR PARA LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN	1.600.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.550.000.000	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	ProChile	40071275	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	248.500.000	0	0	0	0	248.500.000	RS**	RES APROBACION EN CONTRALORIA
24	09	MULTISECTORIAL	LIBRE	GORE Los Lagos	40077562	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL” PR3101021001- EX ANTE	710.745.000	0	0	108.500.000	108.500.000	602.245.000	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SAG Región de Los Lagos	40060694	ERRADICACION MEJORA DEL ACTUAL STATUS SANITARIO DE BRUCELOSIS BOVINA REGION DE LOS LAGOS	987.876.000	0	0	0	0	987.876.000	RS**	RES EN TRAMITE
24	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	40079011	PREVENCION DEL DELITO EN LOS BARRIOS: FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO COMUNIDAD-CARABINEROS DE CHILE.	196.410.000	0	0	196.410.000	196.410.000	0	RS**	EJECUCION
24	09	MULTISECTORIAL	LIBRE	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS	40074239	PREVENCION LOS LAGOS TE CUIDA, PROGRAMA DE ATENCIÓN Y APOYO BIOPSIOSOCIAL EN DOMICILIO DIADA: USUARIO CUIDADOR	2.937.952.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.936.952.000	RS**	EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							7.468.012.000	0	0	512.634.000	512.634.000	6.955.378.000		

						PROGRAMAS FRPD - Ciencia-Tecnología, Conocimiento e Innovación								
33	01	PESCA	FRPD	Universidad Austral de Chile	50000231	PREDICCIÓN Y MANEJO INTELIGENTE DE CALIGIDOSIS: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UNA SALMONICULTURA SOSTENIBLE	300.000.000	0	0	166.399.000	166.399.000	133.601.000	RS**	CONVENIO
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Católica de Chile	50000235	INICIO DE UN PLAN PILOTO DE VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS Y VRS BOVINA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	300.000.000	0	0	92.390.000	92.390.000	207.610.000	RS**	CONVENIO
33	01	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	Corporación Instituto Profesional Santo Tomás	50000240	MONTE VERDE EL ORIGEN, INNOVACIÓN DESDE EL PATRIMONIO	251.878.000	0	0	147.785.000	147.785.000	104.093.000	RS**	CONVENIO
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	Universidad San Sebastián	50000244	GESTIÓN HÍDRICA SUSTENTABLE EN CENTROS DE SALUD: ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES Y PATÓGENOS MULTIRRESISTENTES UTILIZANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS	270.000.000	0	0	71.542.000	71.542.000	198.458.000	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	50000248	PLATAFORMA MULTI-ÓMICA PARA LA MITILICULTURA SOSTENIBLE: SOLUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS AL DESAFÍO DE LA FIJACIÓN Y EL DESPRENDIMIENTO DE SEMILLAS DE MYTILUS CHILENSIS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	265.500.000	0	0	22.429.000	22.429.000	243.071.000	RS**	CONVENIO
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	50000252	CENTRO DE FORMACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL: INNOVA PUERTO MONTT	282.000.000	0	0	108.081.000	108.081.000	173.919.000	RS**	CONVENIO
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	Universidad de Los Lagos	50000254	DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE HUELLA DE CARBONO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS PRINCIPALES FRUTALES Y CULTIVOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	300.000.000	0	0	44.249.000	44.249.000	255.751.000	RS**	CONVENIO
33	01	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FRPD	Universidad San Sebastián	50000258	MENTES CIRCULARES Y SOSTENIBLES: INNOVANDO DESDE LA EDUCACIÓN PARA EL FUTURO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	610.000.000	0	0	155.744.000	155.744.000	454.256.000	RS**	CONVENIO
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							2.579.378.000	0	0	808.619.000	808.619.000	1.770.759.000		

TOTAL PROGRAMAS	60.066.388.278	9.786.227.405	1.609.085.790	13.144.811.000	11.535.725.210	37.135.349.873
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)	71.313.784.278	9.786.227.405	5.042.685.790	24.392.207.000	19.349.521.210	37.135.349.873
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2025	633.084.089.805	186.143.242.619	62.440.730.830	123.254.587.000	60.813.856.170	323.719.299.586

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
S/R=SIN RATE 2025
